

**PLA D'ACCESSIBILITAT PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES  
ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA DE CASSÀ DE LA SELVA.**

M.MERCÈ COROMINAS I NOGUERA – ARQUITECTA

FEBRER DE 2.009

## **ÍNDEX**

**PLA D'ACCESSIBILITAT PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES  
ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA DE CASSÀ DE LA SELVA.**

## **ÍNDEX**

### **Volum I – Documentació gràfica: Plànols generals**

Plànol de situació	E: 1/10000
Plànol de l'estat actual i zonificació	E: 1/2500
Plànol de les pendents dels carrers	E: 1/2500
Plànol de la proposta de reforma dels itineraris, per fases	E: 1/2500
Plànol dels itineraris adaptats a la via pública	E: 1/2500

### **Volum II – Documentació gràfica: Plànols de detall**

Plànol dels detalls estat actual	E: 1/1000
Plànols de les seccions transversals carrers estat actual i proposta	E: 1/100
Plànols de detalls proposta de reformes a efectuar i fases d'execució	E: 1/1000
Plànols de detalls constructius de guals i plataformes alentidores	E: 1/100



### **Volum III – Documentació escrita**

Memòria Descriptiva
Valoració econòmica per fases
Resum del pressupost

**DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:**  
**Plànols generals**

**PLA D'ACCESSIBILITAT PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES  
ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA DE CASSÀ DE LA SELVA.**



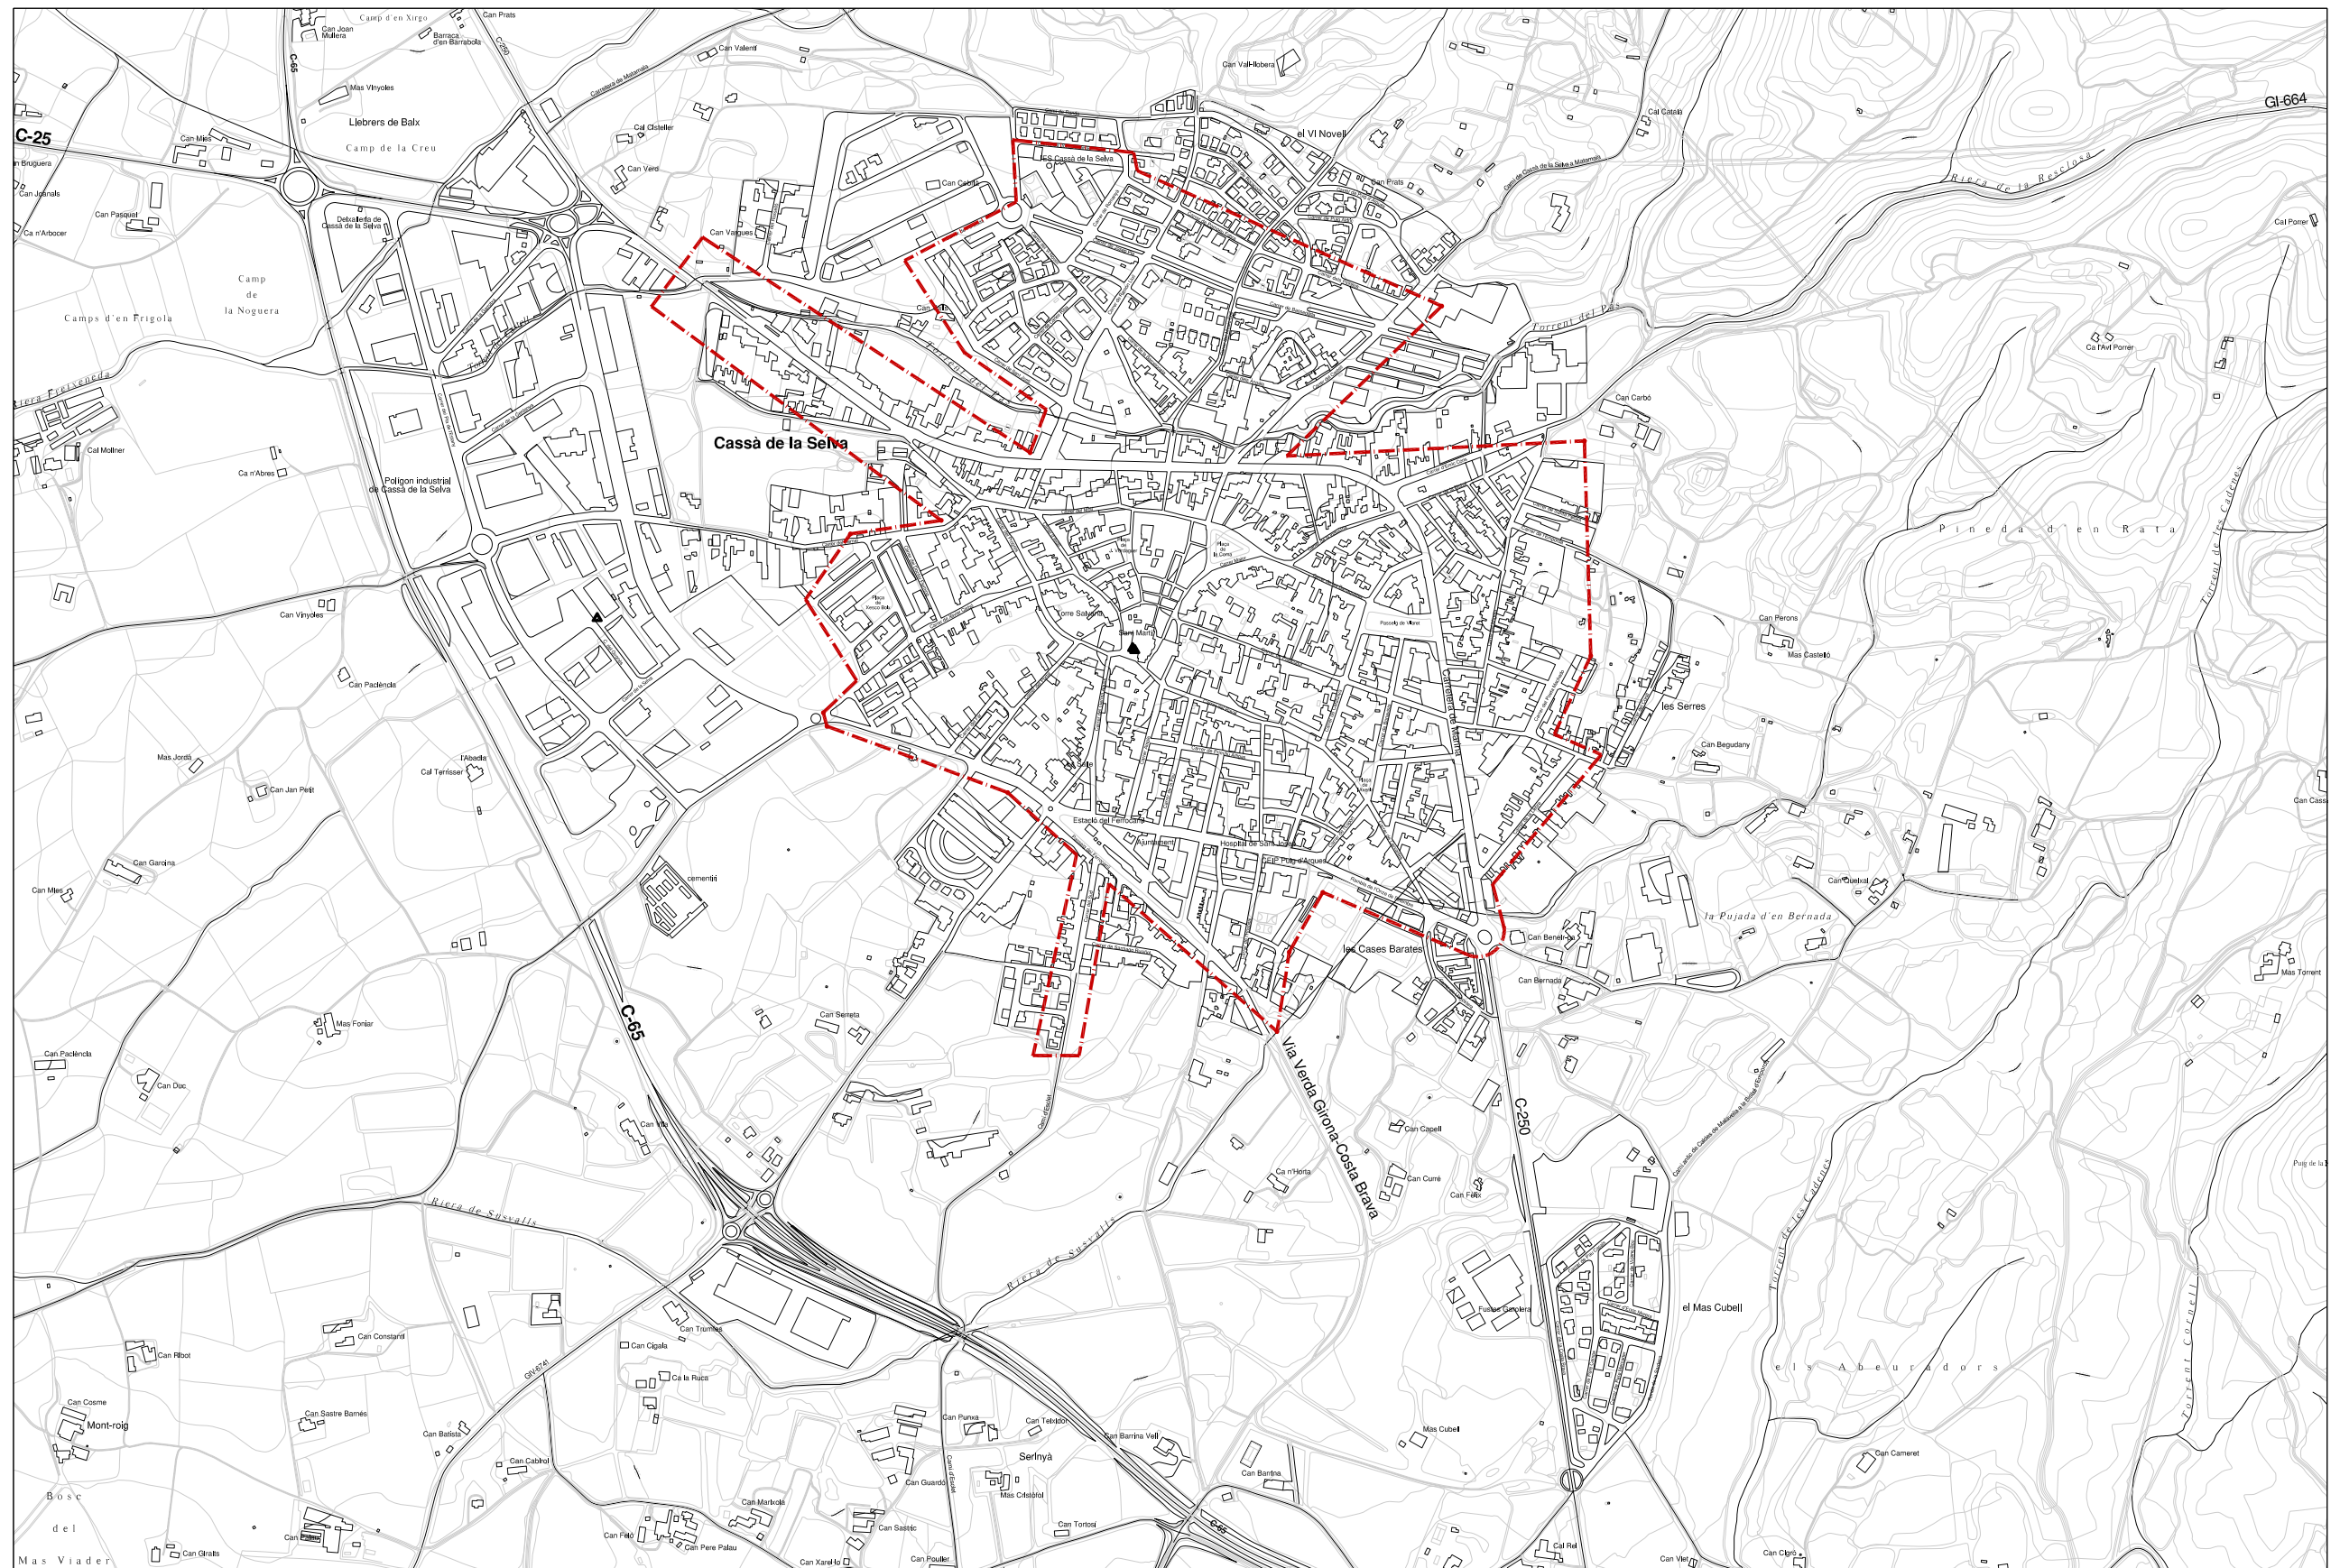


PLA D'ACCESSIBILITAT PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA DE CASSÀ DE LA SELVA

SITUACIÓ  
E: 1/10000

Ma. MERCÈ COROMINAS I NOGUERA - ARQUITECTA GIRONA



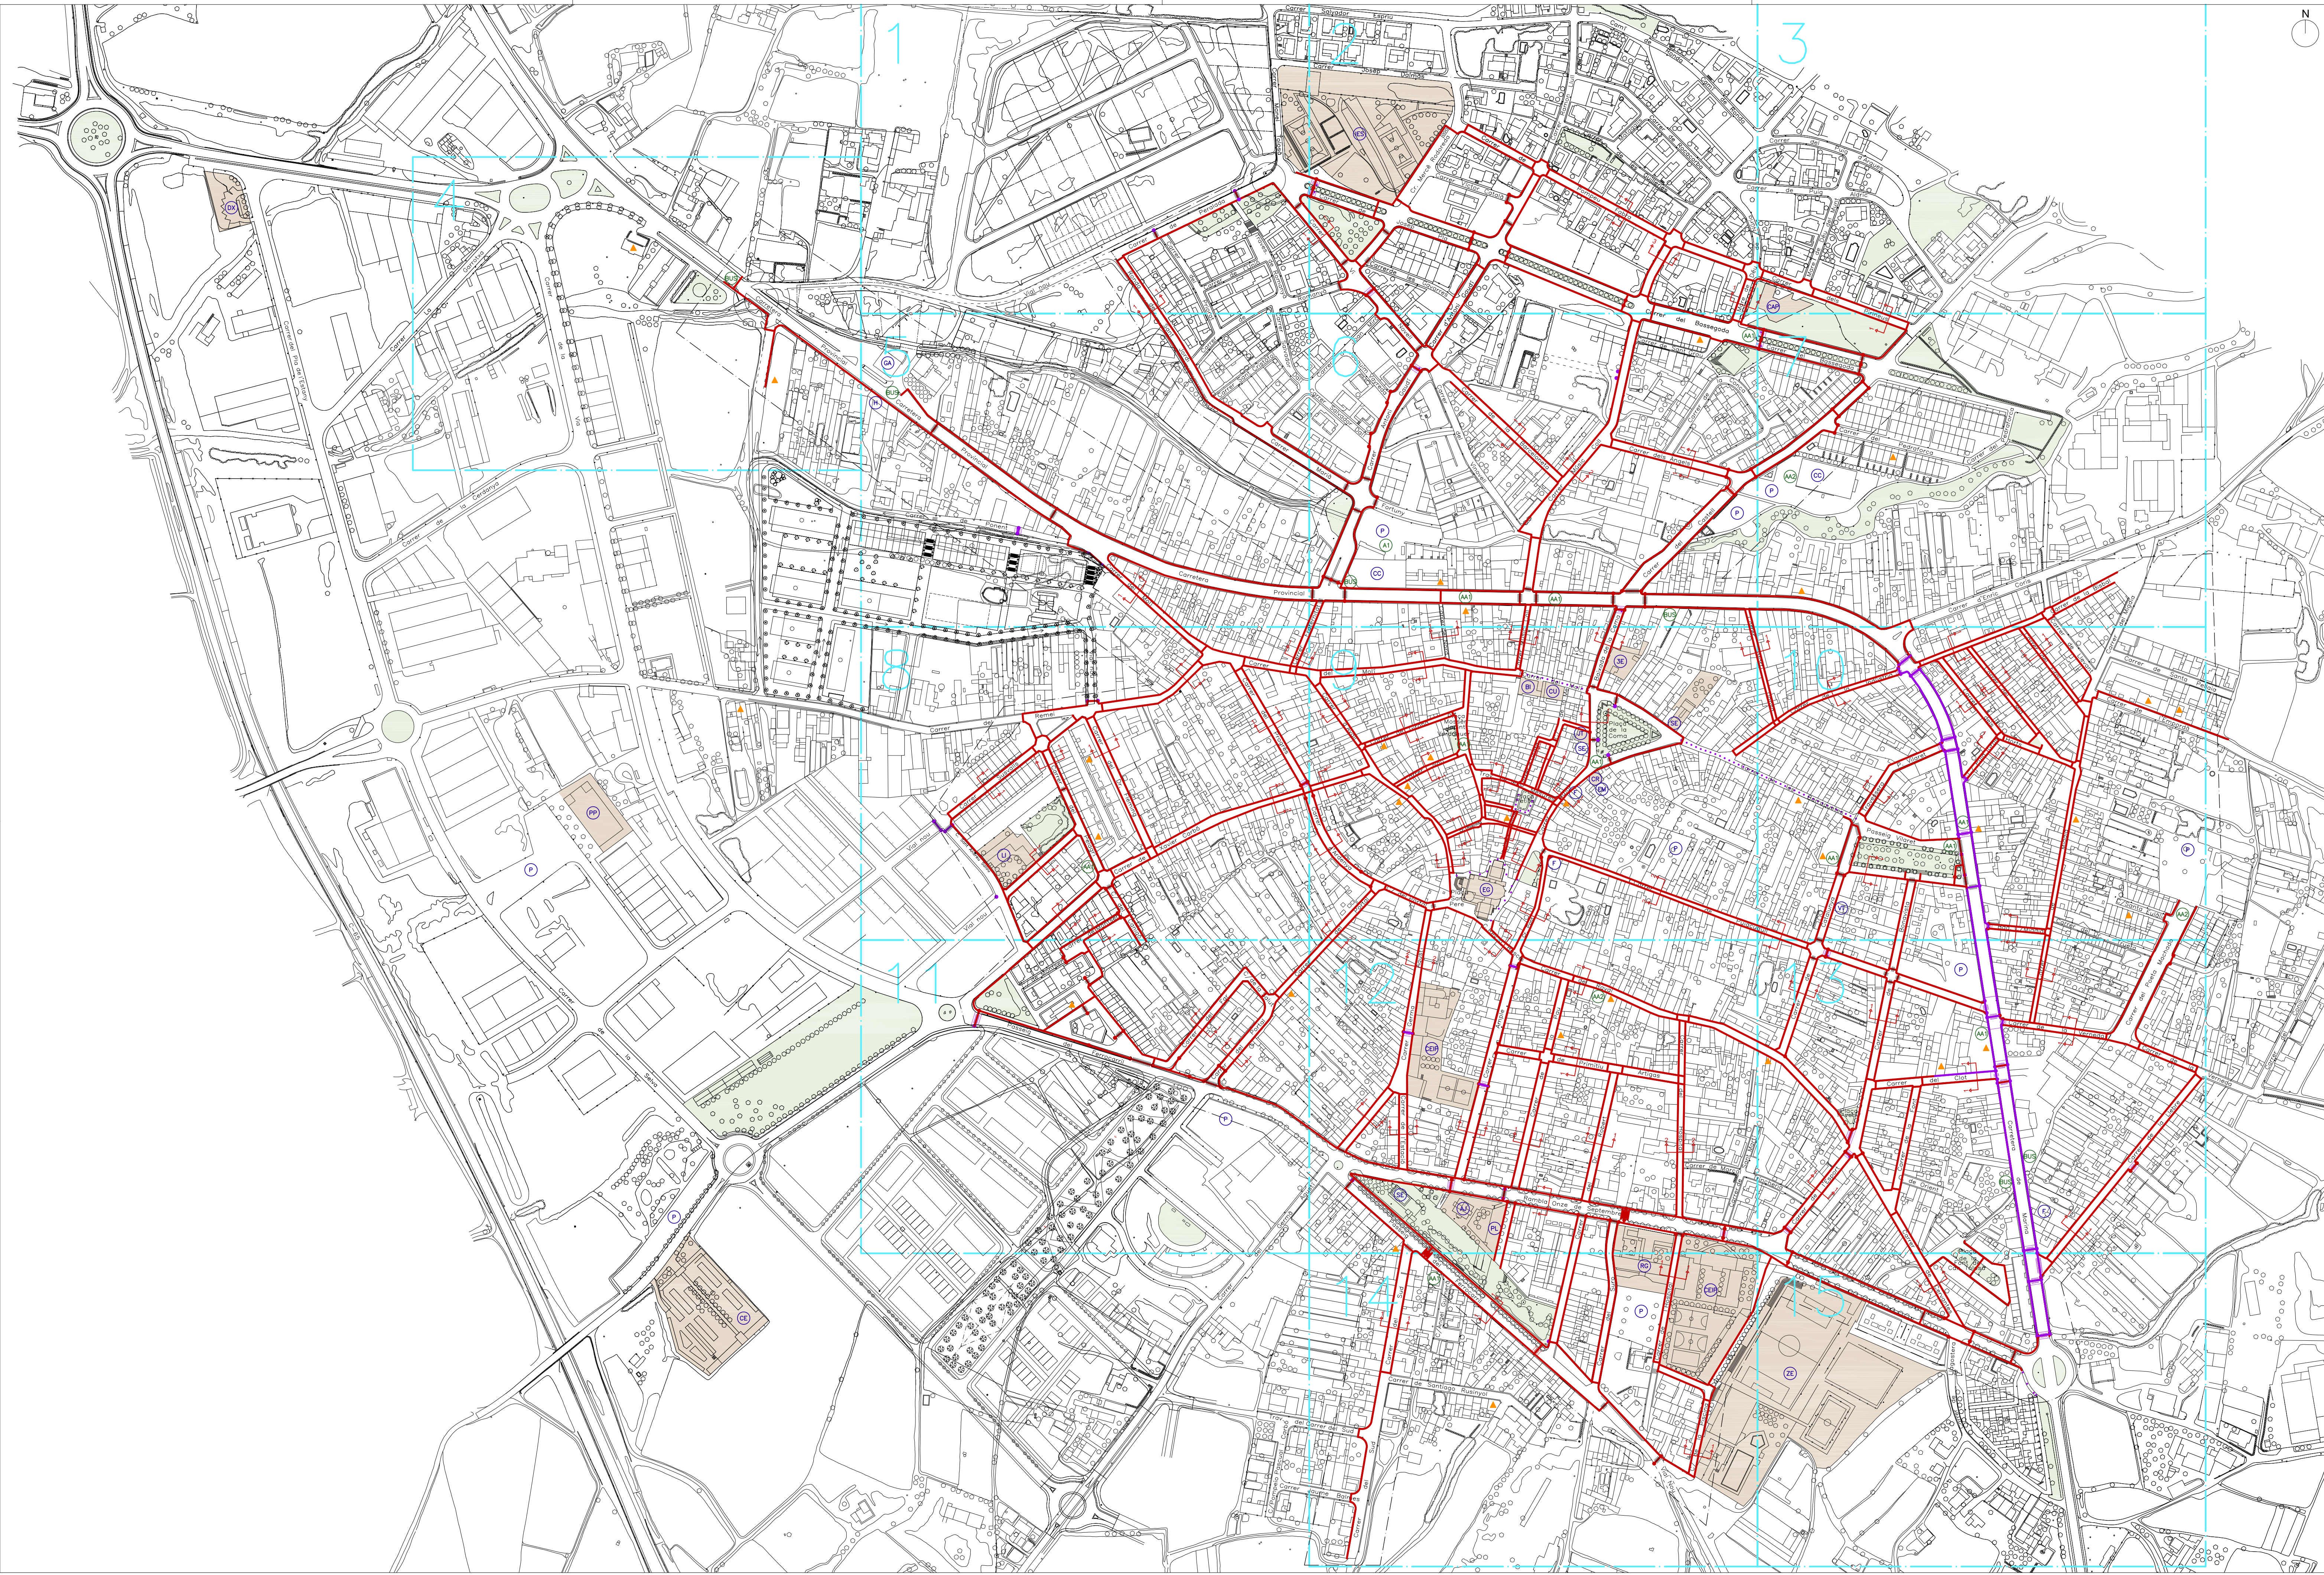

GIRONA, FEBRER 2009





LLEENDA LLOCS D'INTERÉS PÚBLIC			
AJ	Ajuntament	CEIP	Centre d'educació infantil i primària
BL	Biblioteca	CR	Correu
CAP	Centre d'atenció primària	CU	Centre cultural
CC	Centre Comercial	DX	Deixalleria municipal
CE	Cementiri	EG	Església
EM	Emissora municipal	F	Farmàcia
GA	Gasolinera	H	Hotel
IES	Institut d'ensenyament secundari	PP	Pavelló polivalent
JT	Juliet	LI	Llar d'infants
P	Parqueig	PL	Polícia local
SE	Servei	VE	Veterinari
ZE	Zona esportiva	ZE	Zona esportiva
ZE	Zona esportiva	ZE	Zona esportiva

LLEENDA APARCAMENTS I TRANSPORT	
BUS	PARADA DE BUS
AA1	APARCAMENT ADAPTAT, numero = nombre de places

LLEENDA	
	SITUACIÓ I NUMERACIÓ DE LES SECCIONS
	ITINERARI A ADAPTAR
	PLATAFORMA ALENTIDORA ADAPTADA
	PLATAFORMA ALENTIDORA NO ADAPTADA
	HABITATGE DE PERSONA AMB MOBILITAT REDUÏDA

	LIMIT I ZONA ÀMBIT DEL PROJECTE
	ZONA EQUIPAMENTS
	ESPAI A L'ÀRE LLUIRE
	NUMERACIÓ PLÀNOLS DE DETALL A ESCALA 1/1000


PLA D'ACCESSIBILITAT PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA DE CASSÀ DE LA SELVA

ESTAT ACTUAL  
PLÀNOL 1 - E1/2500  
M.MERCÉ COROMINAS I NOGUERA - ARQUITECTA

GIRONA, FEBRER 2.009





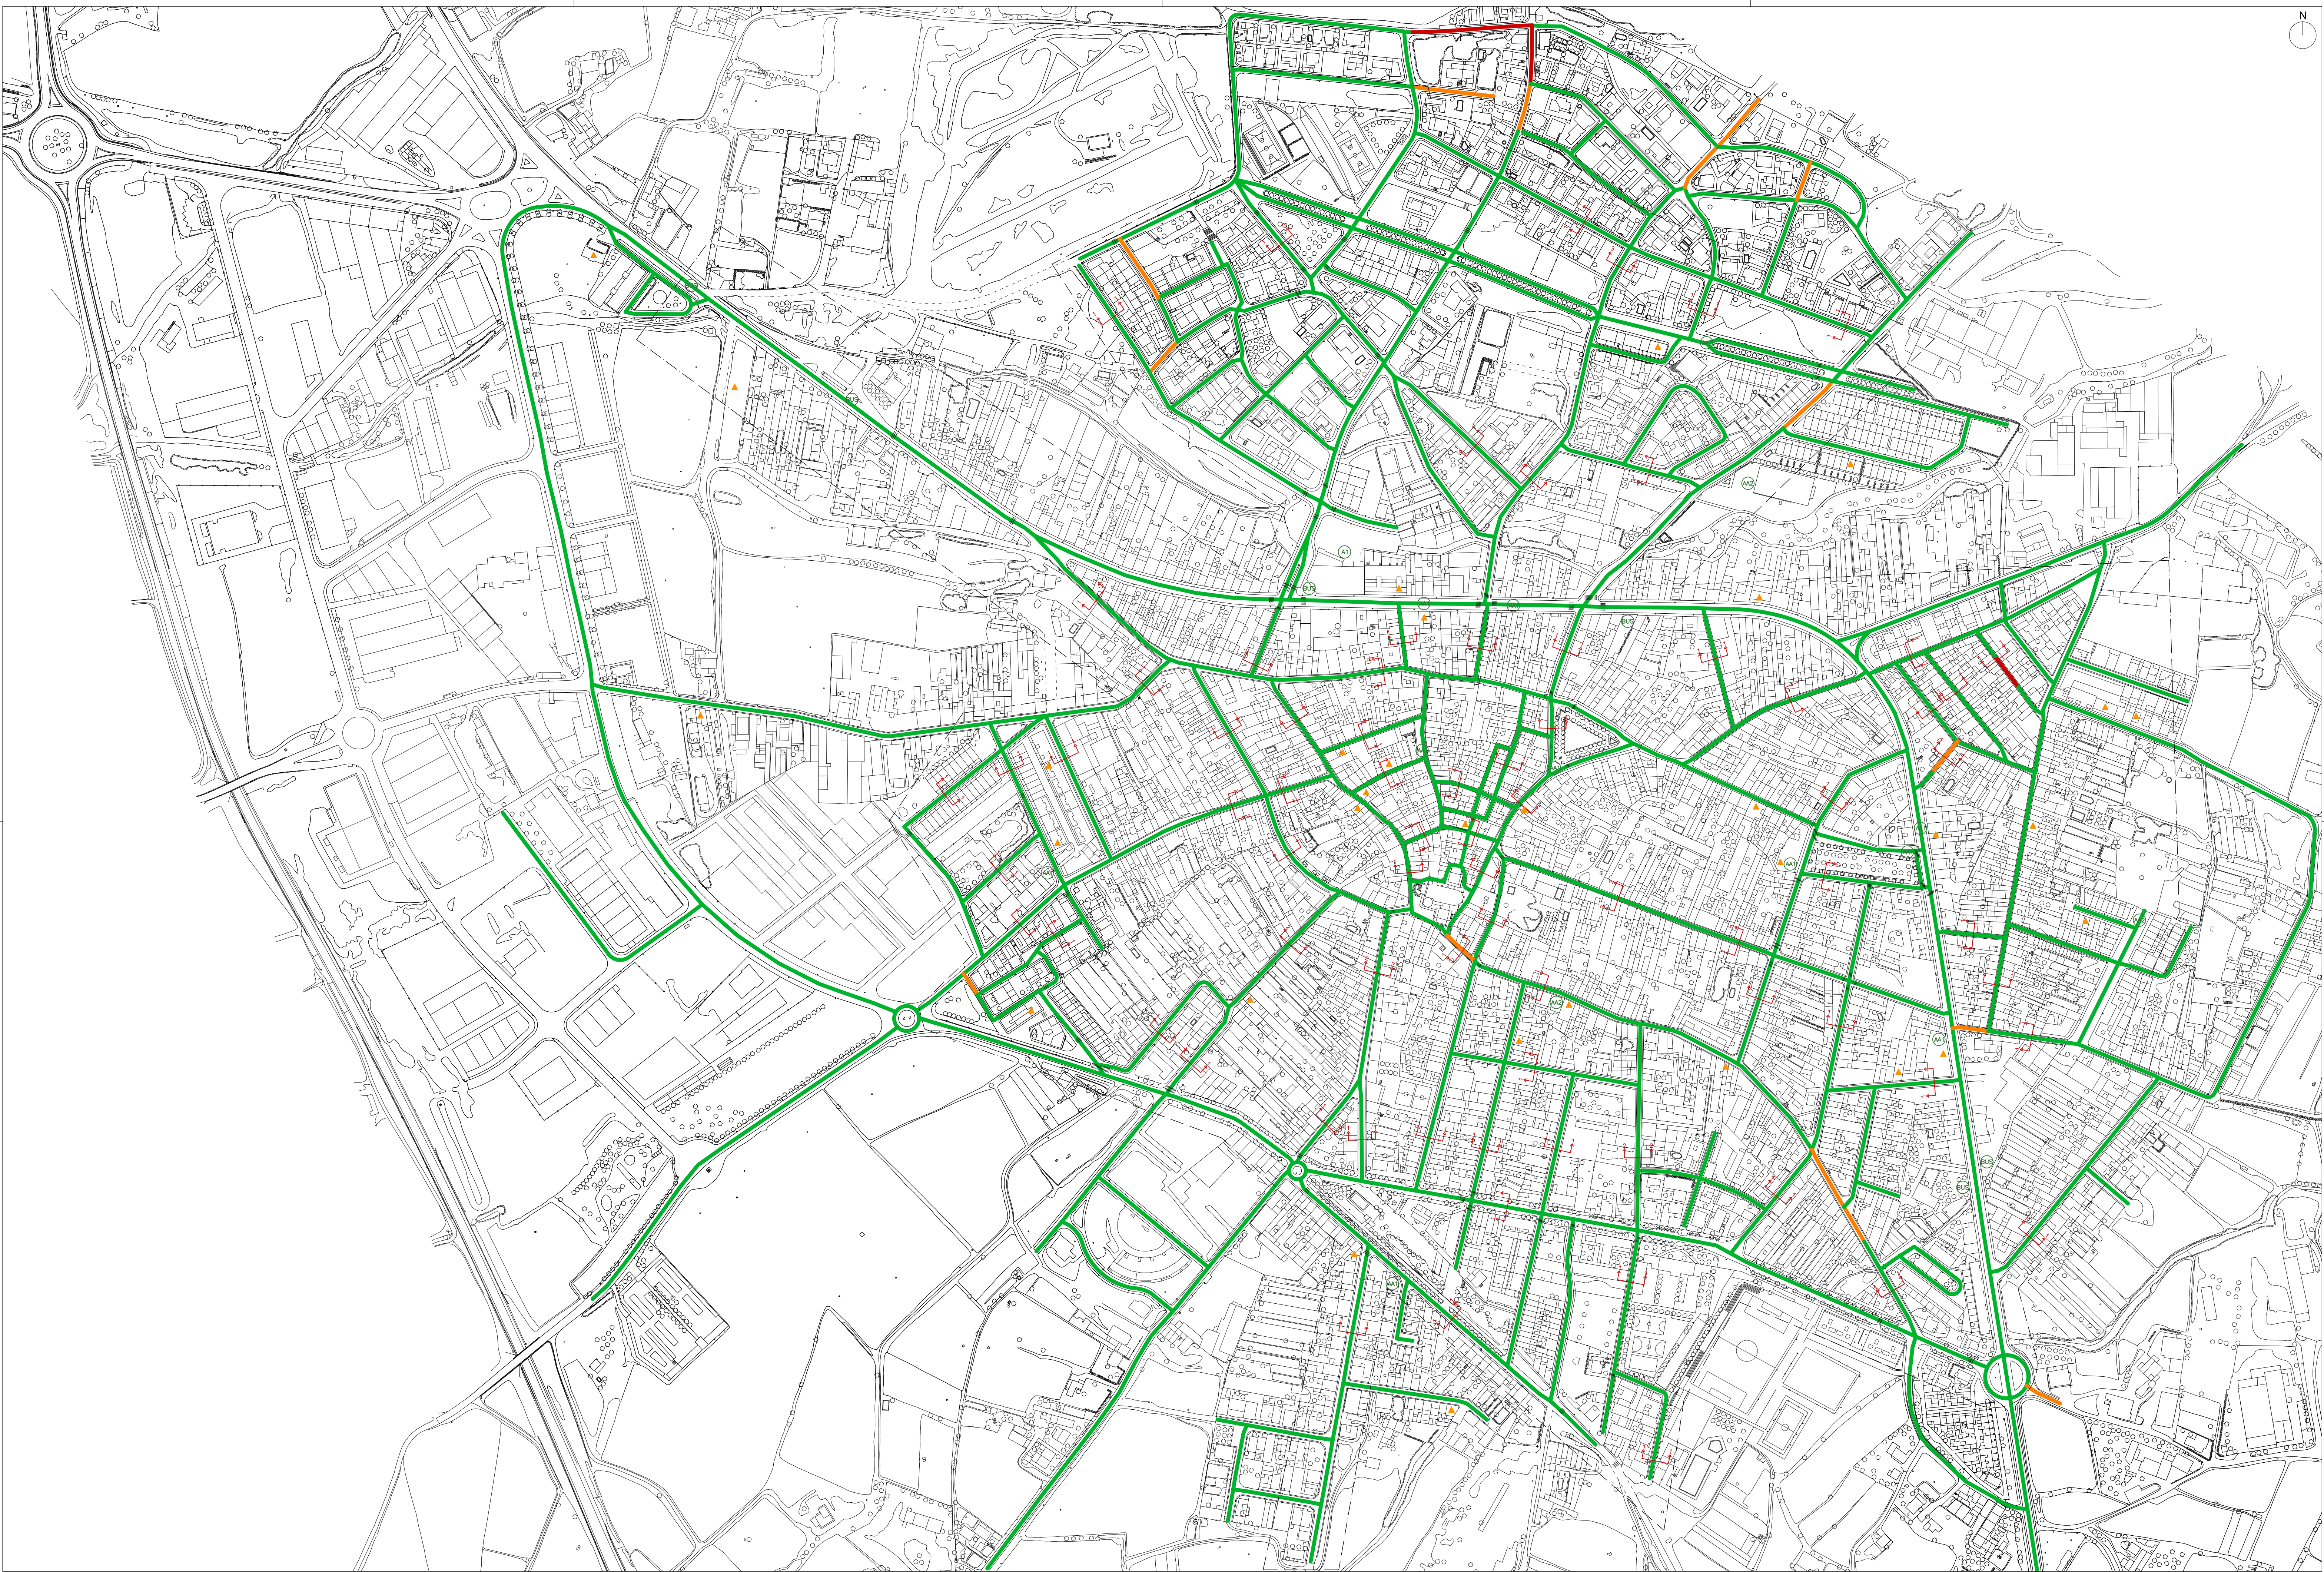

LLEGENDA LLOCS D'INTERÉS PÚBLIC					
AI	Ajuntament	CEIP	Centre d'educació infantil i primària	EM	Emissora municipal
BI	Biblioteca	CR	Correus	F	Farmàcia
CAP	Centre d'atenció primària	CU	Centre cultural	GA	Gasolinera
CC	Centre Comercial	DX	Deixalleria municipal	H	Hotel
CE	Cementiri	EG	Església	IES	Institut d'ensenyament secundari
JT	Juget	LI	Llar d'infants	PL	Plàting
SE	Sala municipal d'exposicions	PP	Pavelló polivalent	VT	Veterinari
RG	Residència Geriàtrica	ZE	Zona esportiva	3E	Llar municipal 3a edat

LLEGENDA APARCAMENTS I TRANSPORT	
BUS	PARADA DE BUS
AA1	APARCAMENT LLUIRE, numero = nombre de plaques

LLEGENDA	
---	LIMIT ZONA ÀMBIT DEL PROJECTE
---	PENDENT DEL CARRER INFERIOR AL 8%
---	PENDENT DEL CARRER ENTRE 8% I EL 12%
---	PENDENT DEL CARRER SUPERIOR AL 12%


PLA D'ACCESSIBILITAT PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA DE CASSÀ DE LA SELVA

PENDENTS DELS CARRERS  
PLÀNOL 2 - E:1/2500  
M.MERCÉ COROMINAS I NOGUERA - ARQUITECTA


GIRONA, FEBRER 2.009





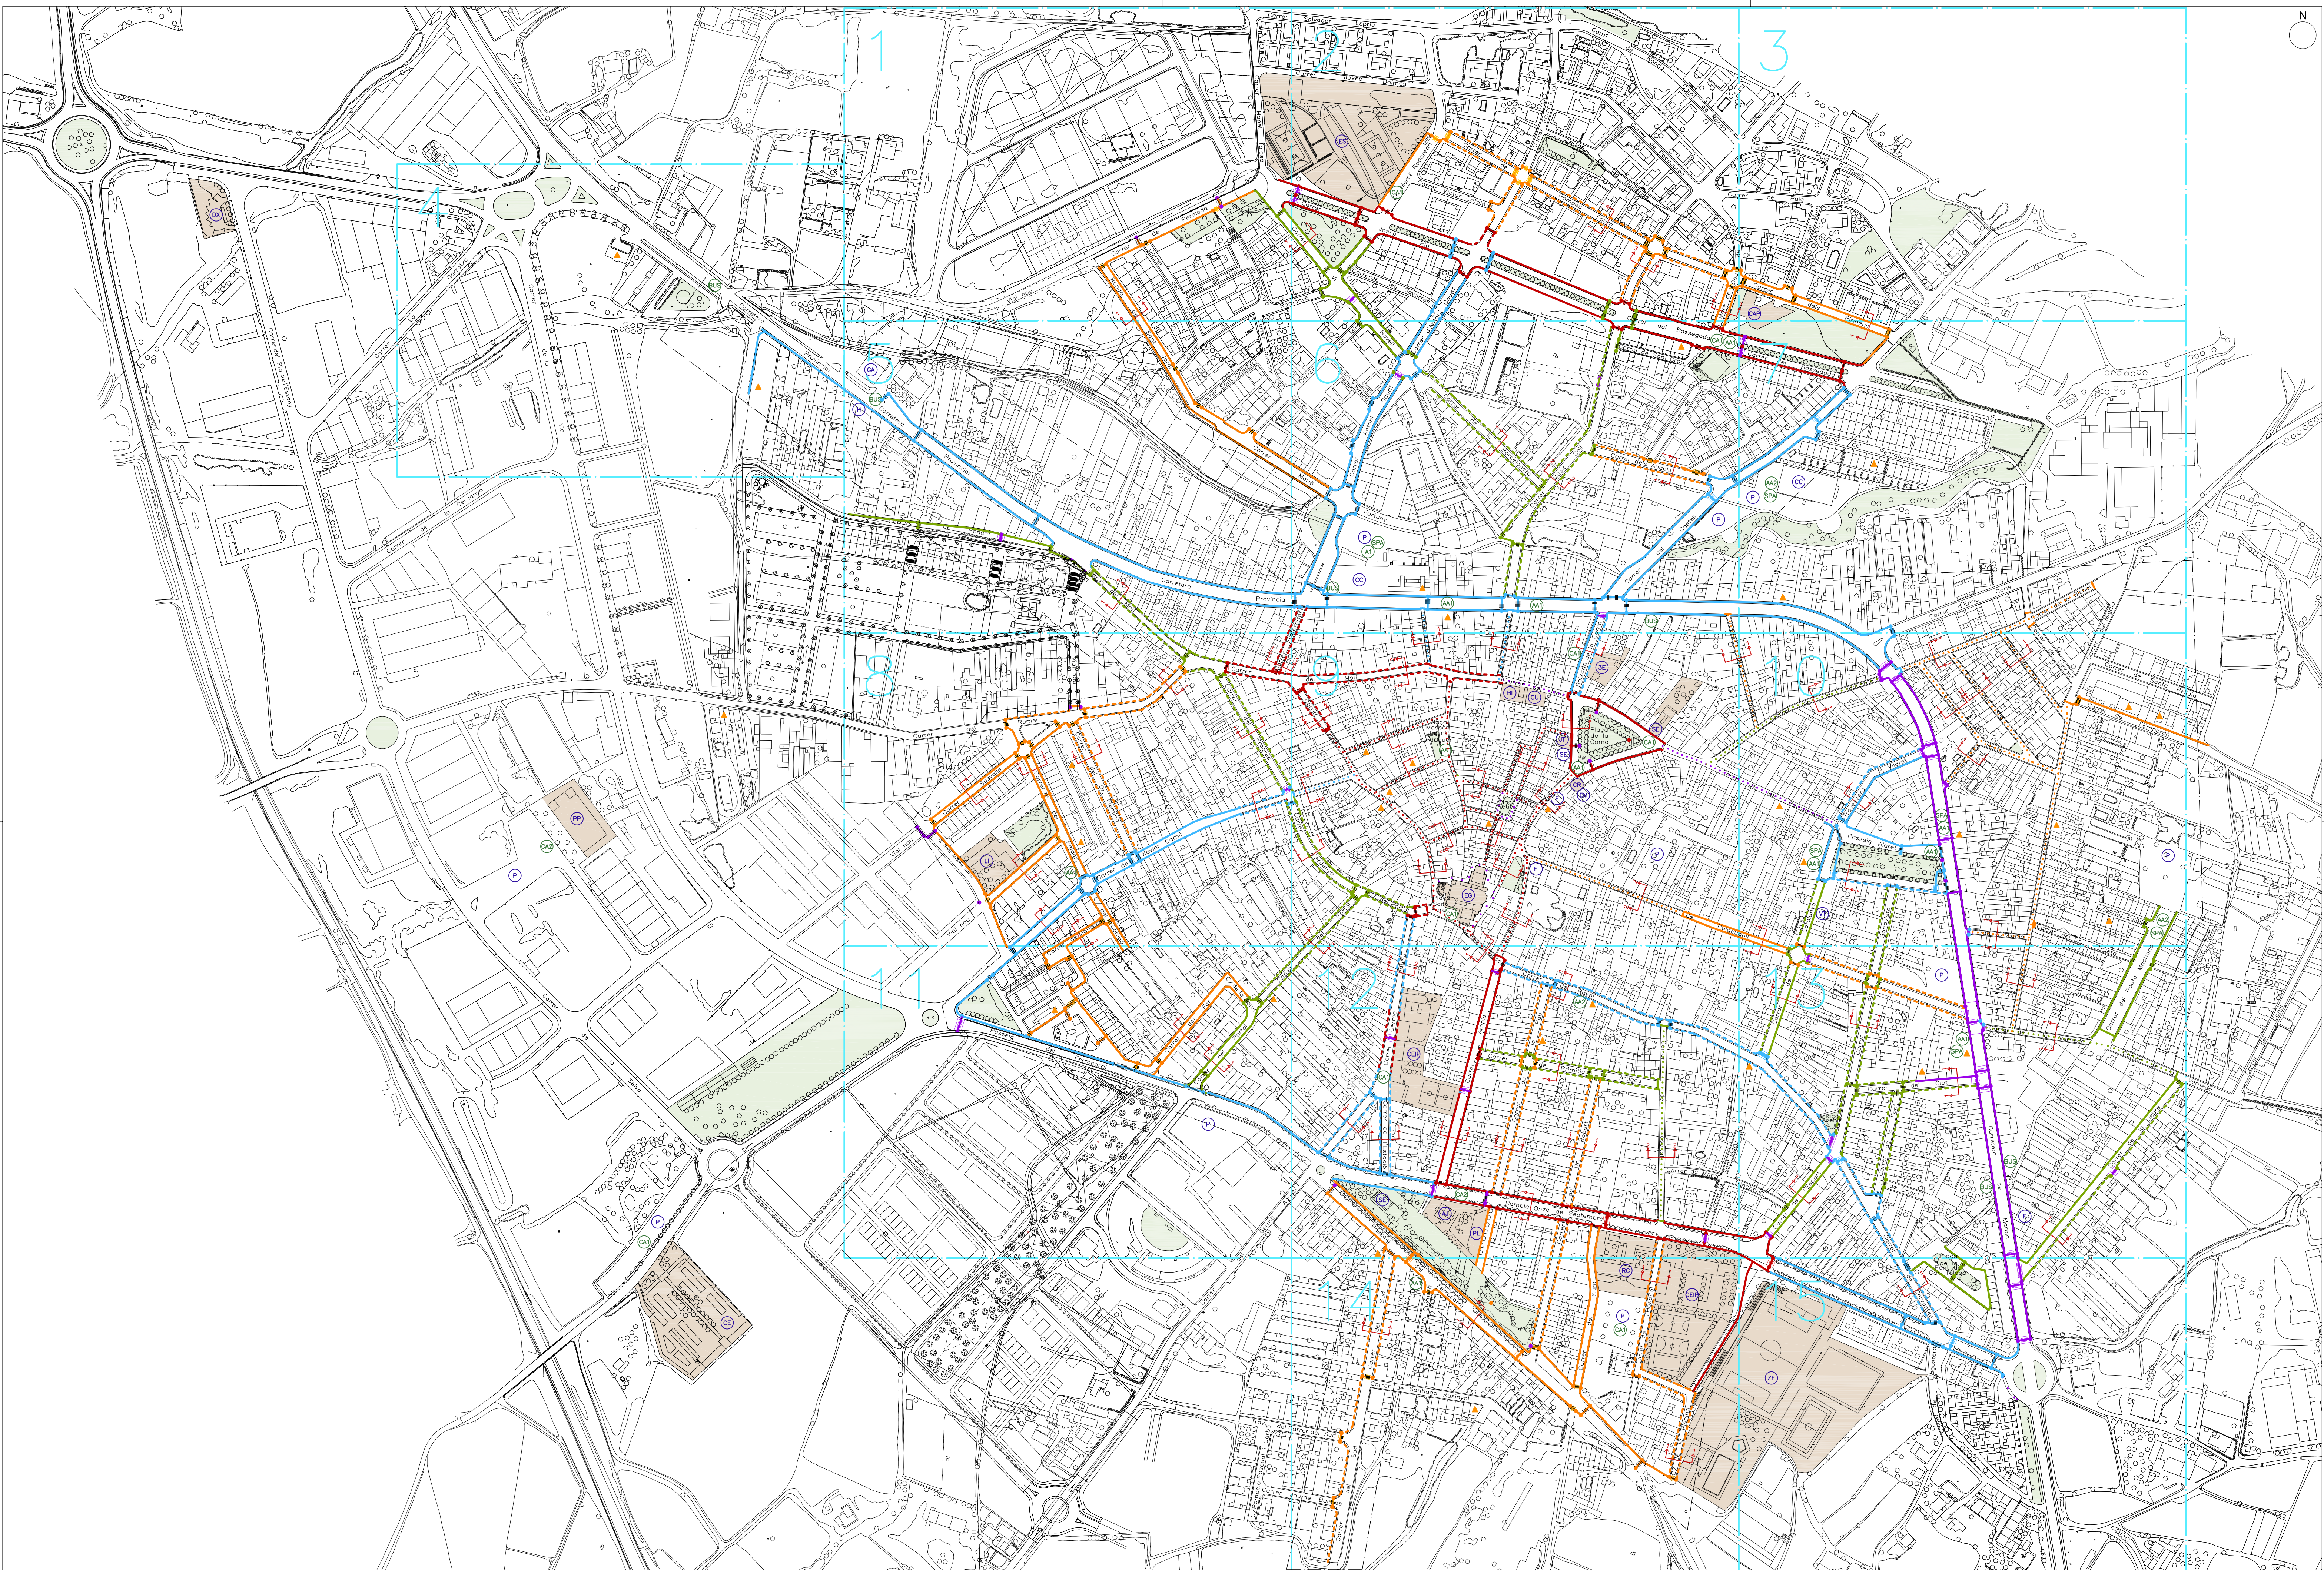



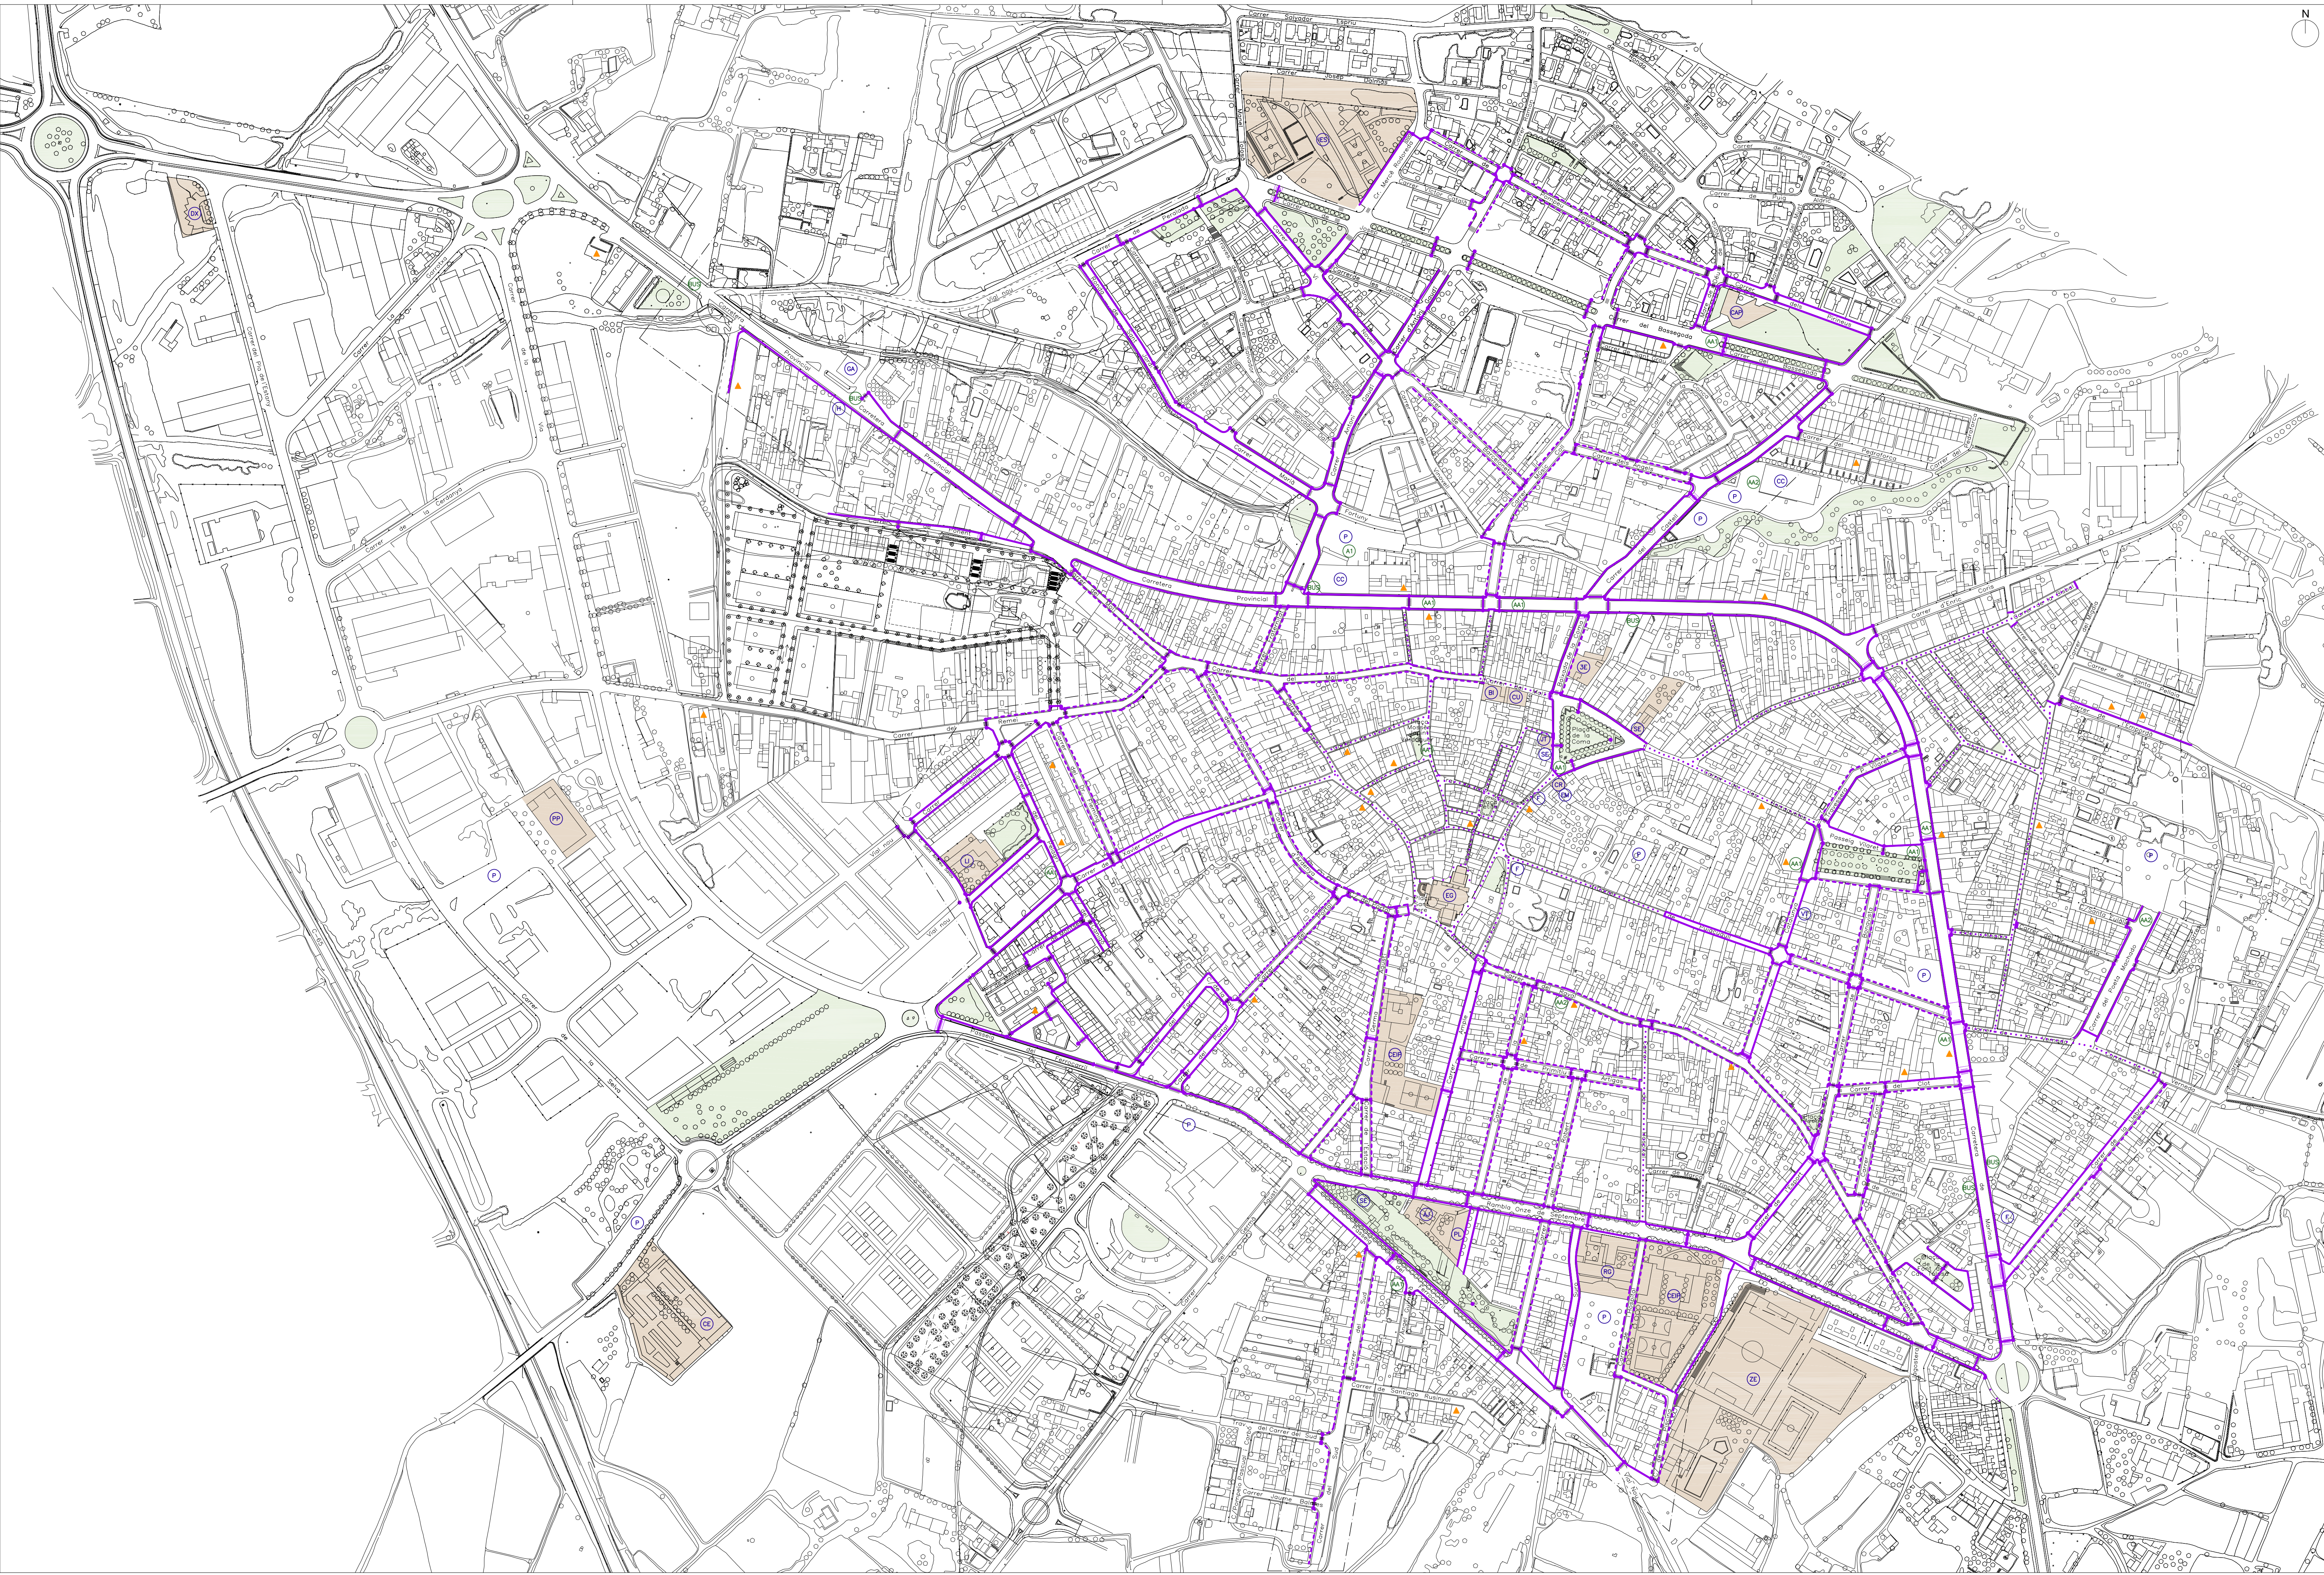










**DOCUMENTACIÓ GRÀFICA:**  
**Plànols de detall**









**PLA D'ACCESSIBILITAT PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES  
ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA DE CASSÀ DE LA SELVA.**





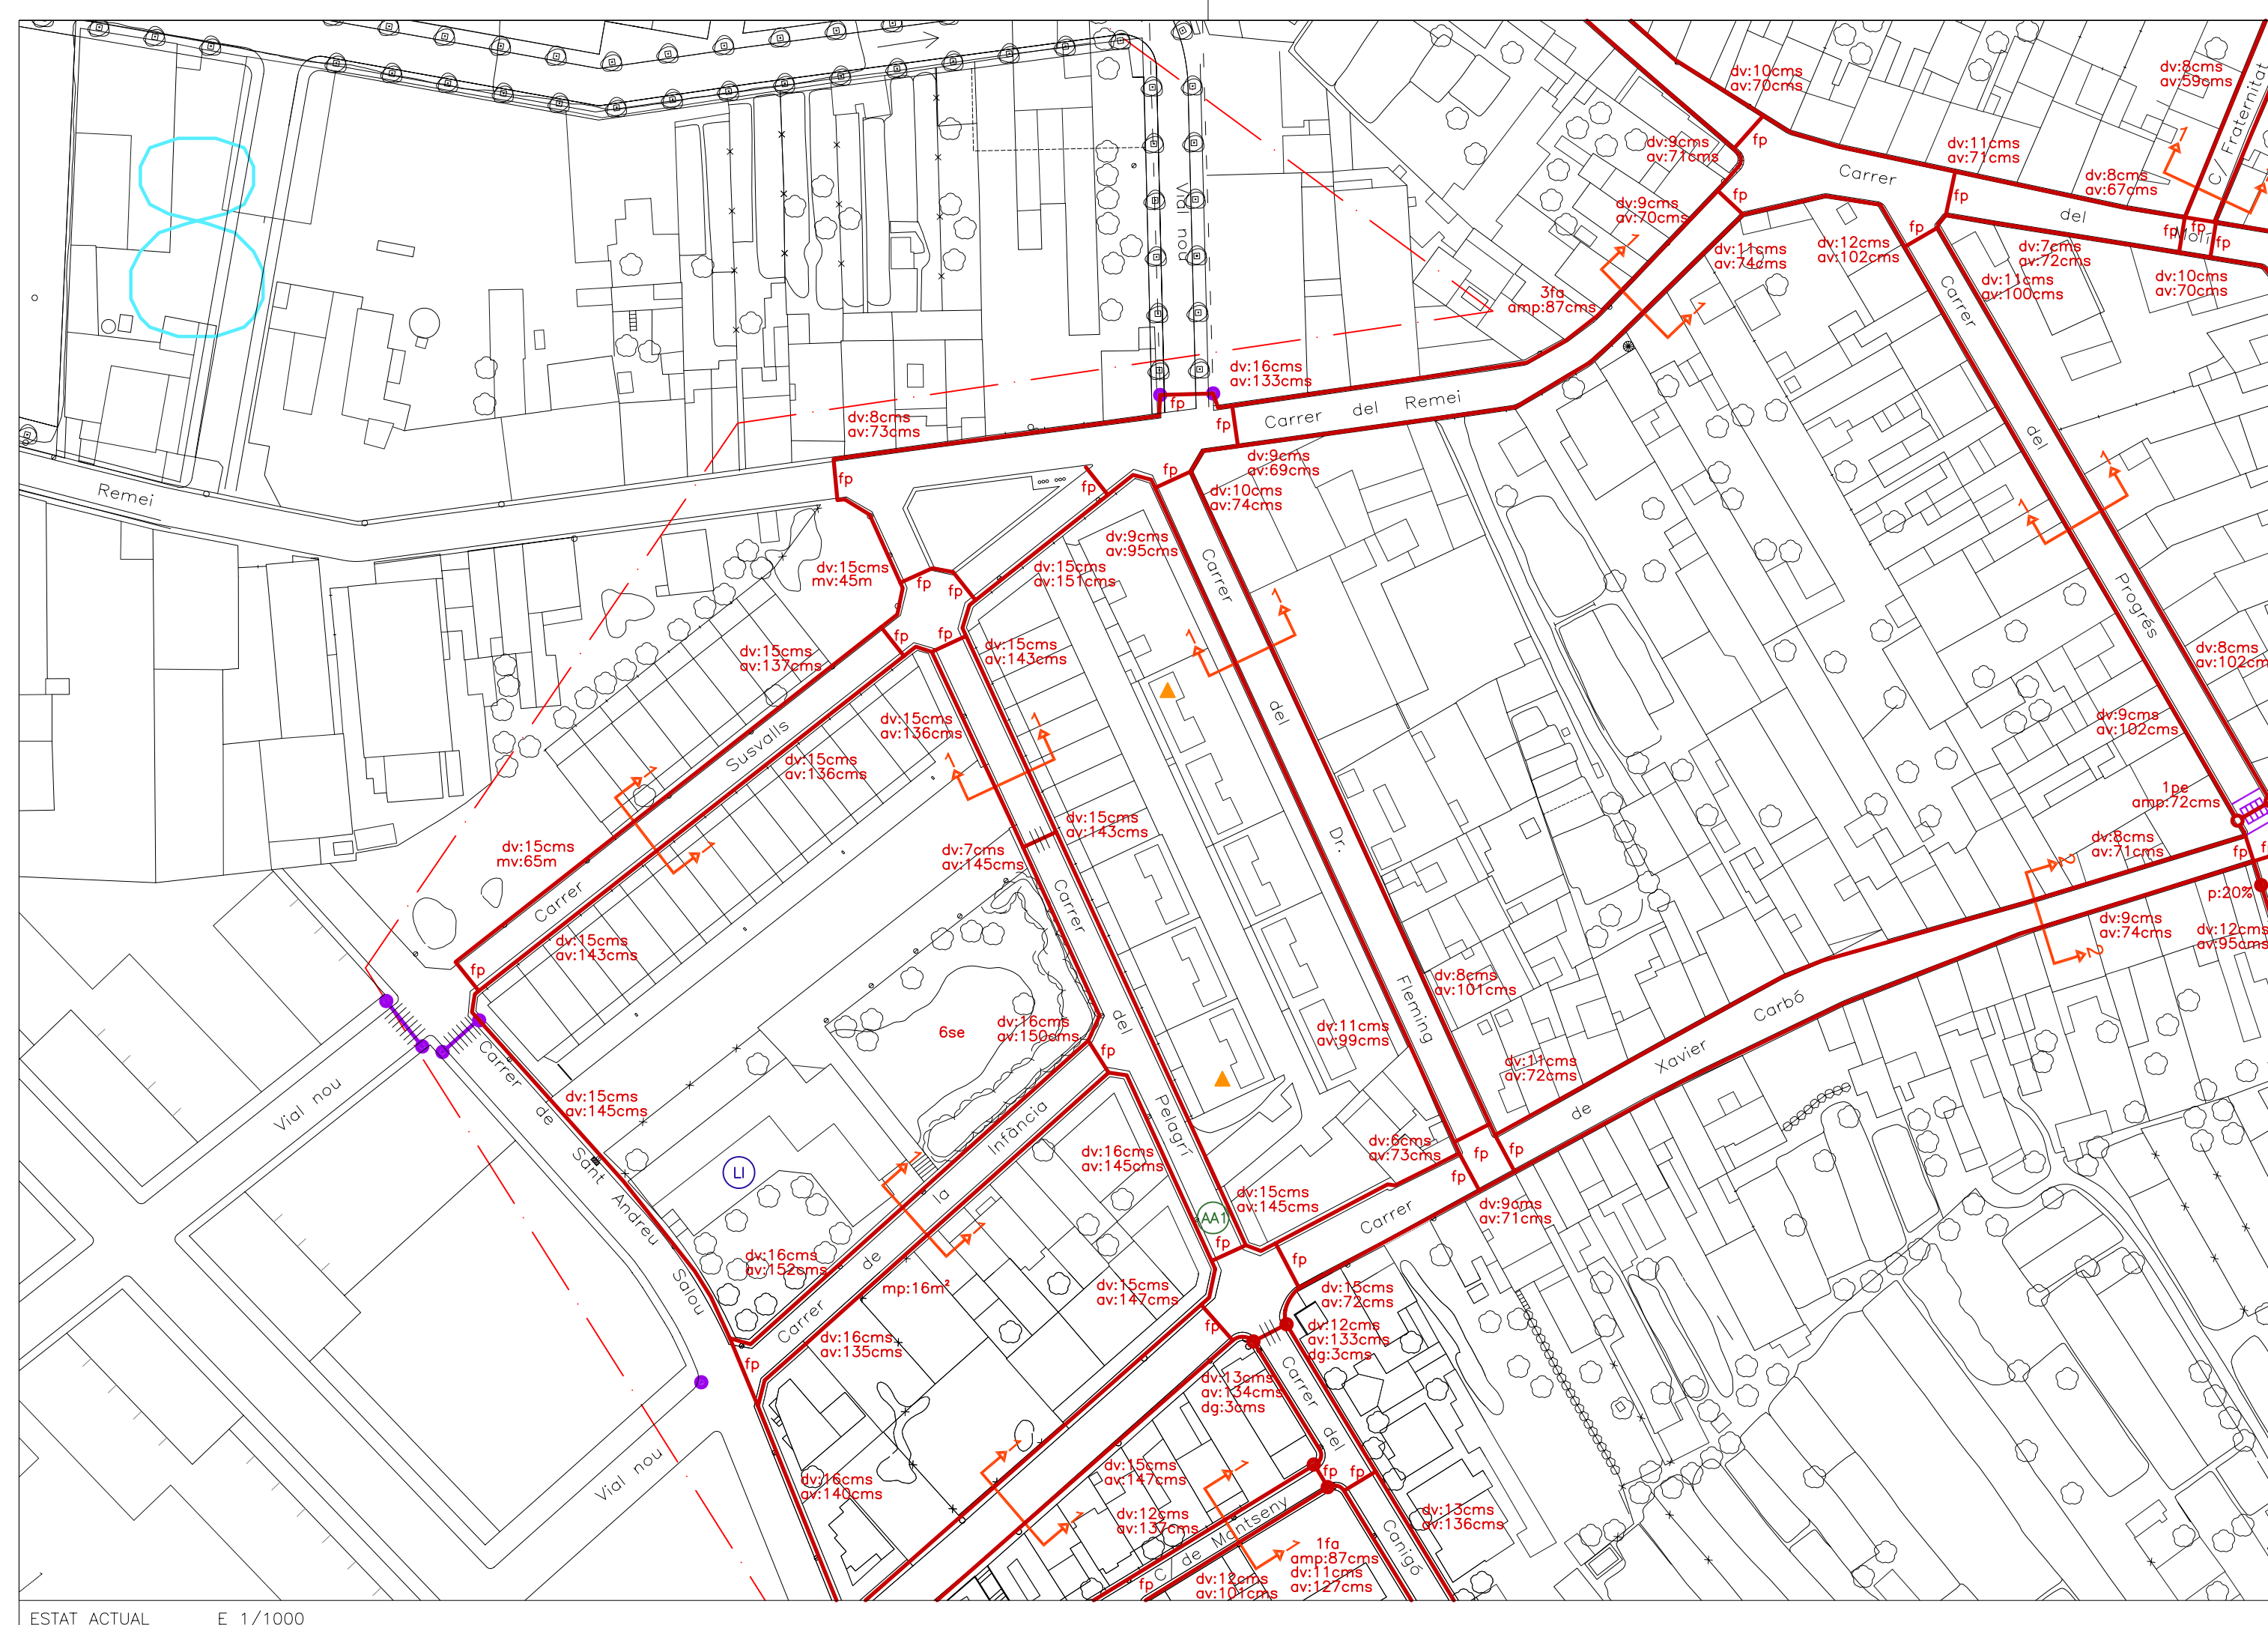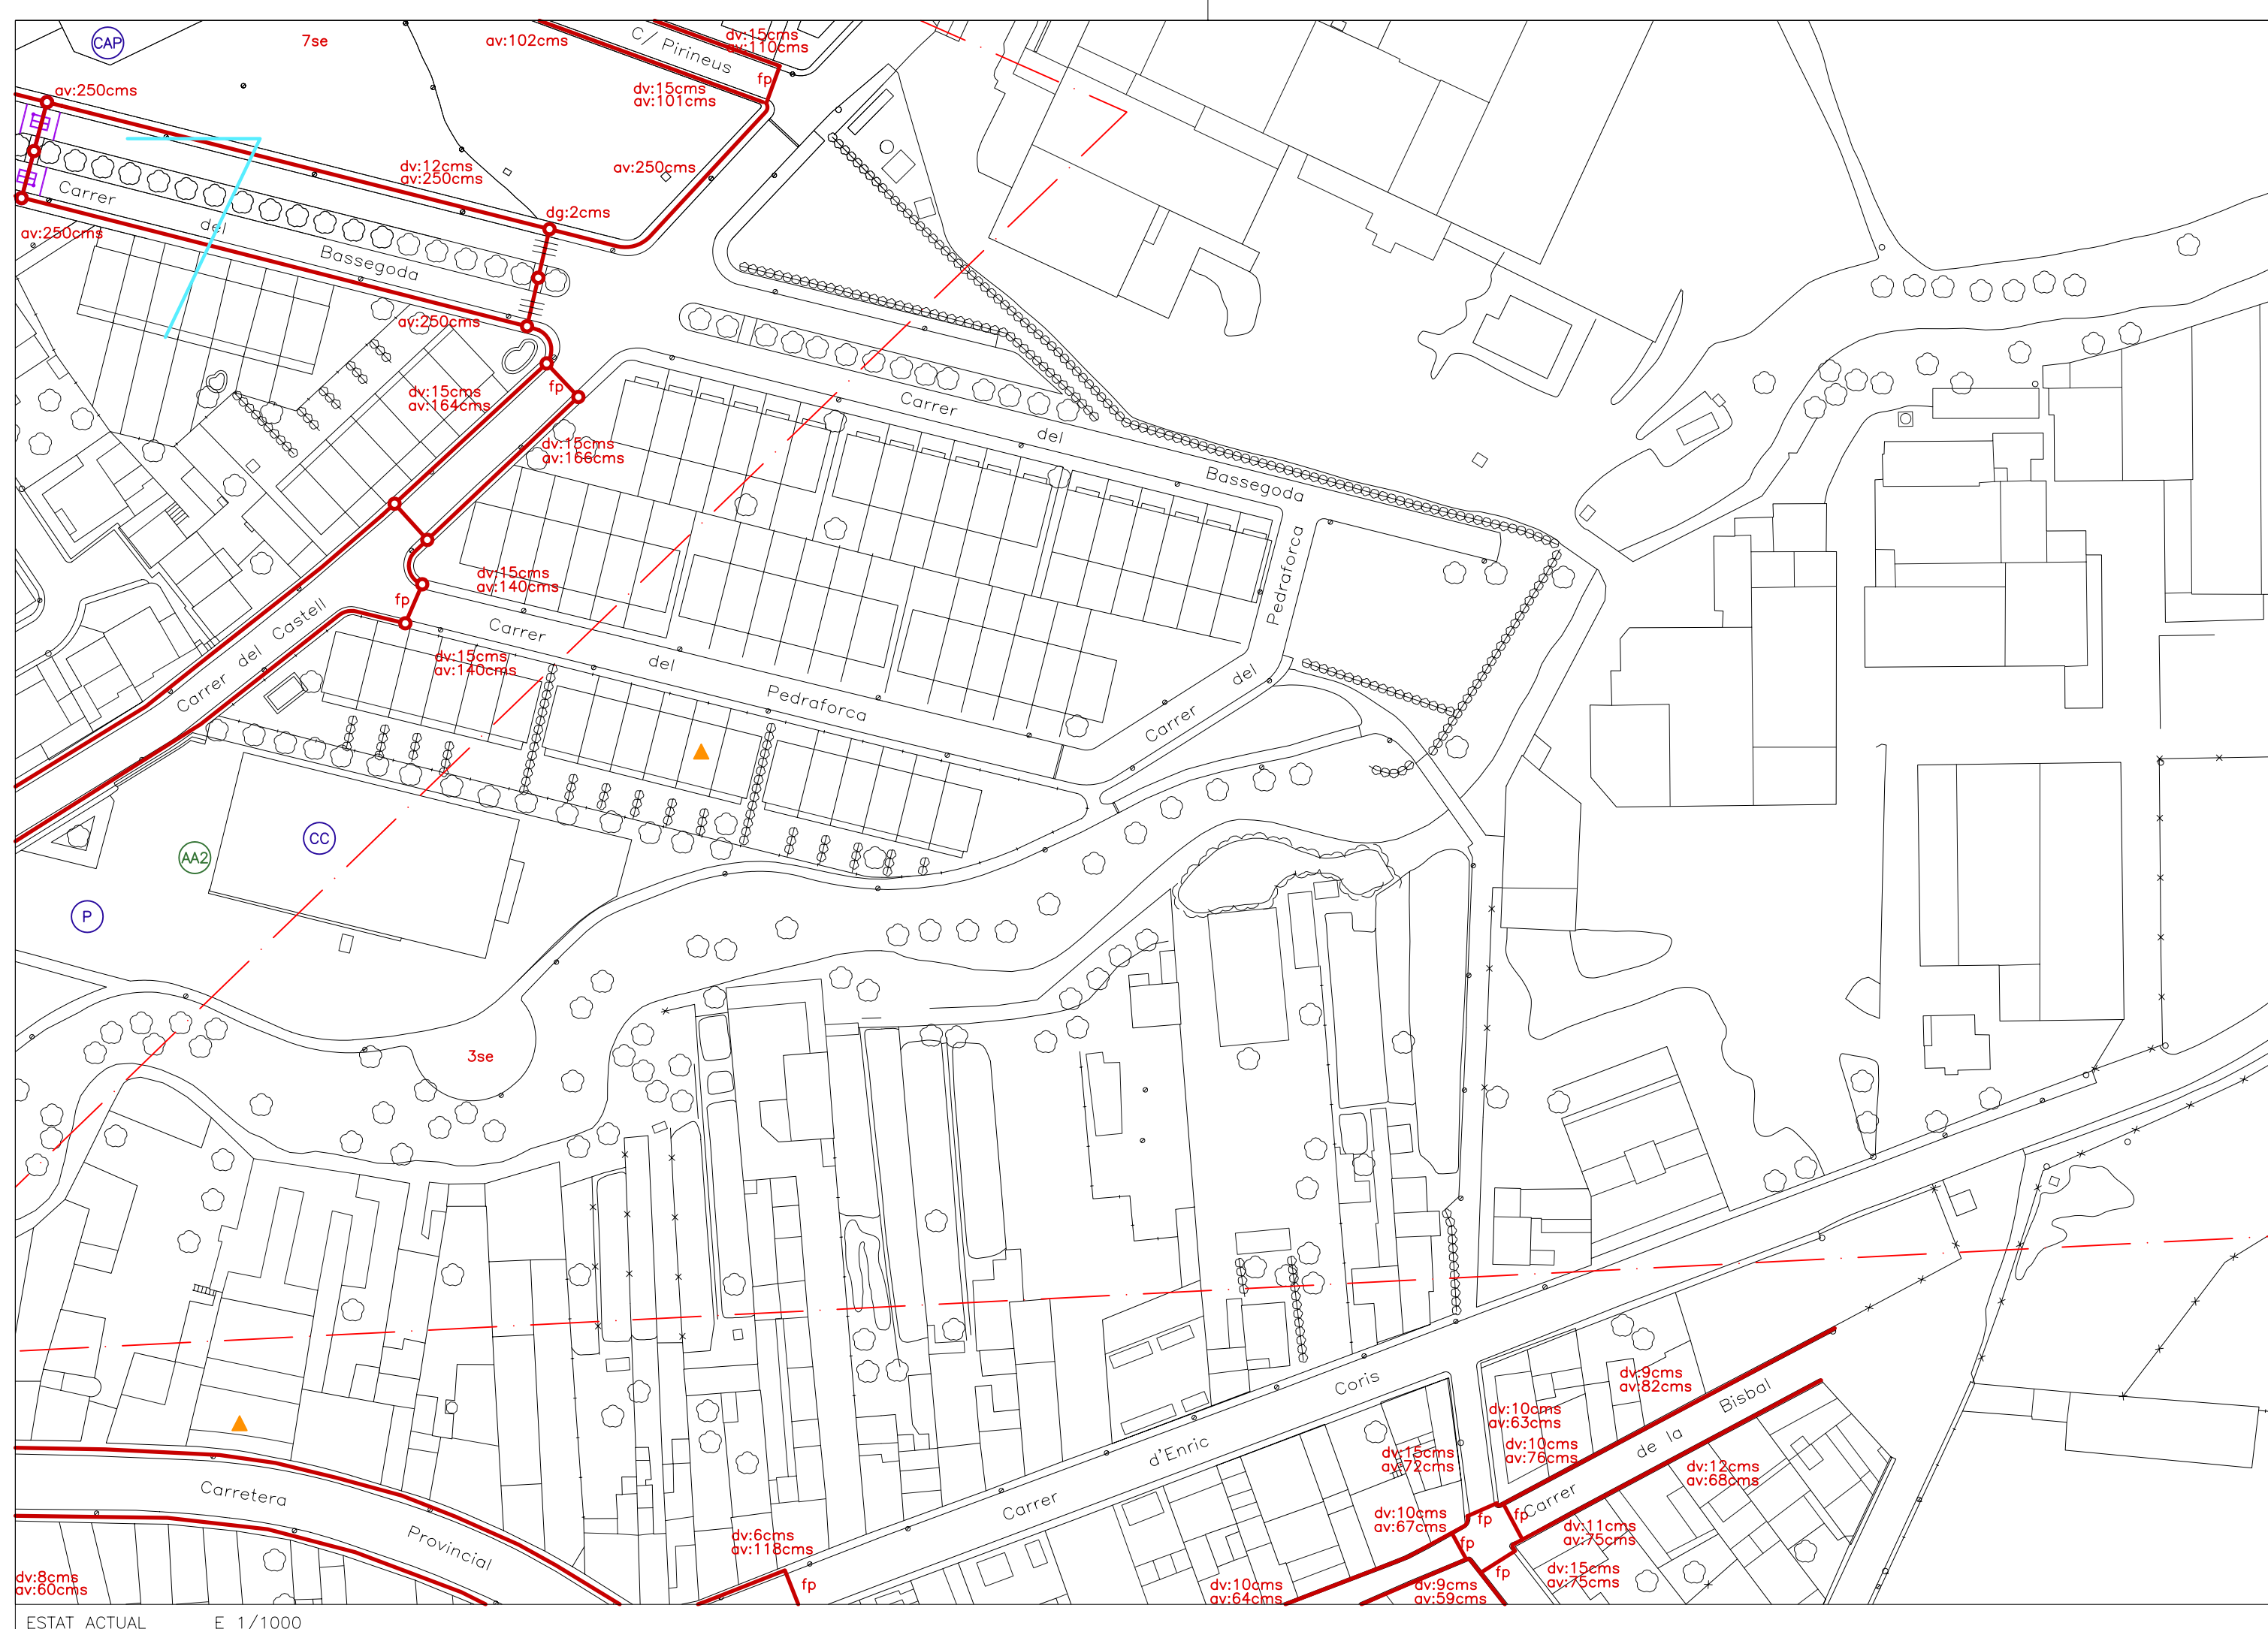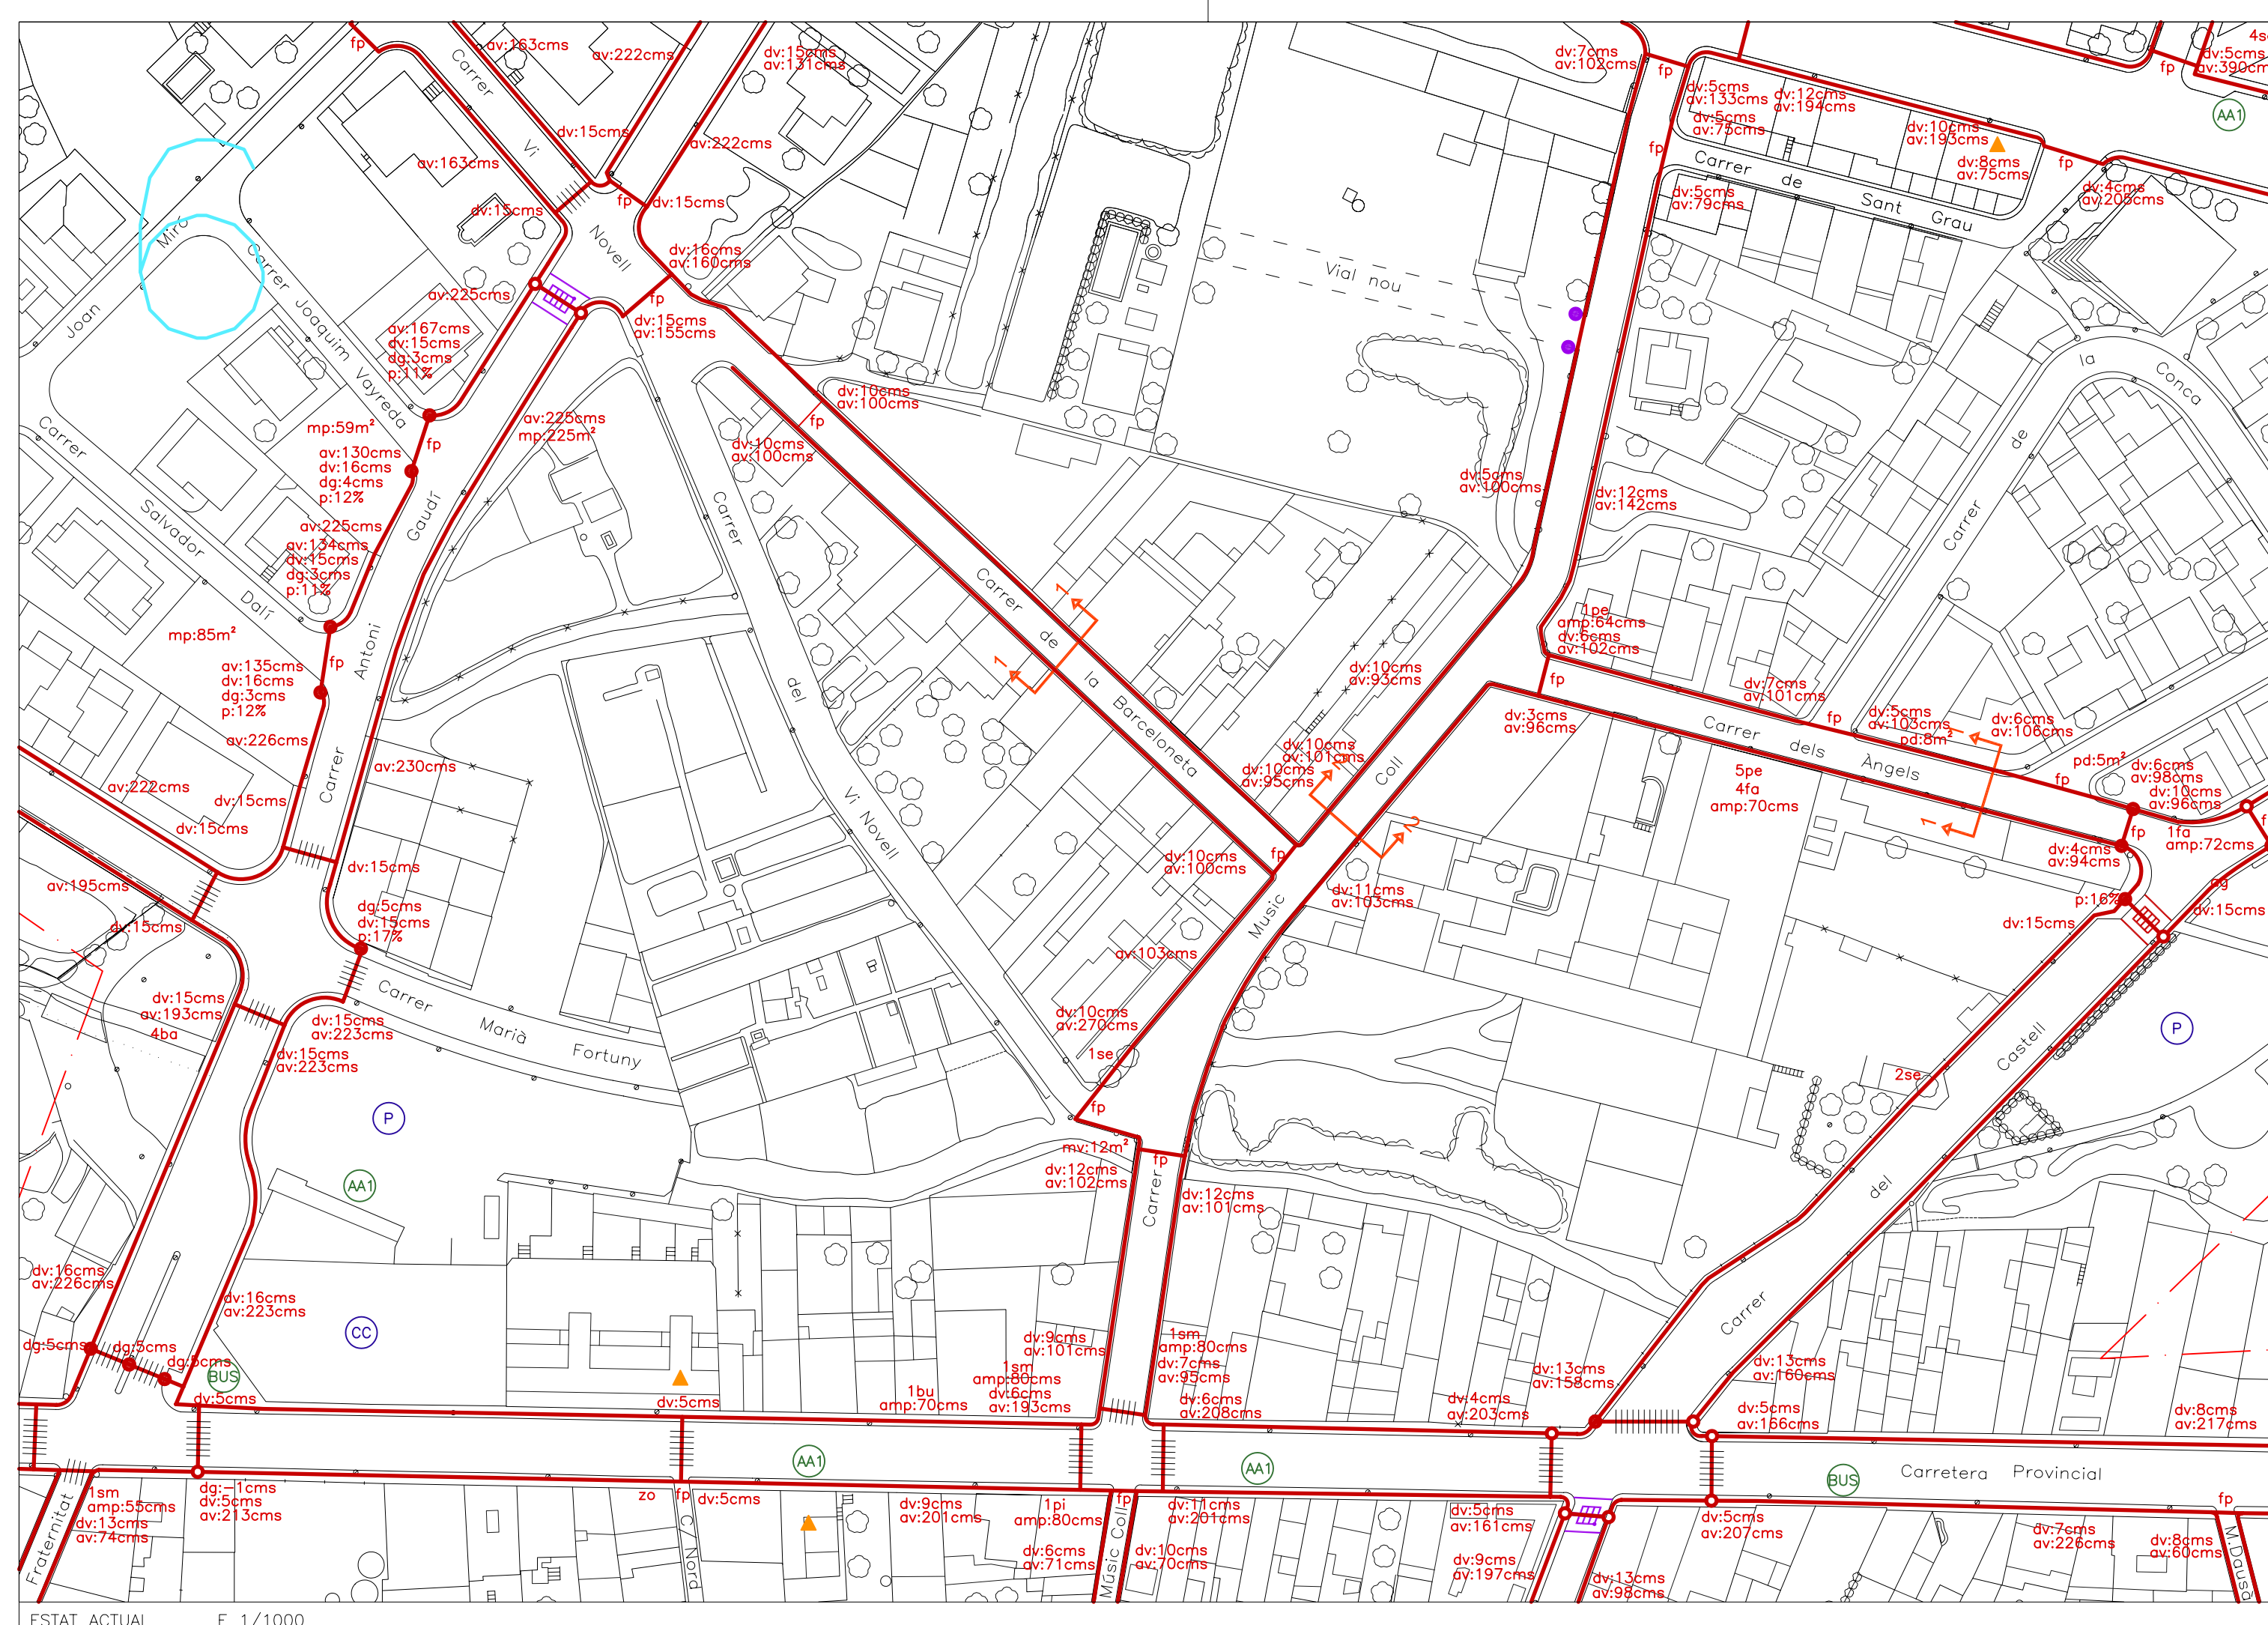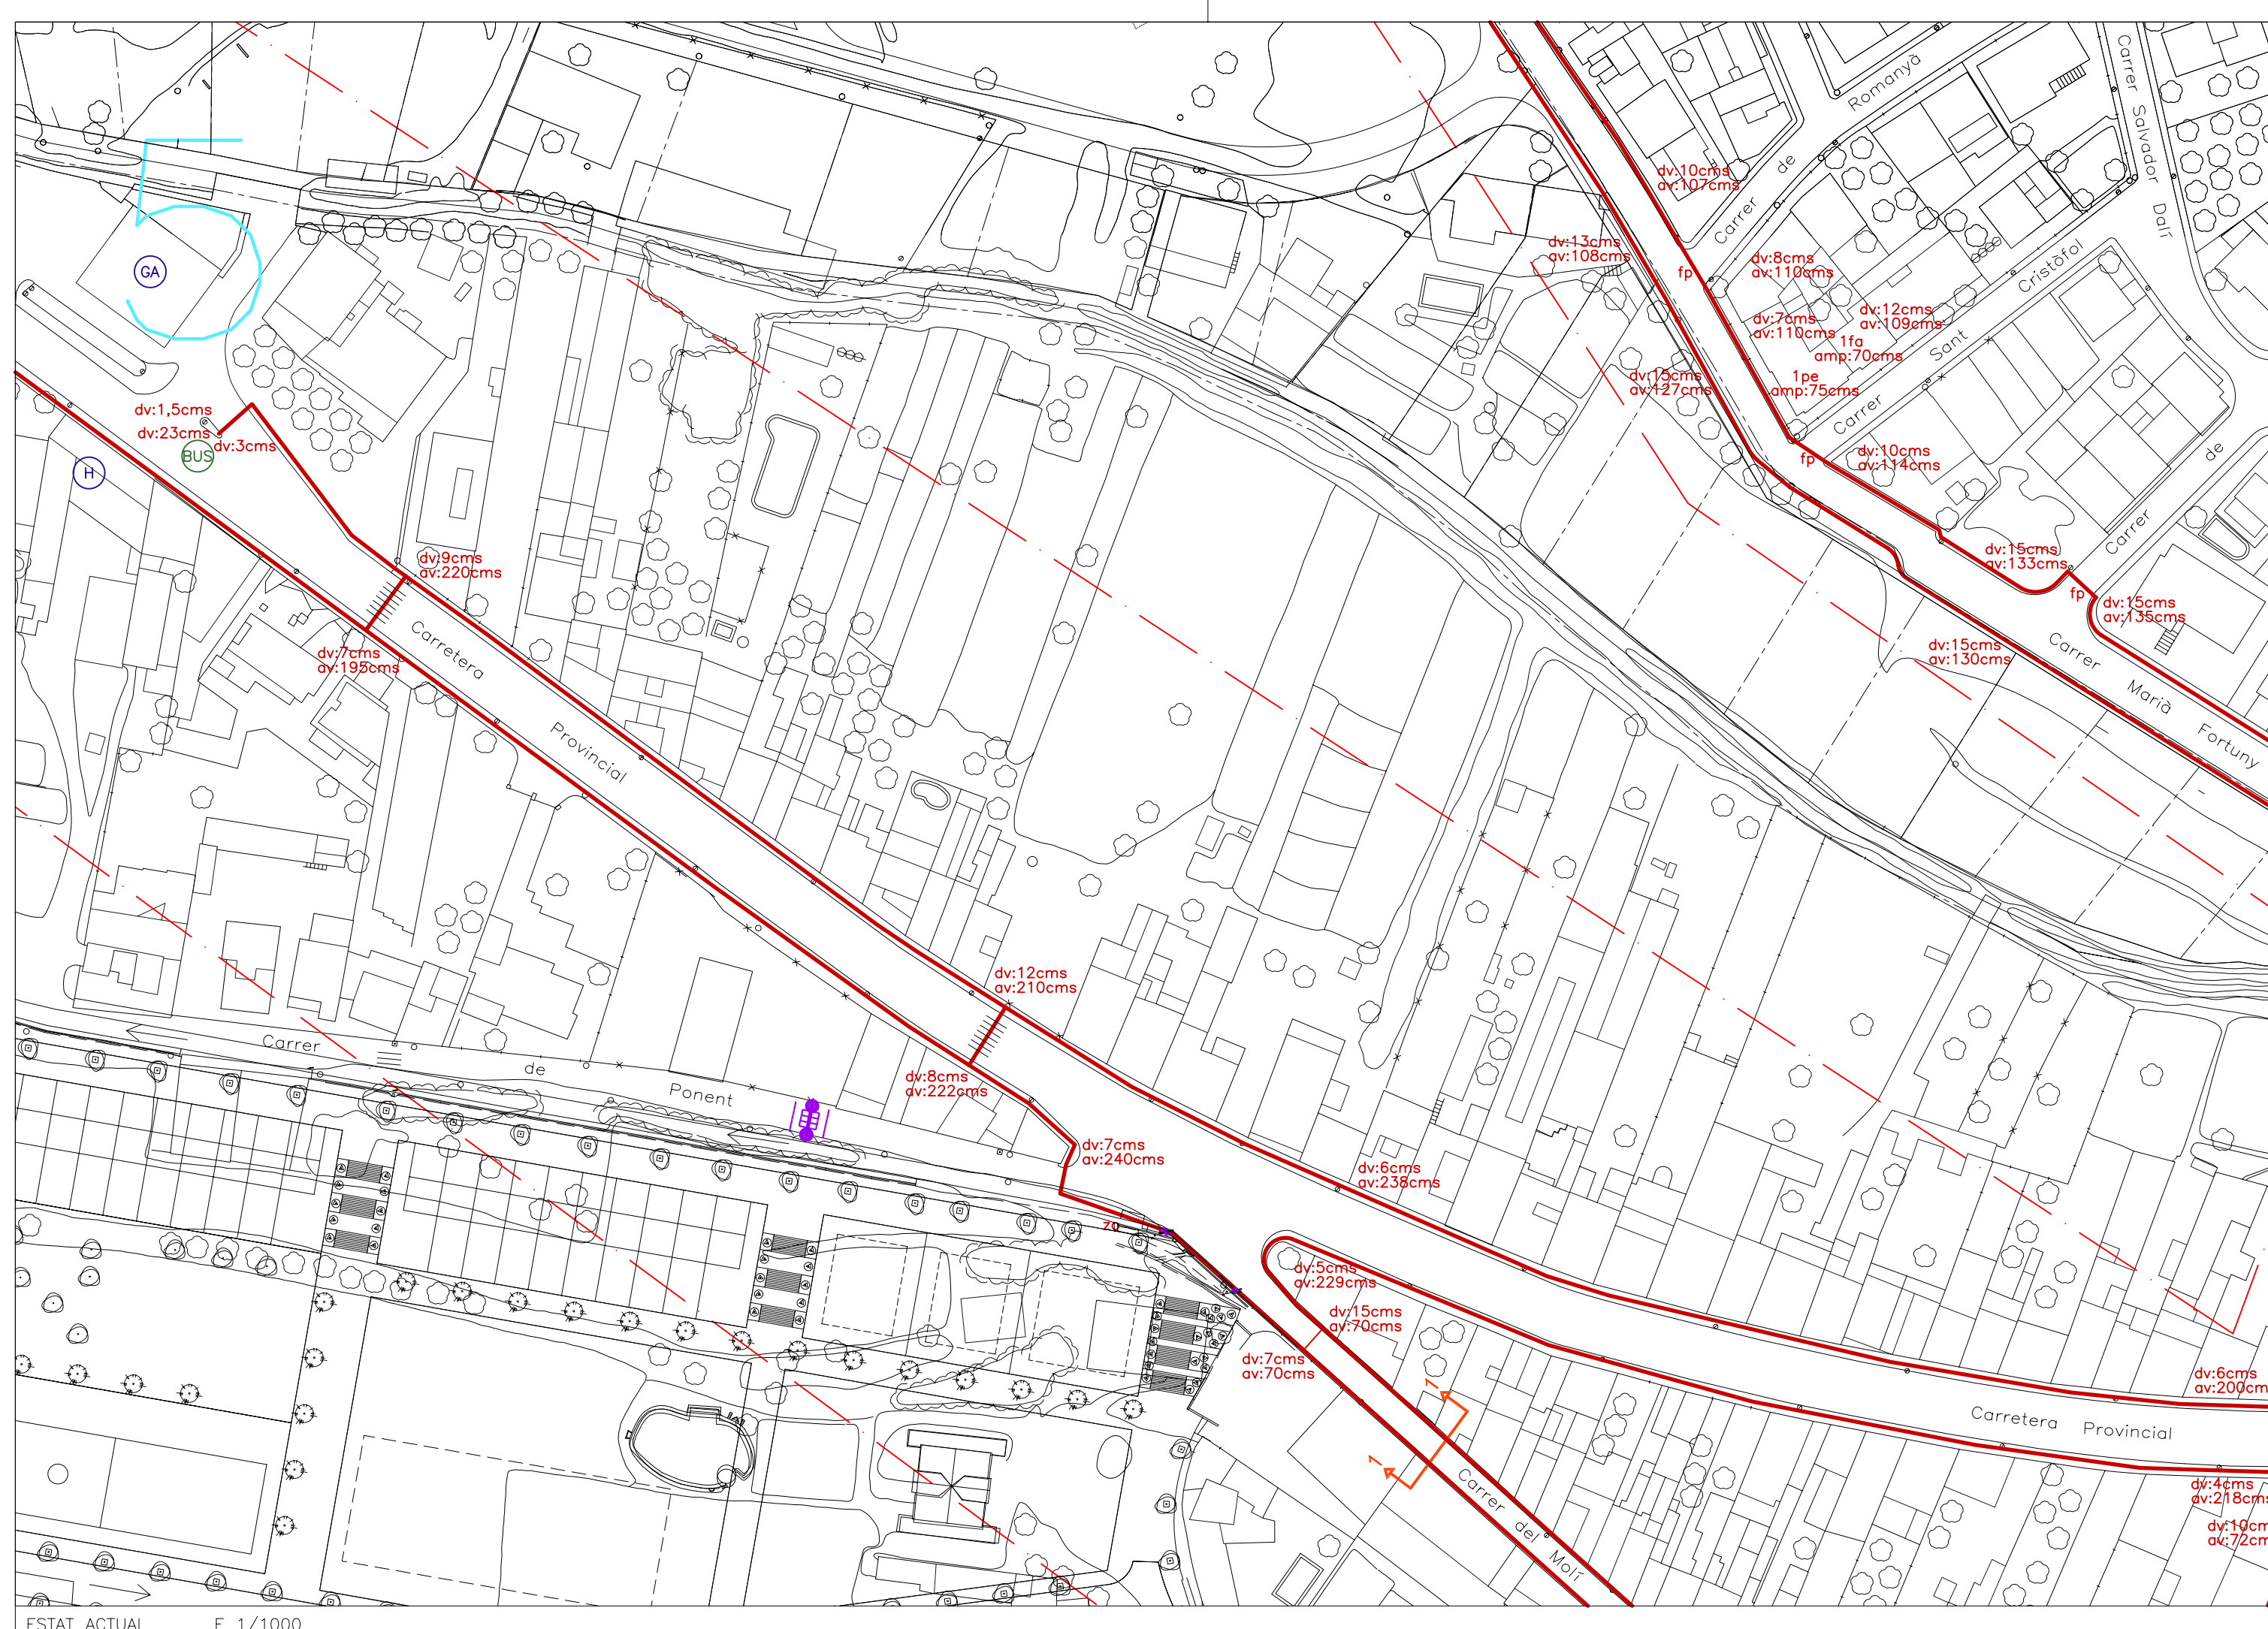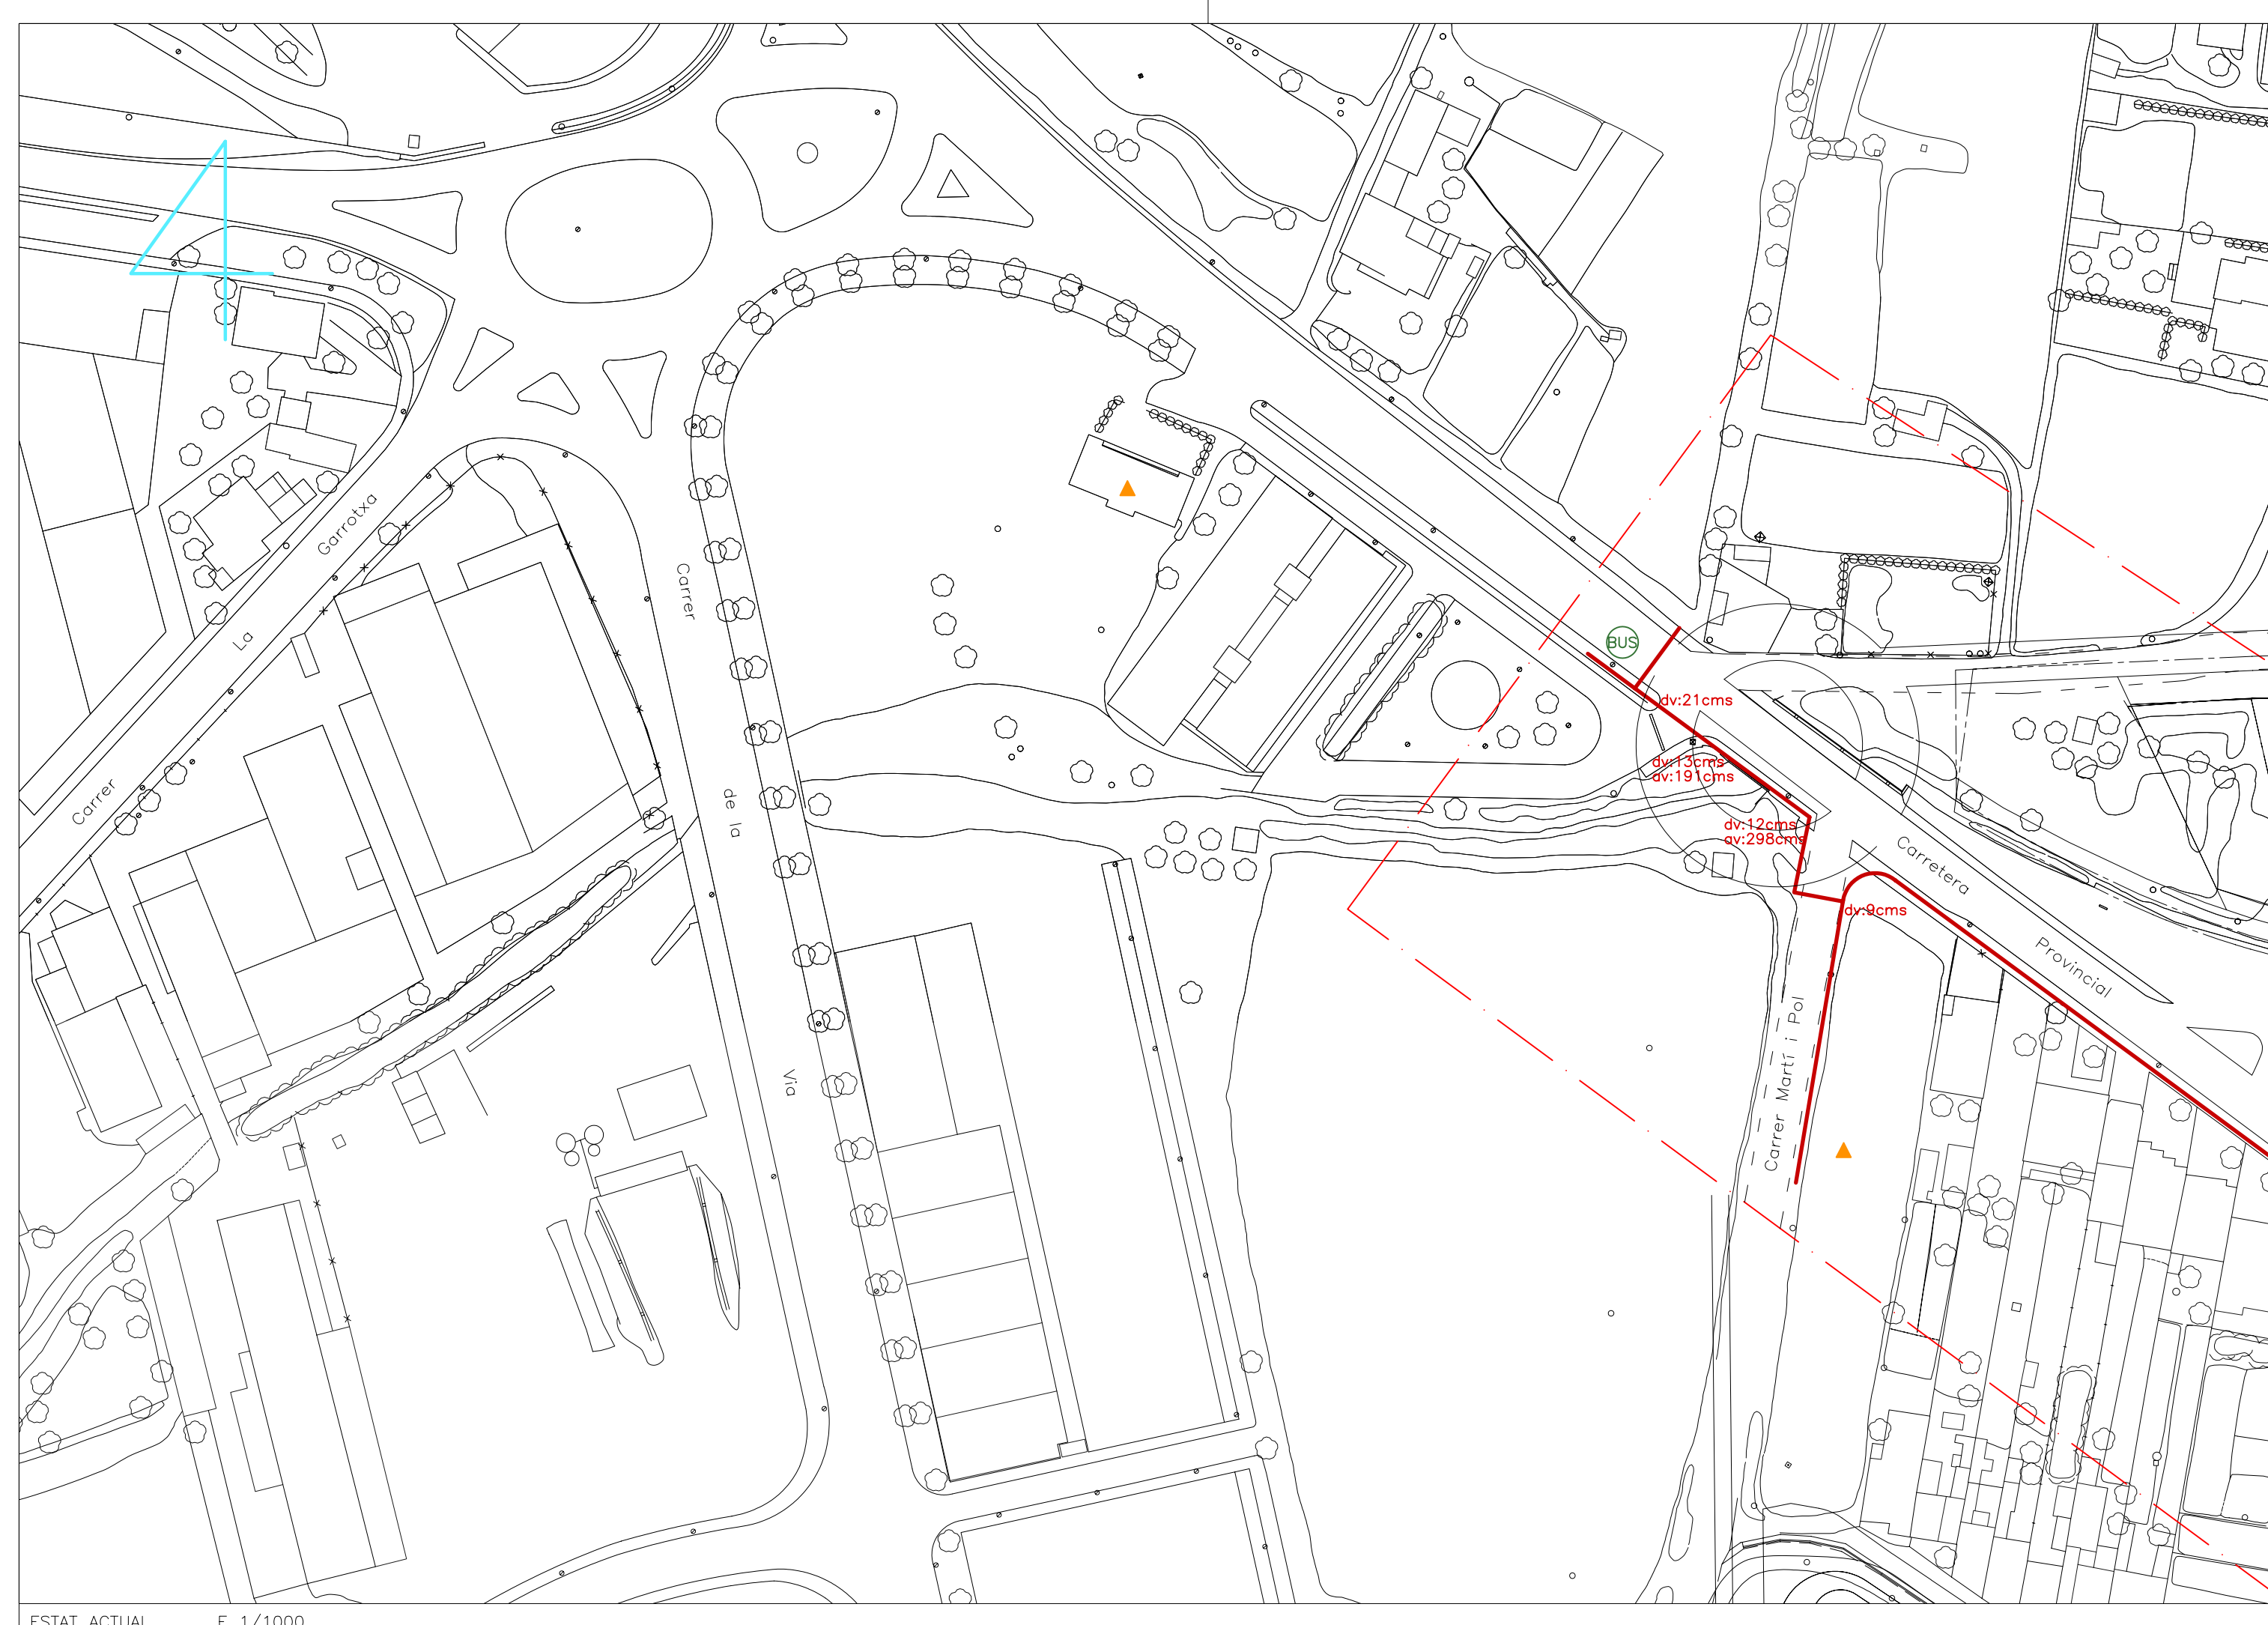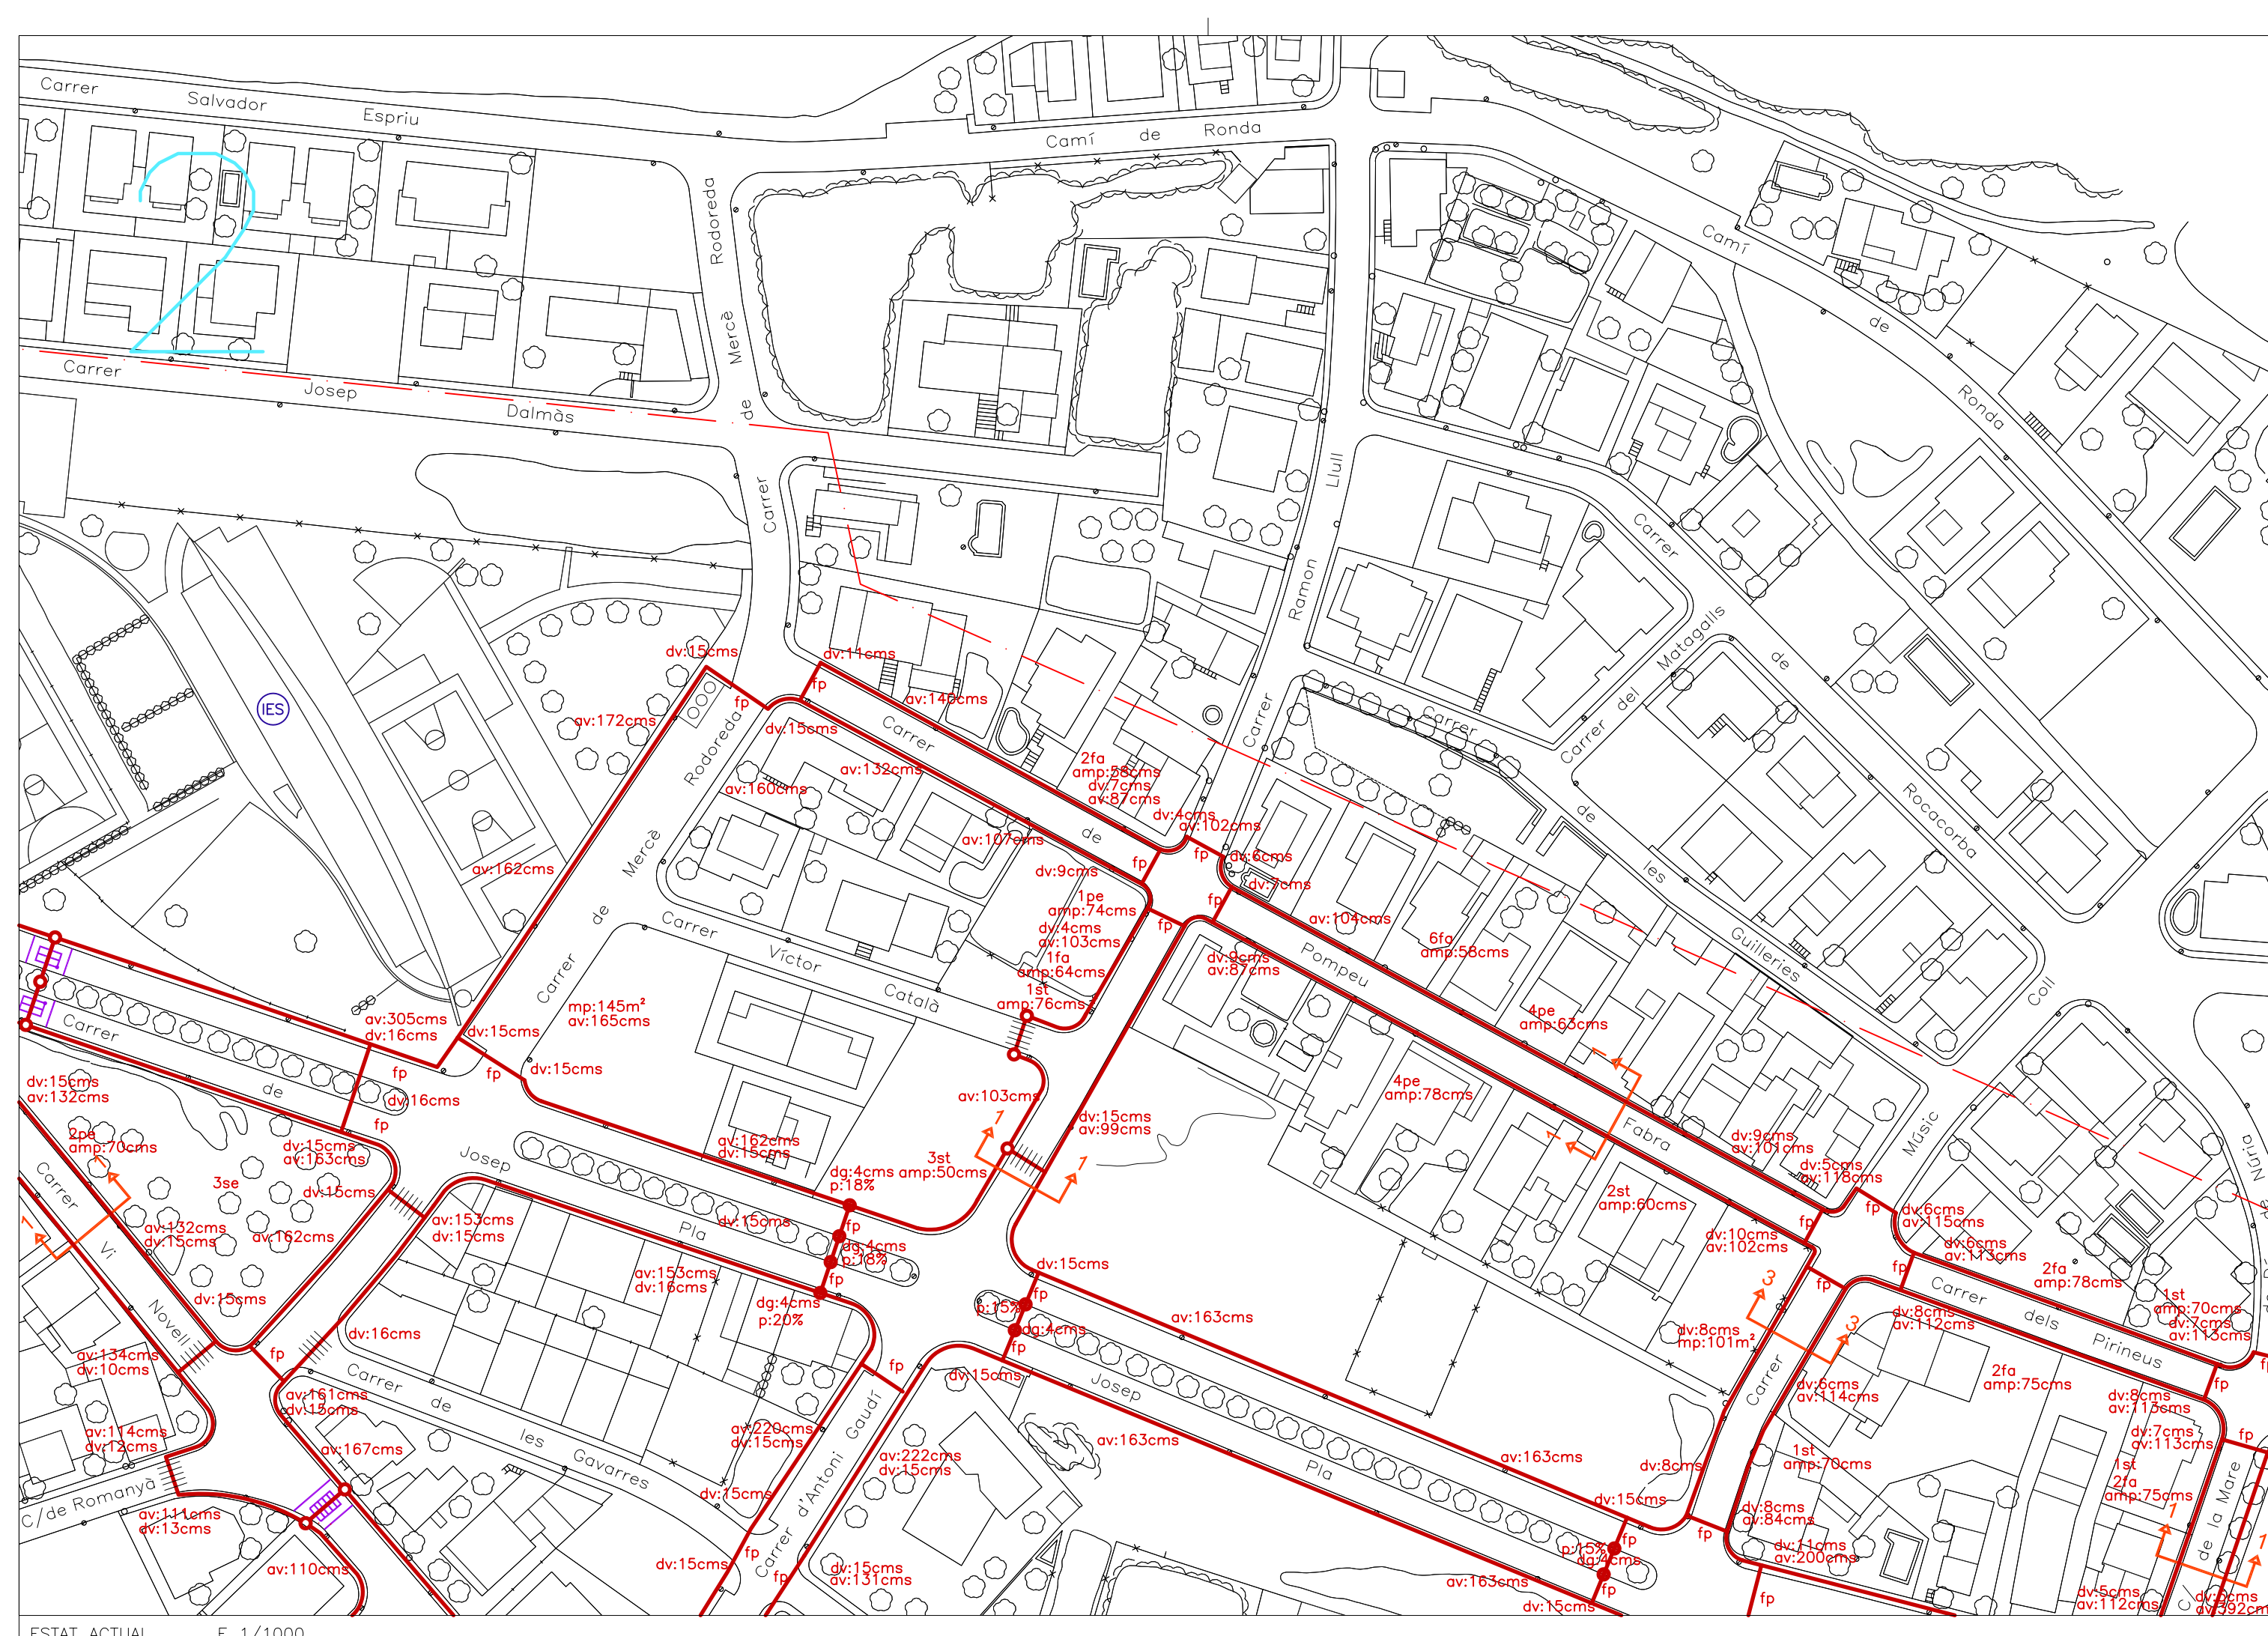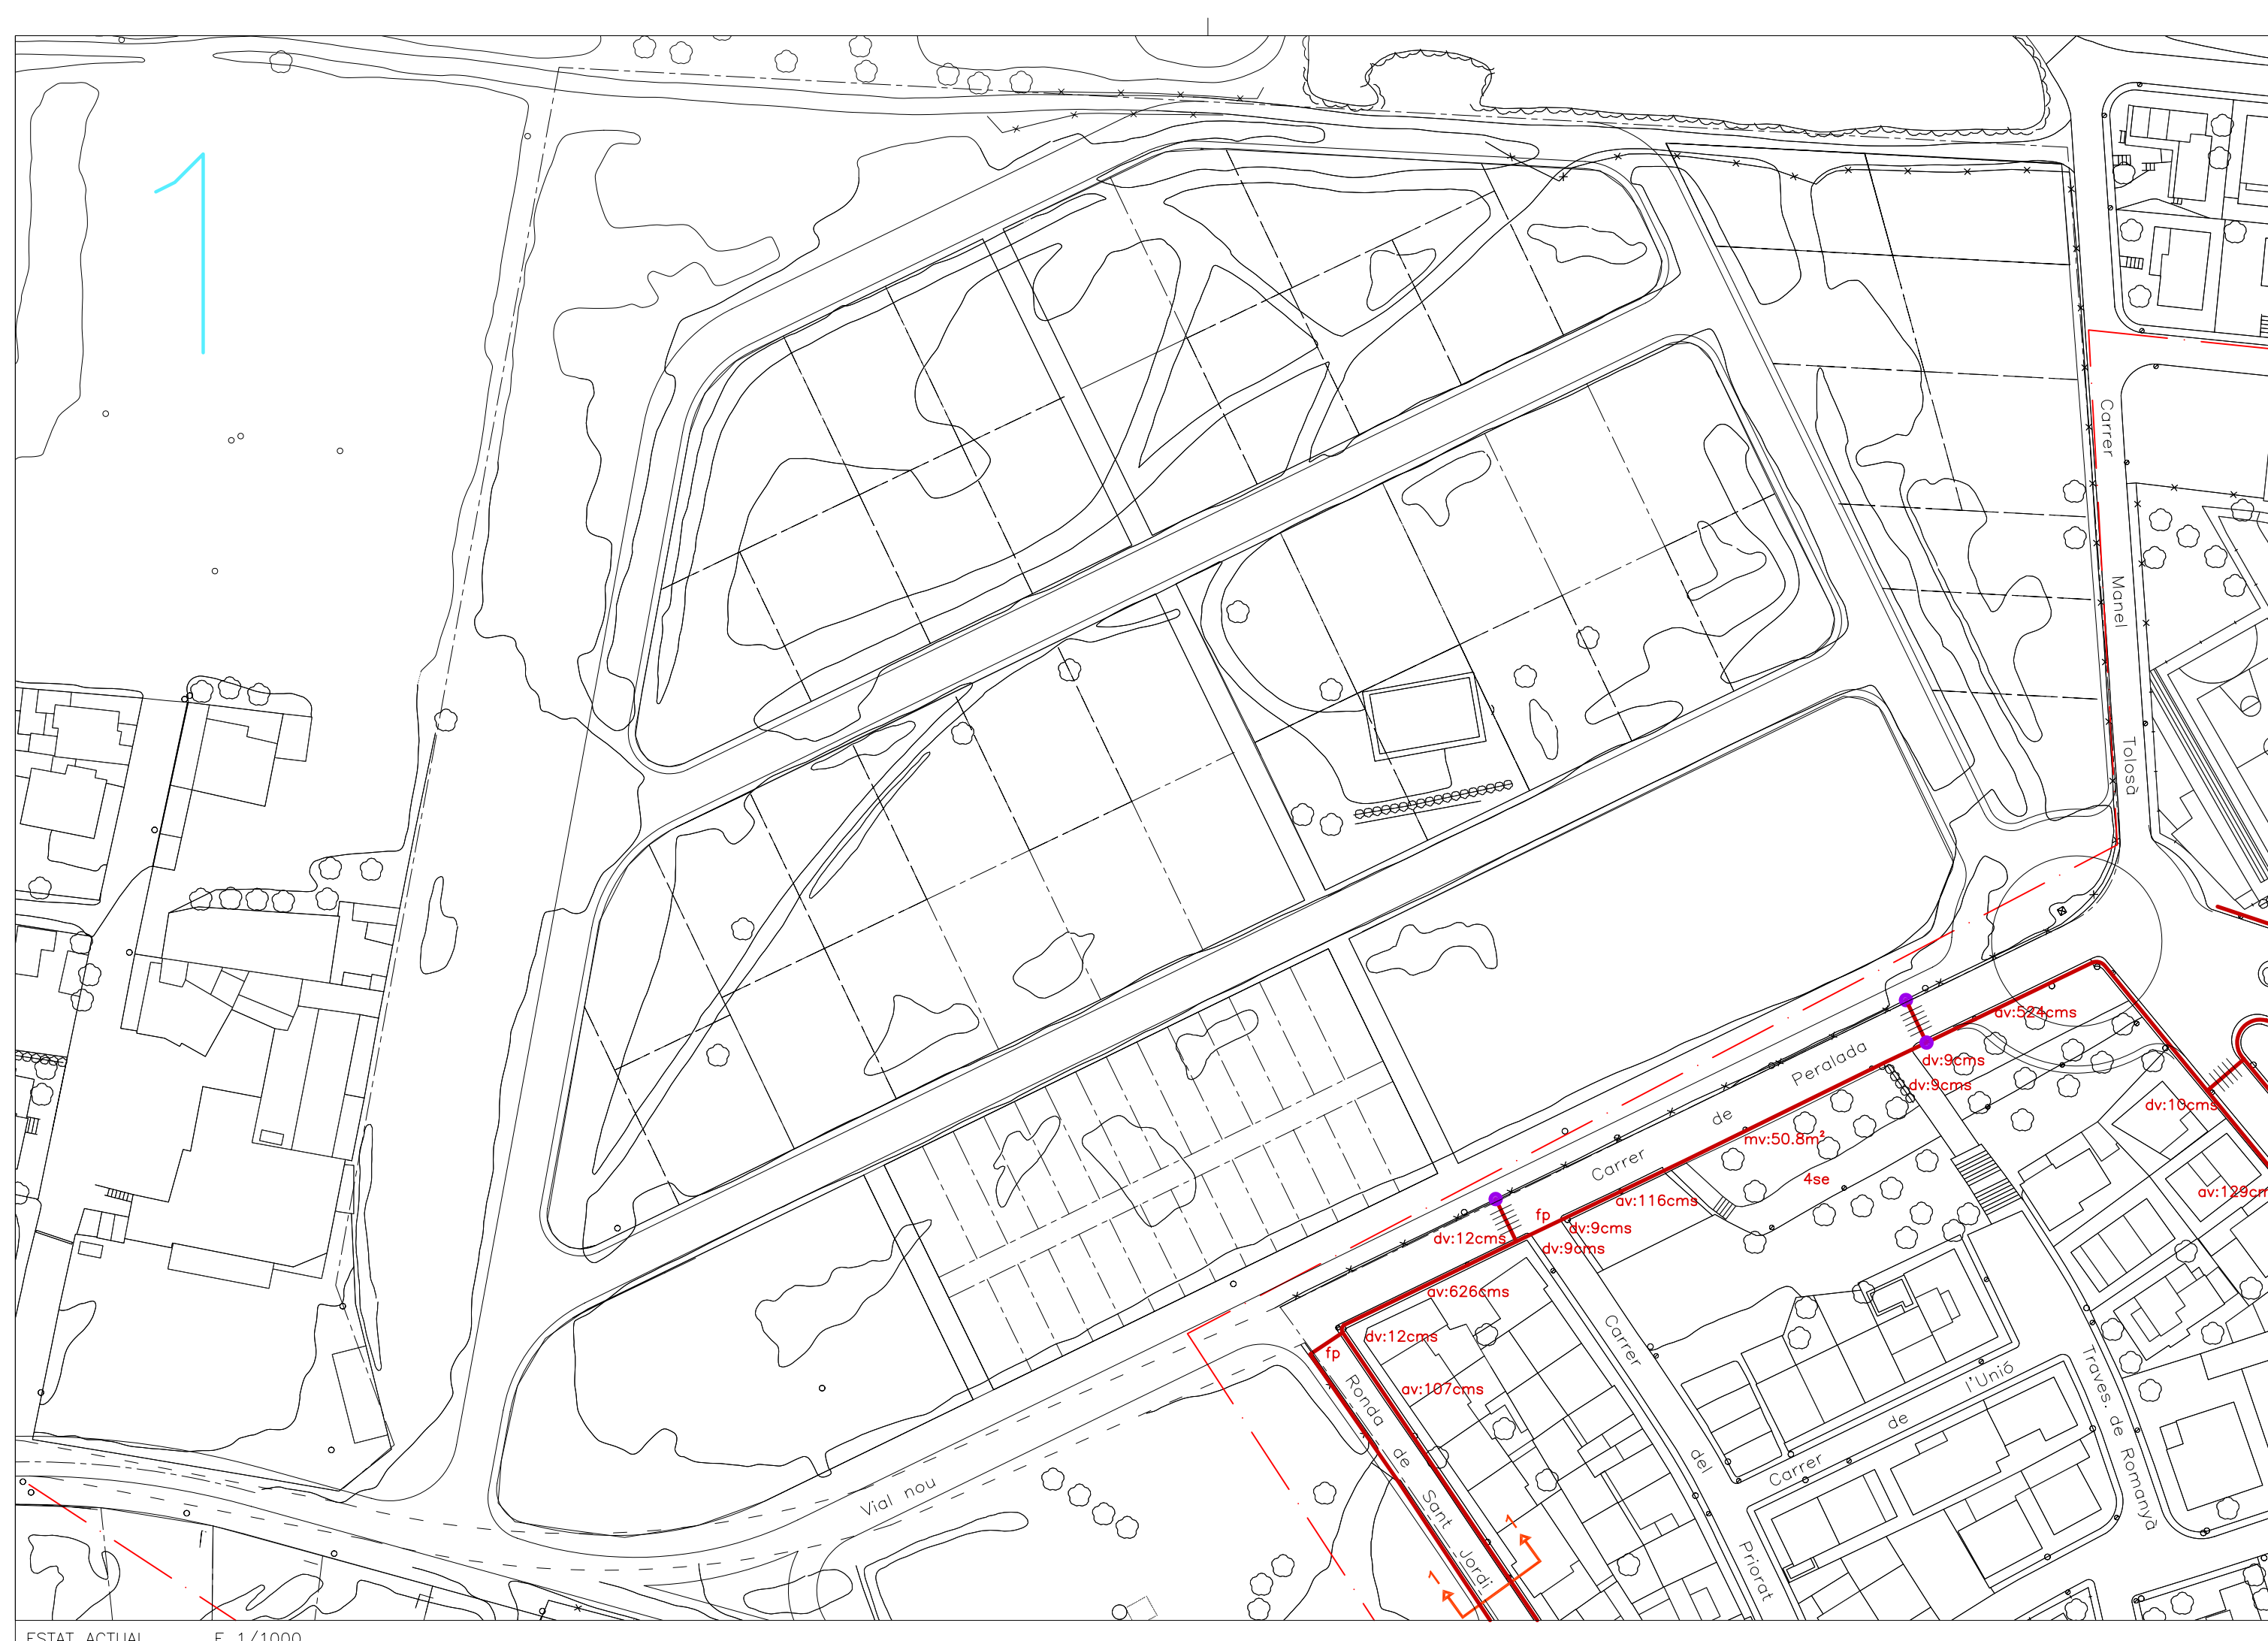




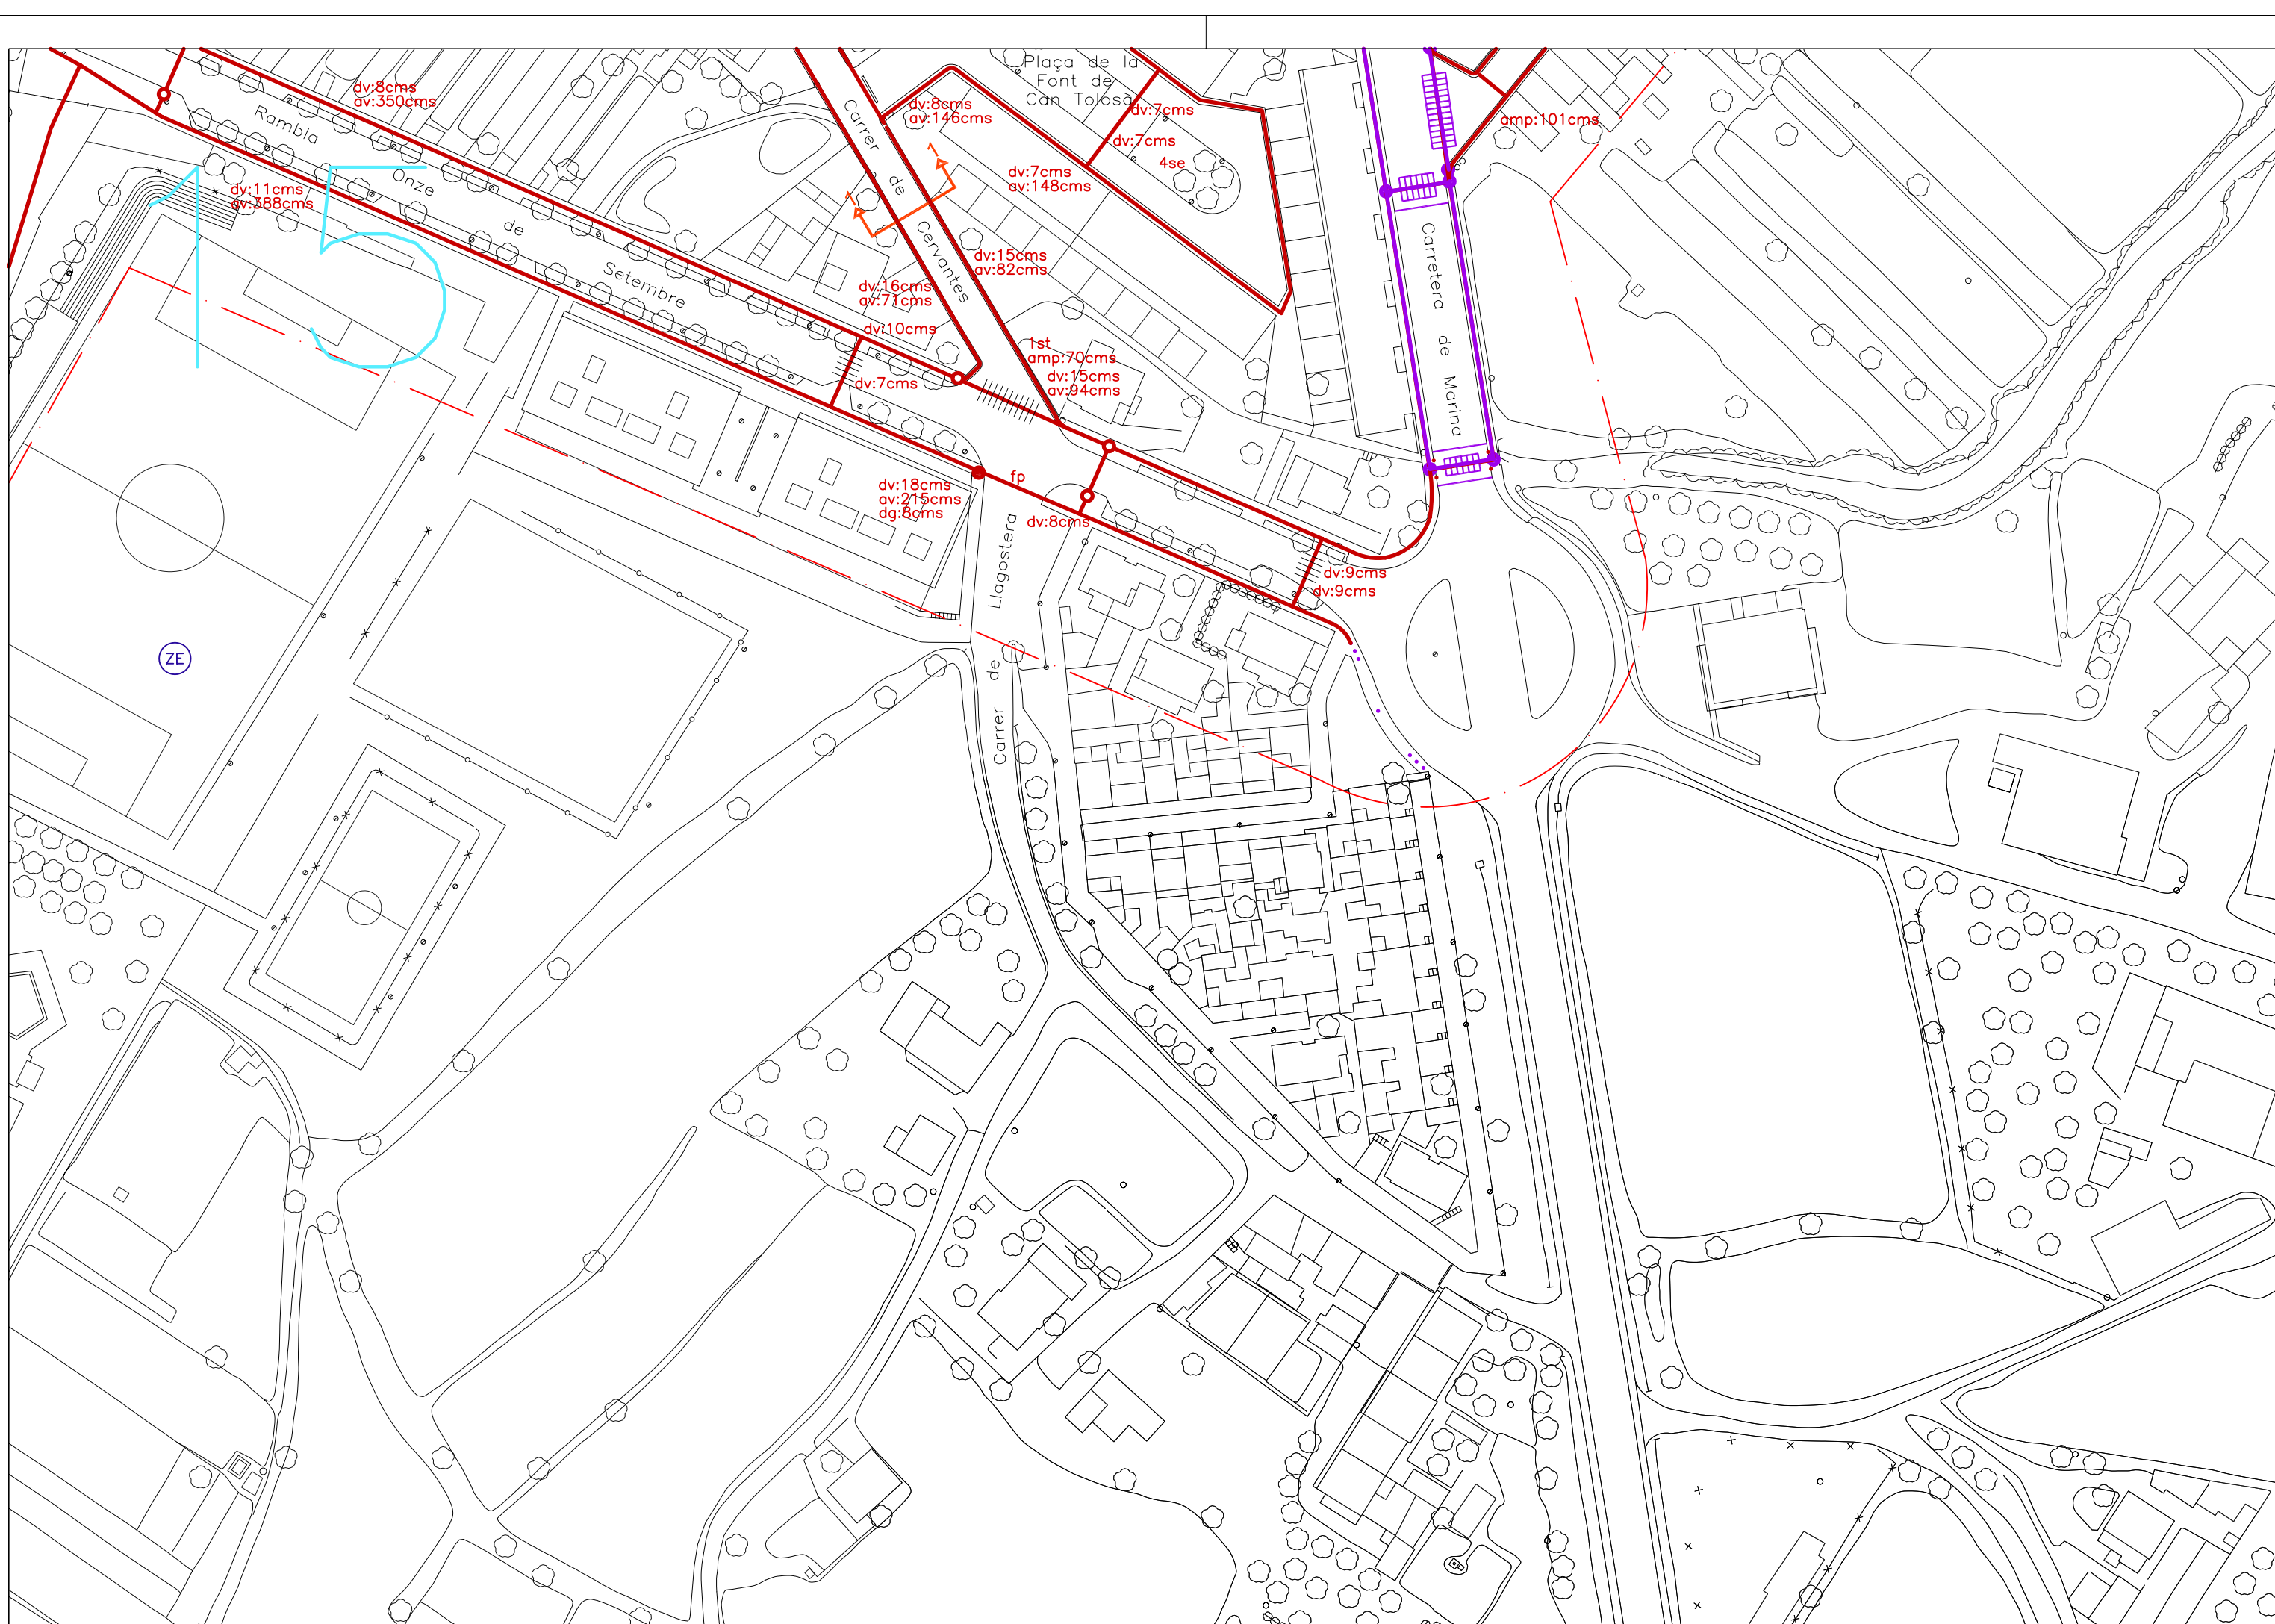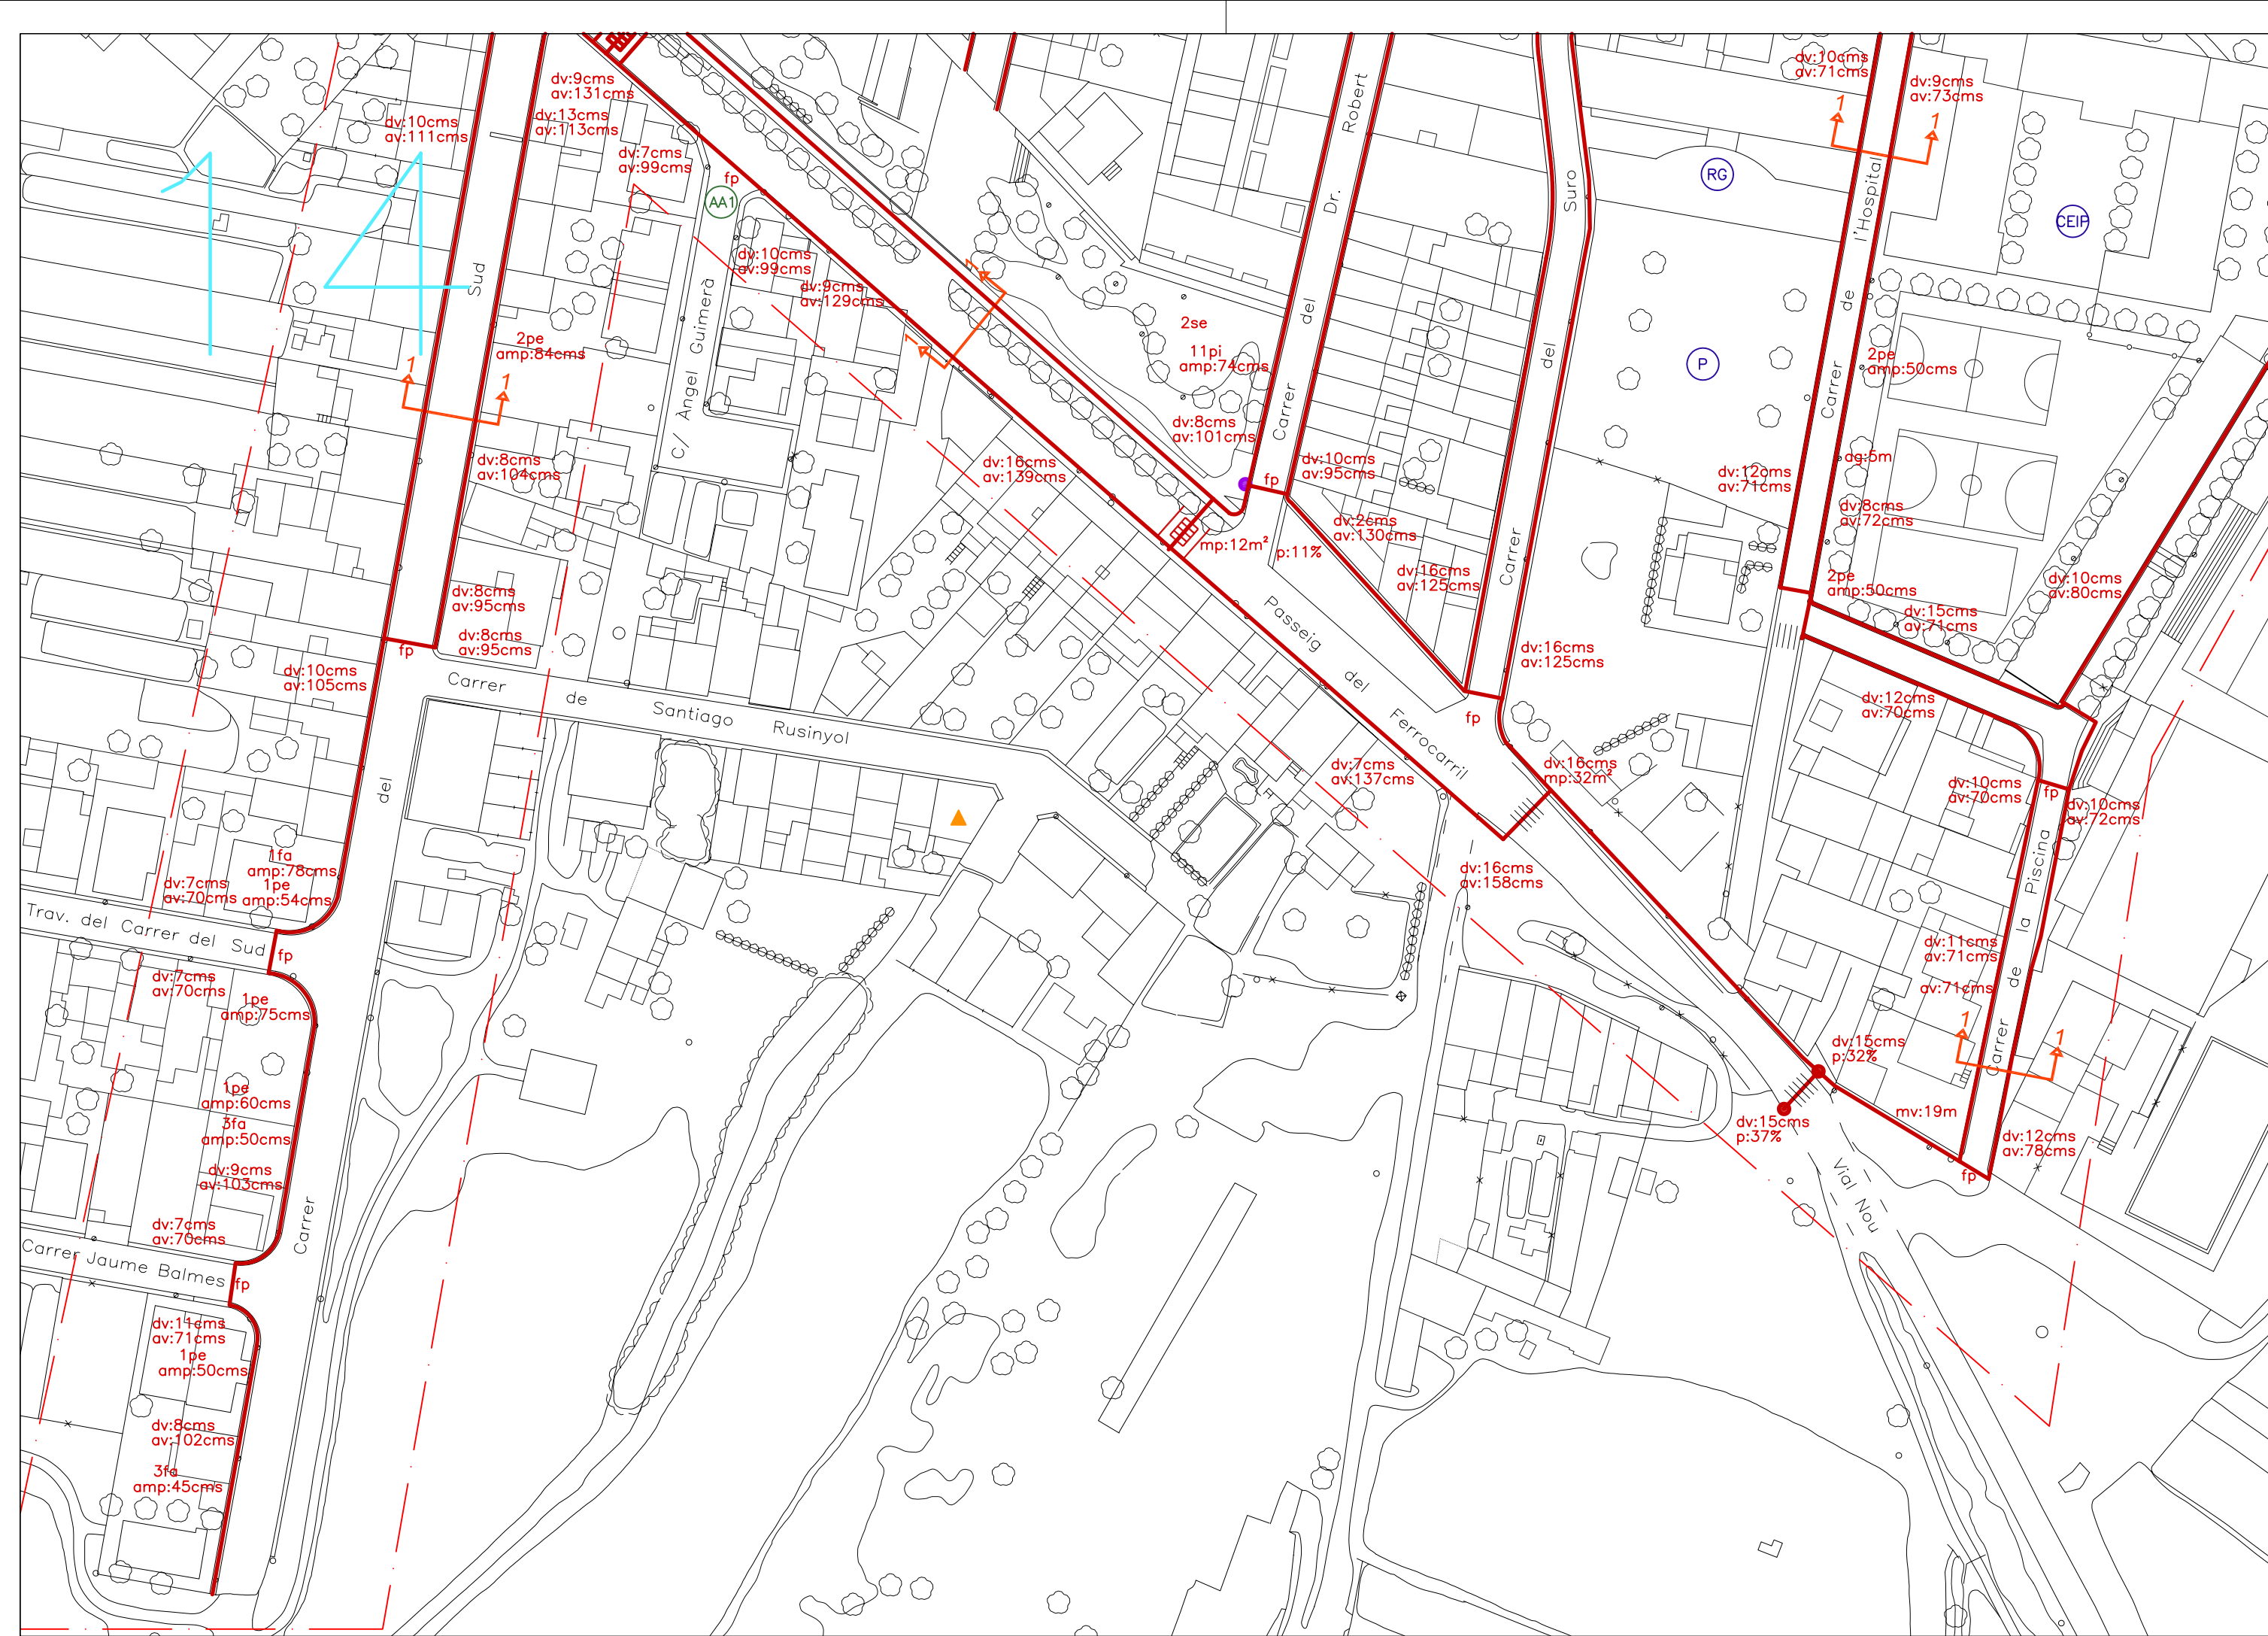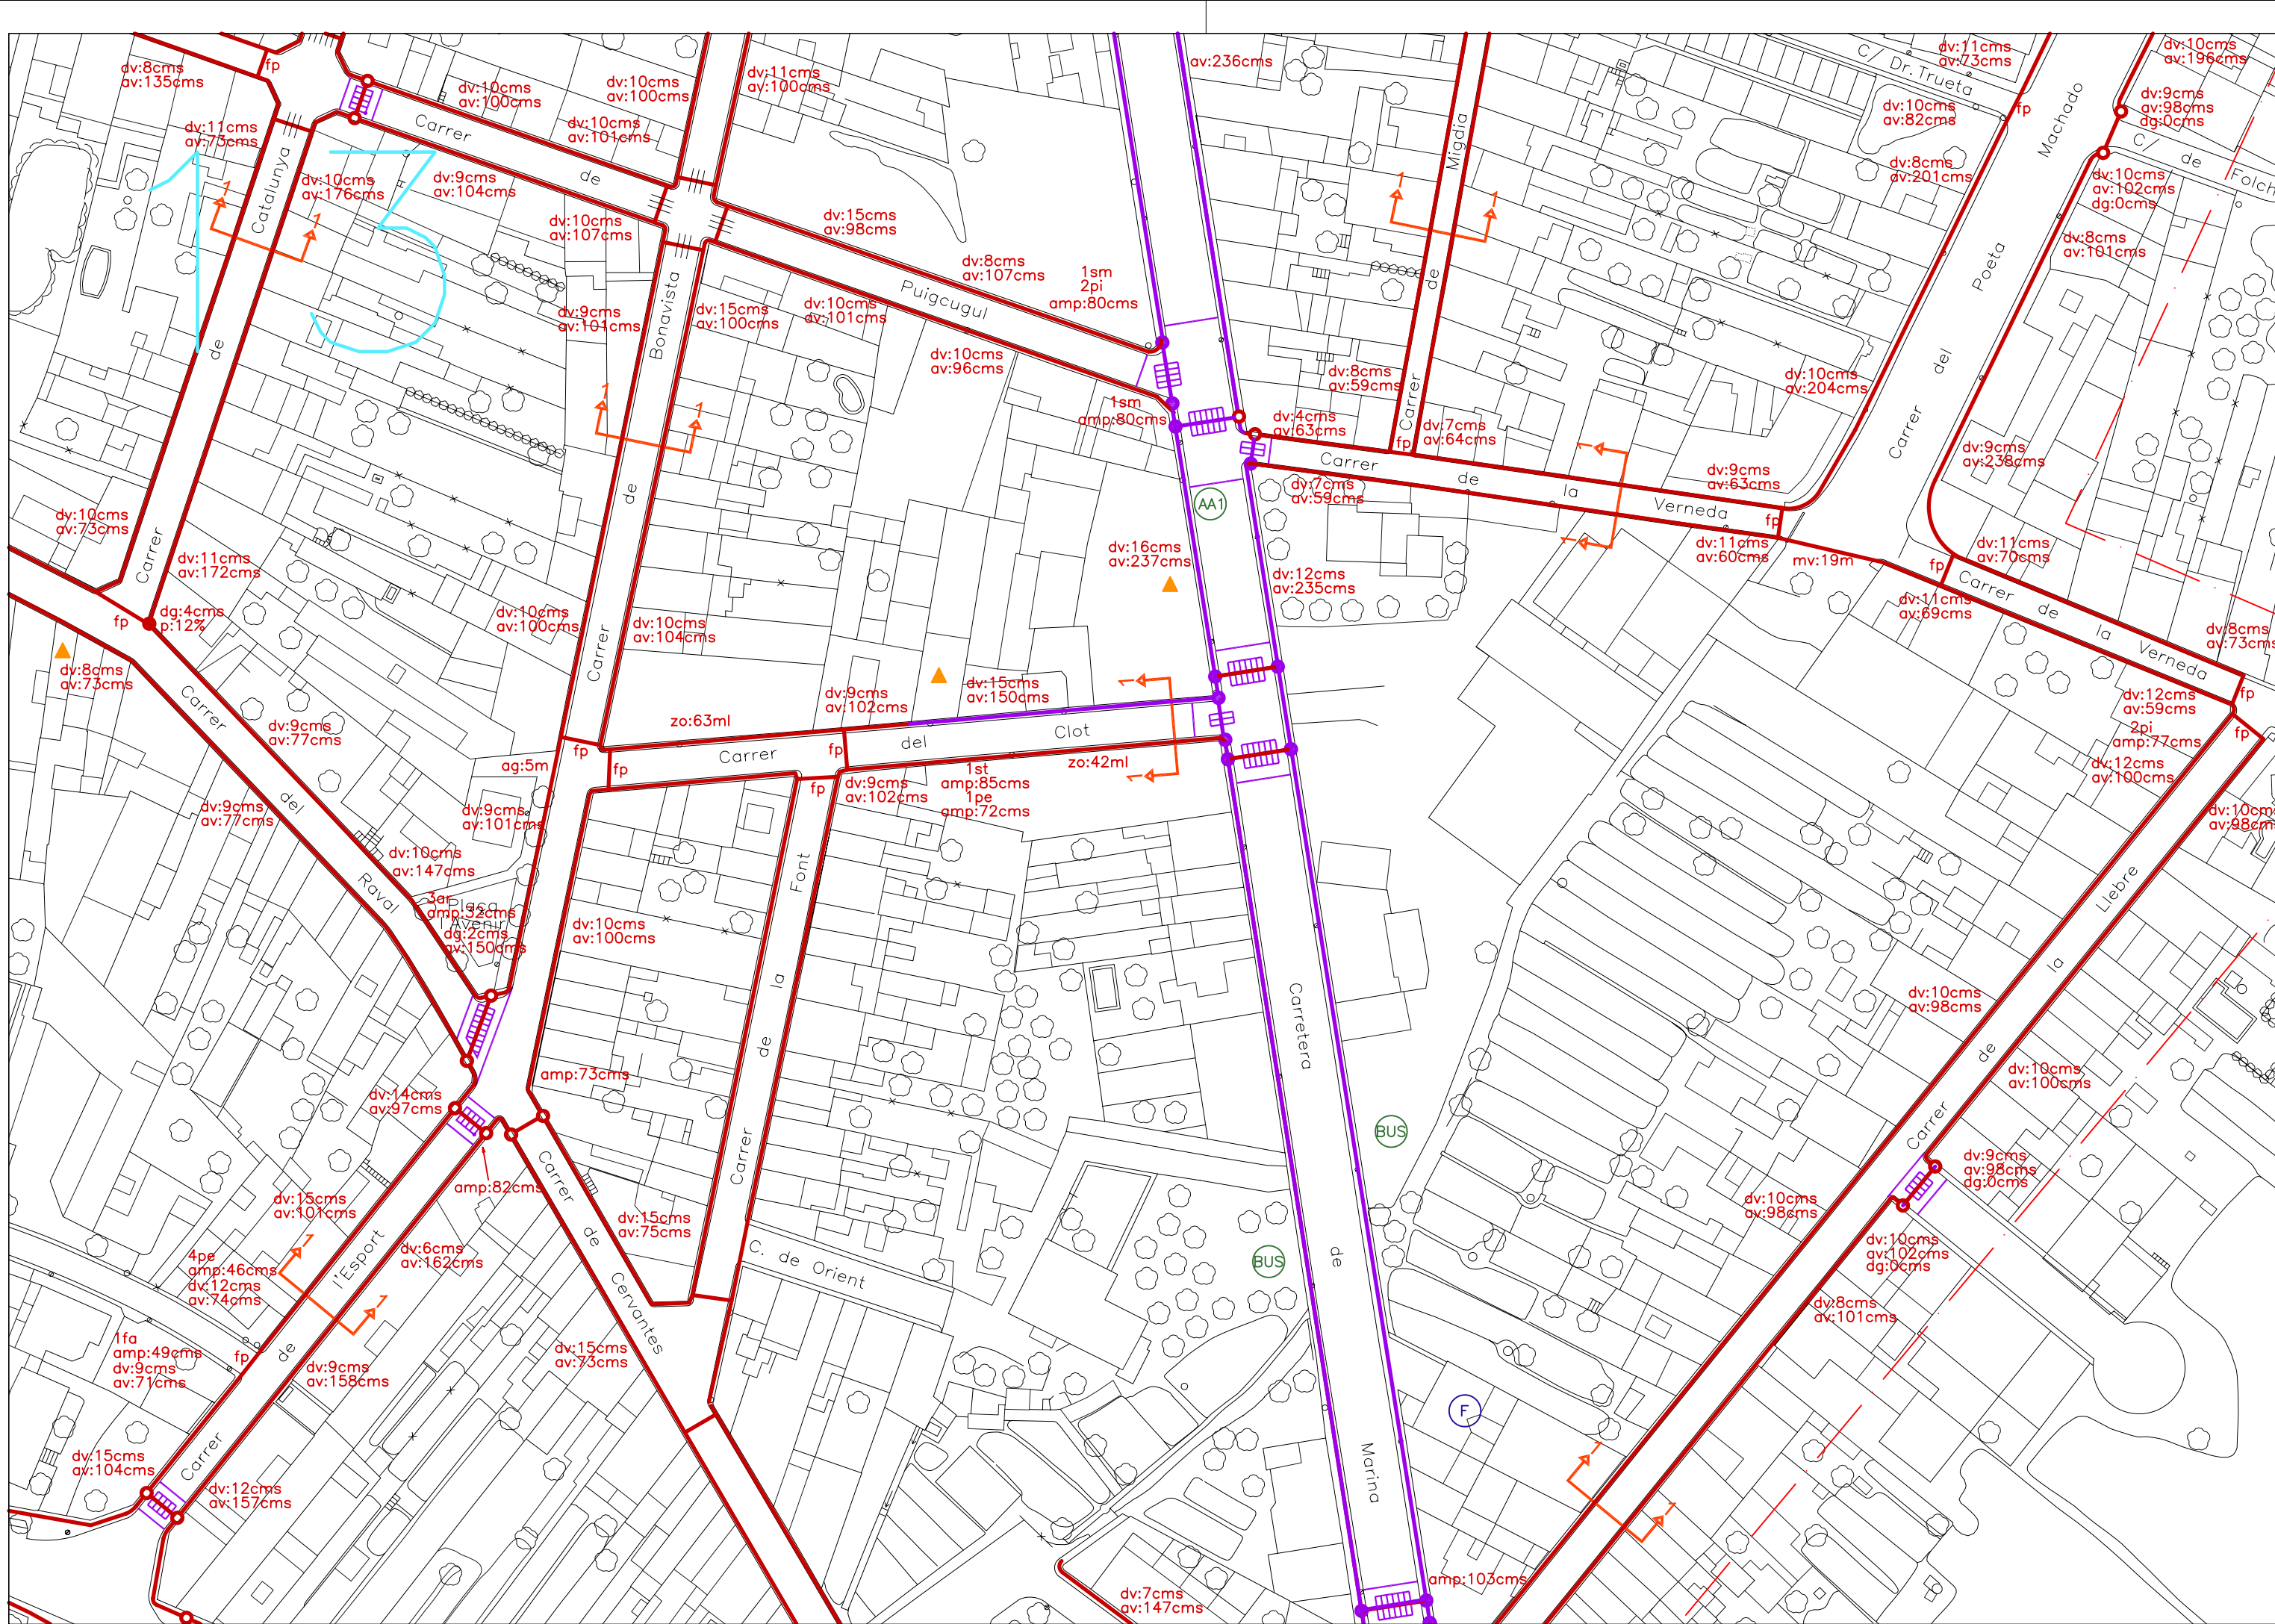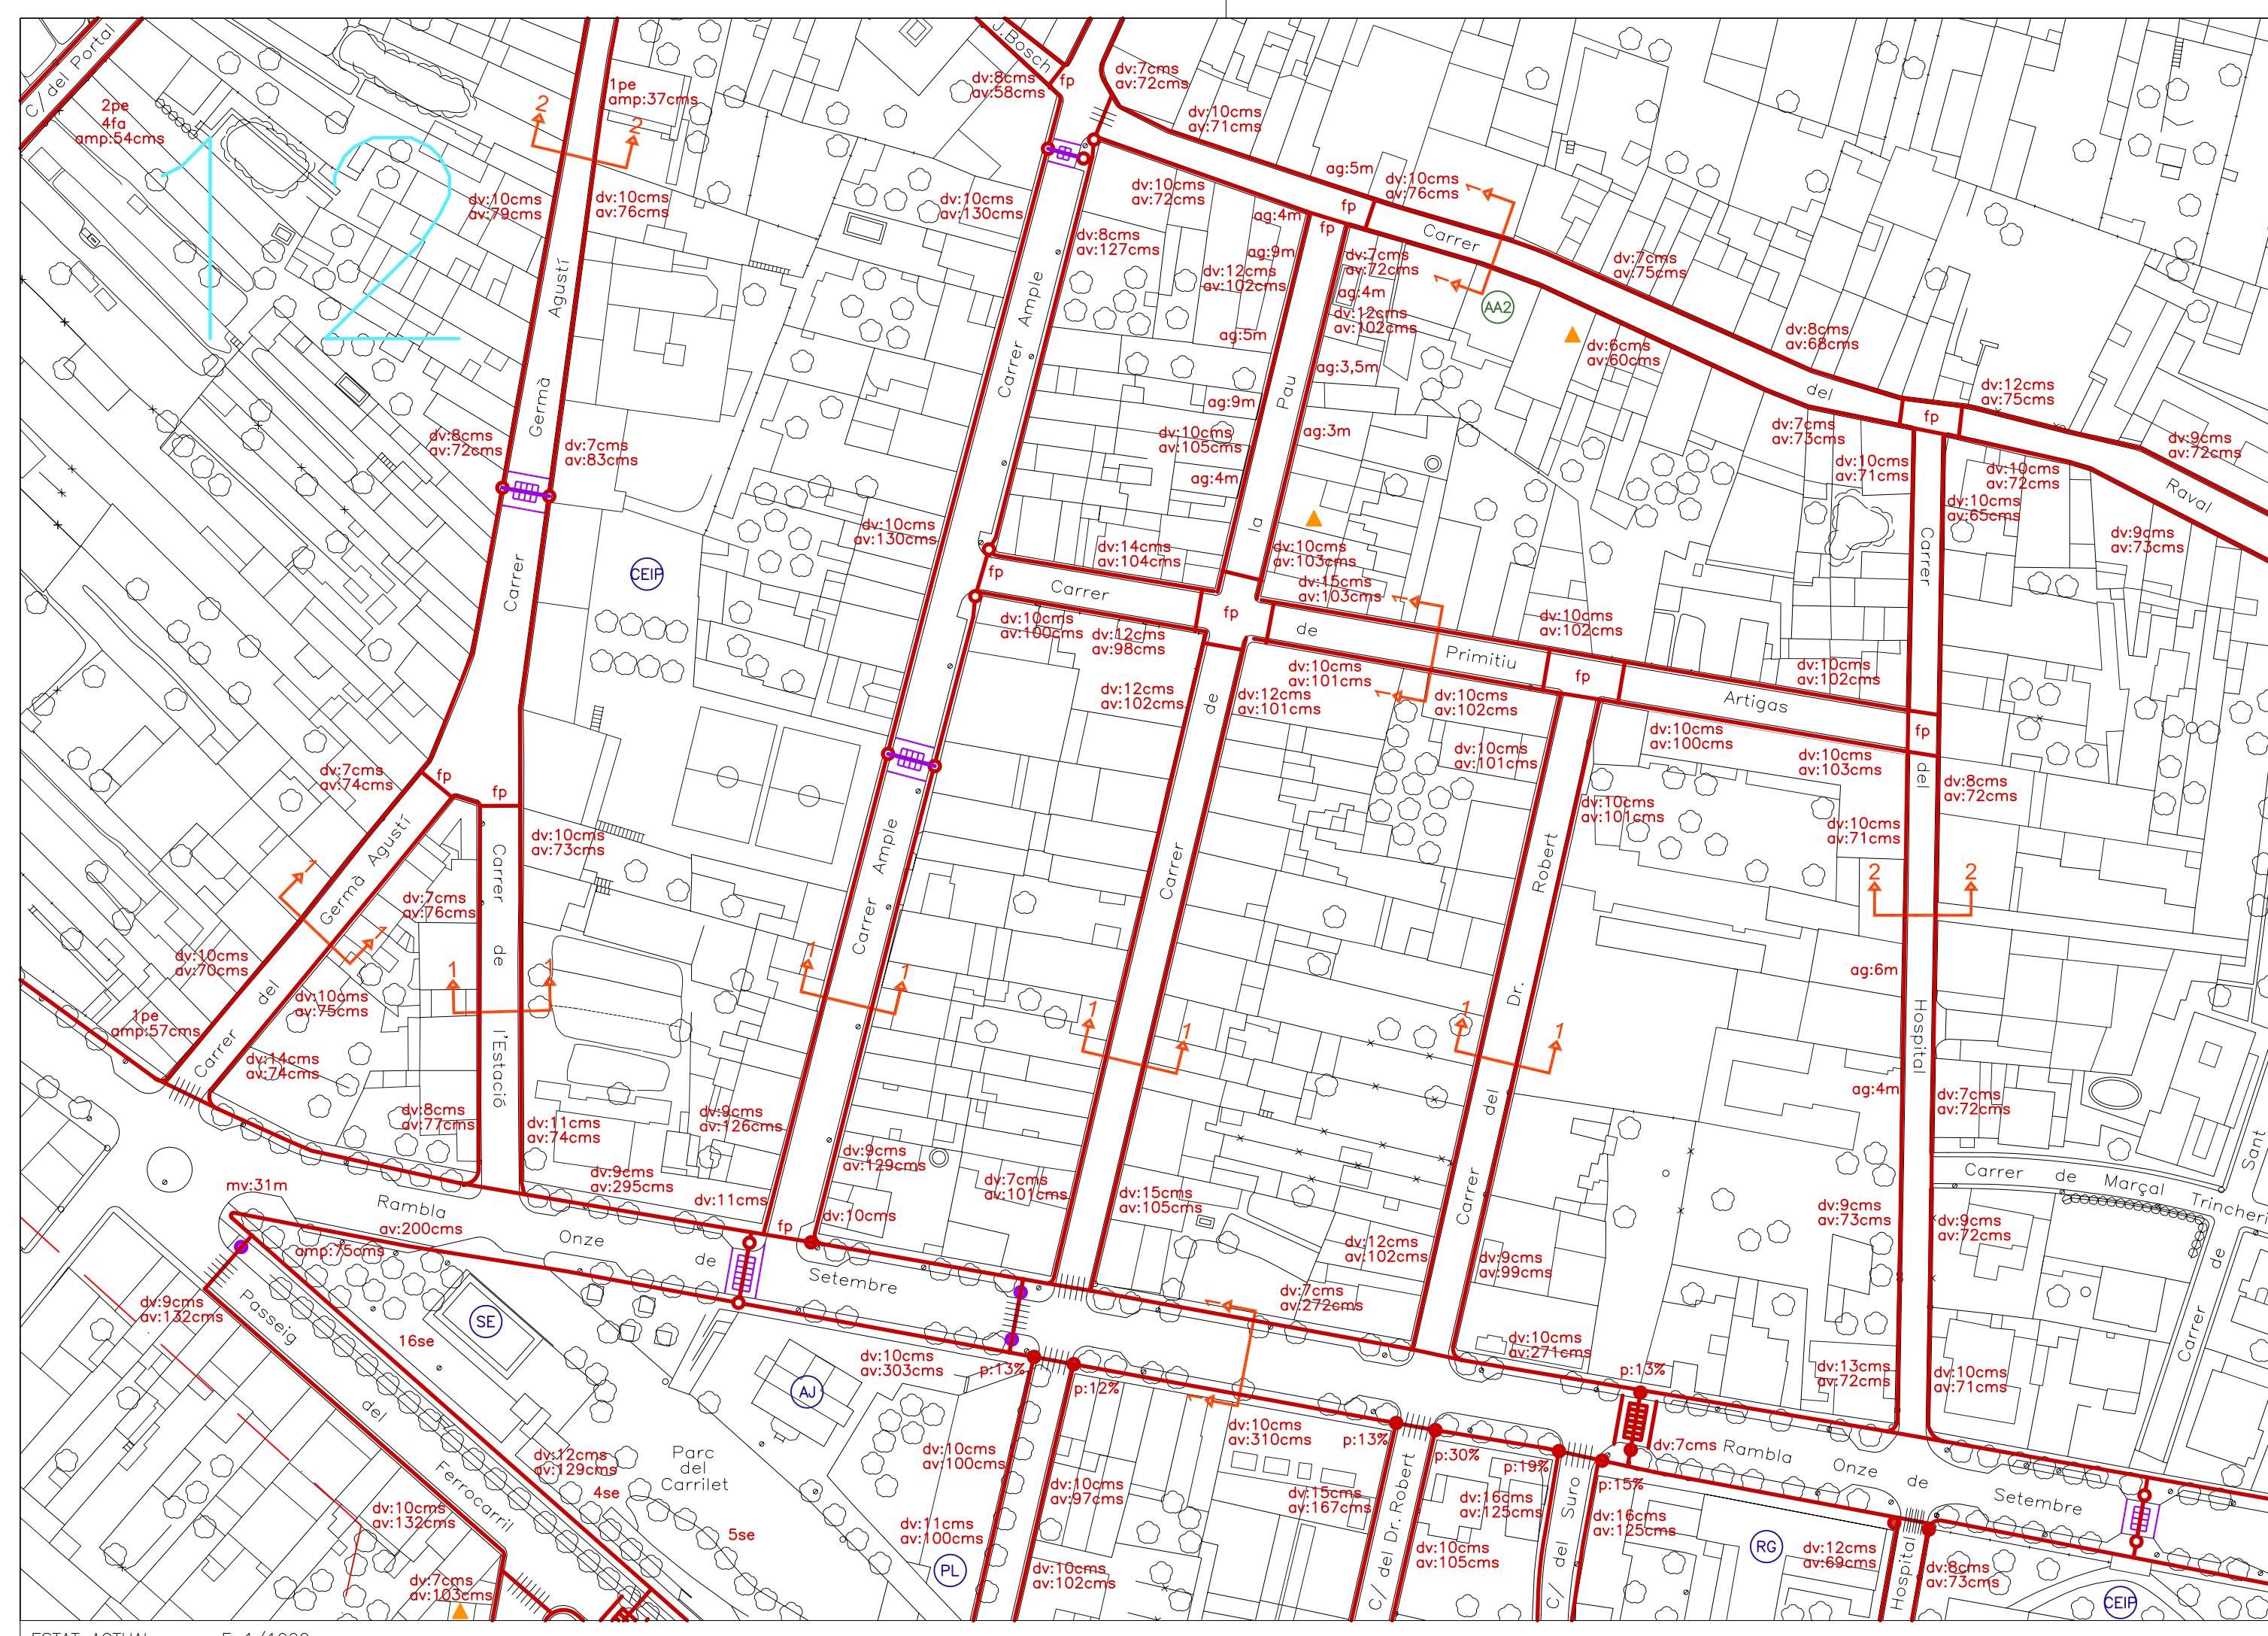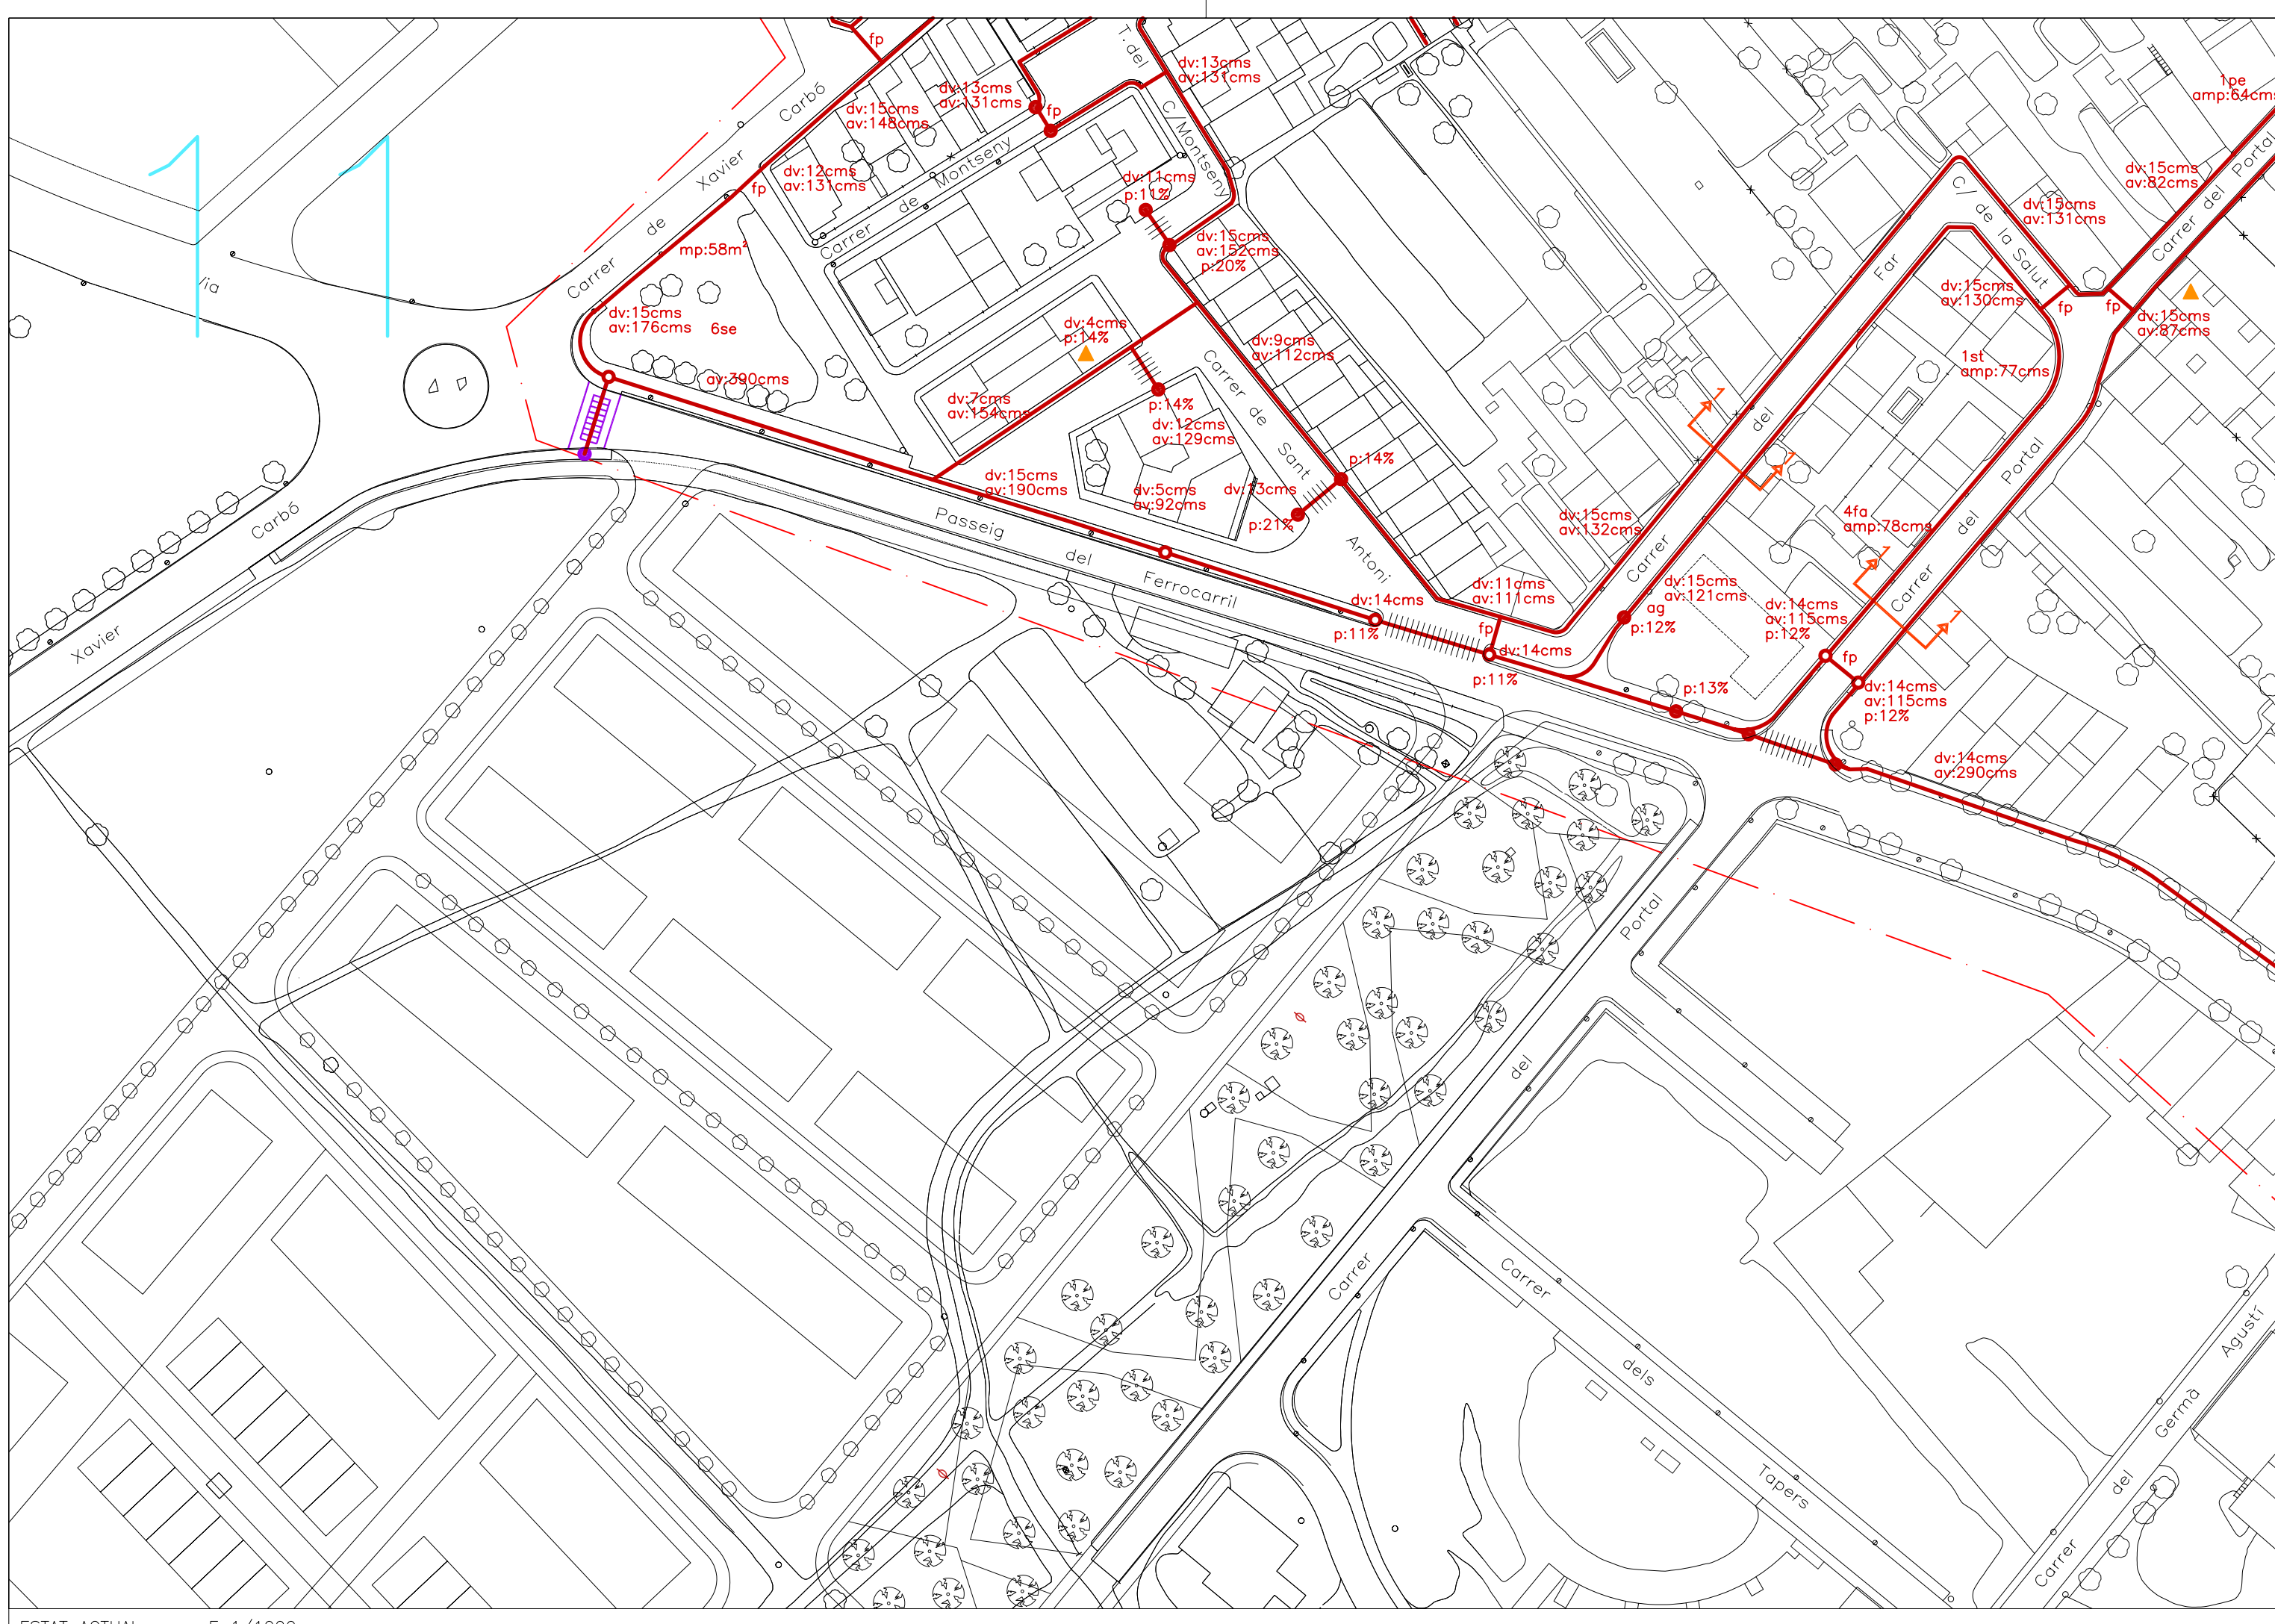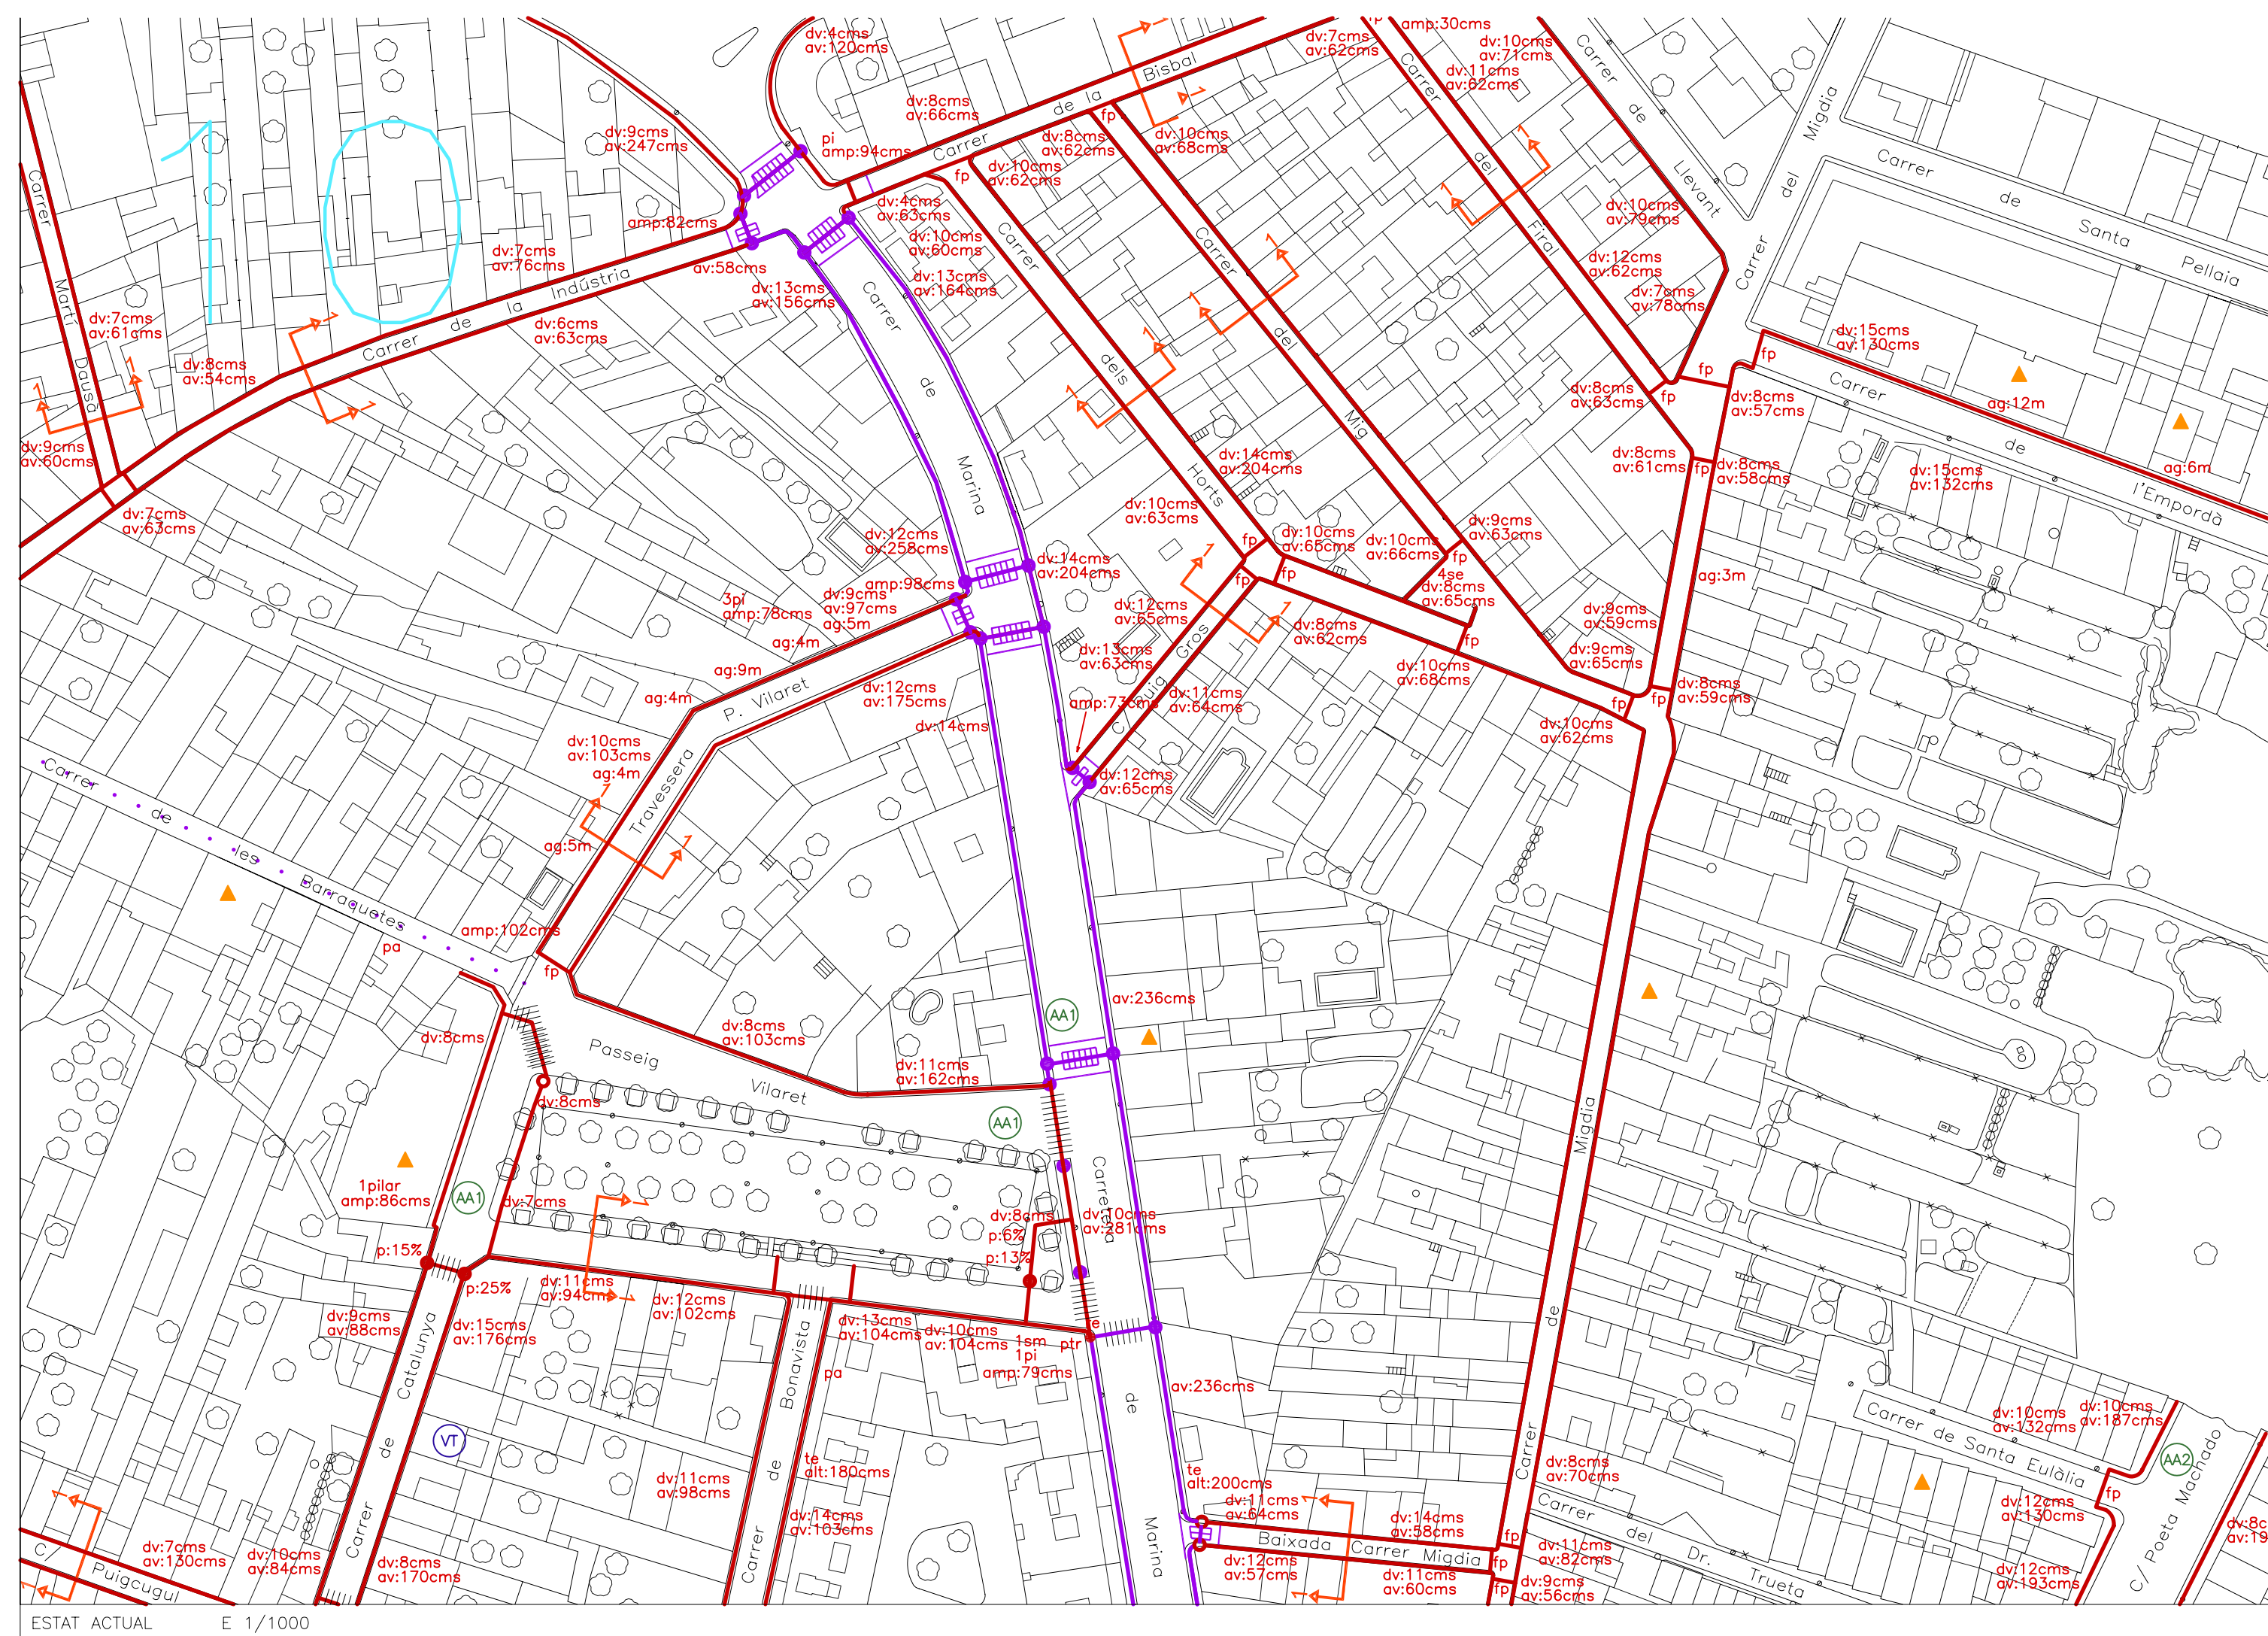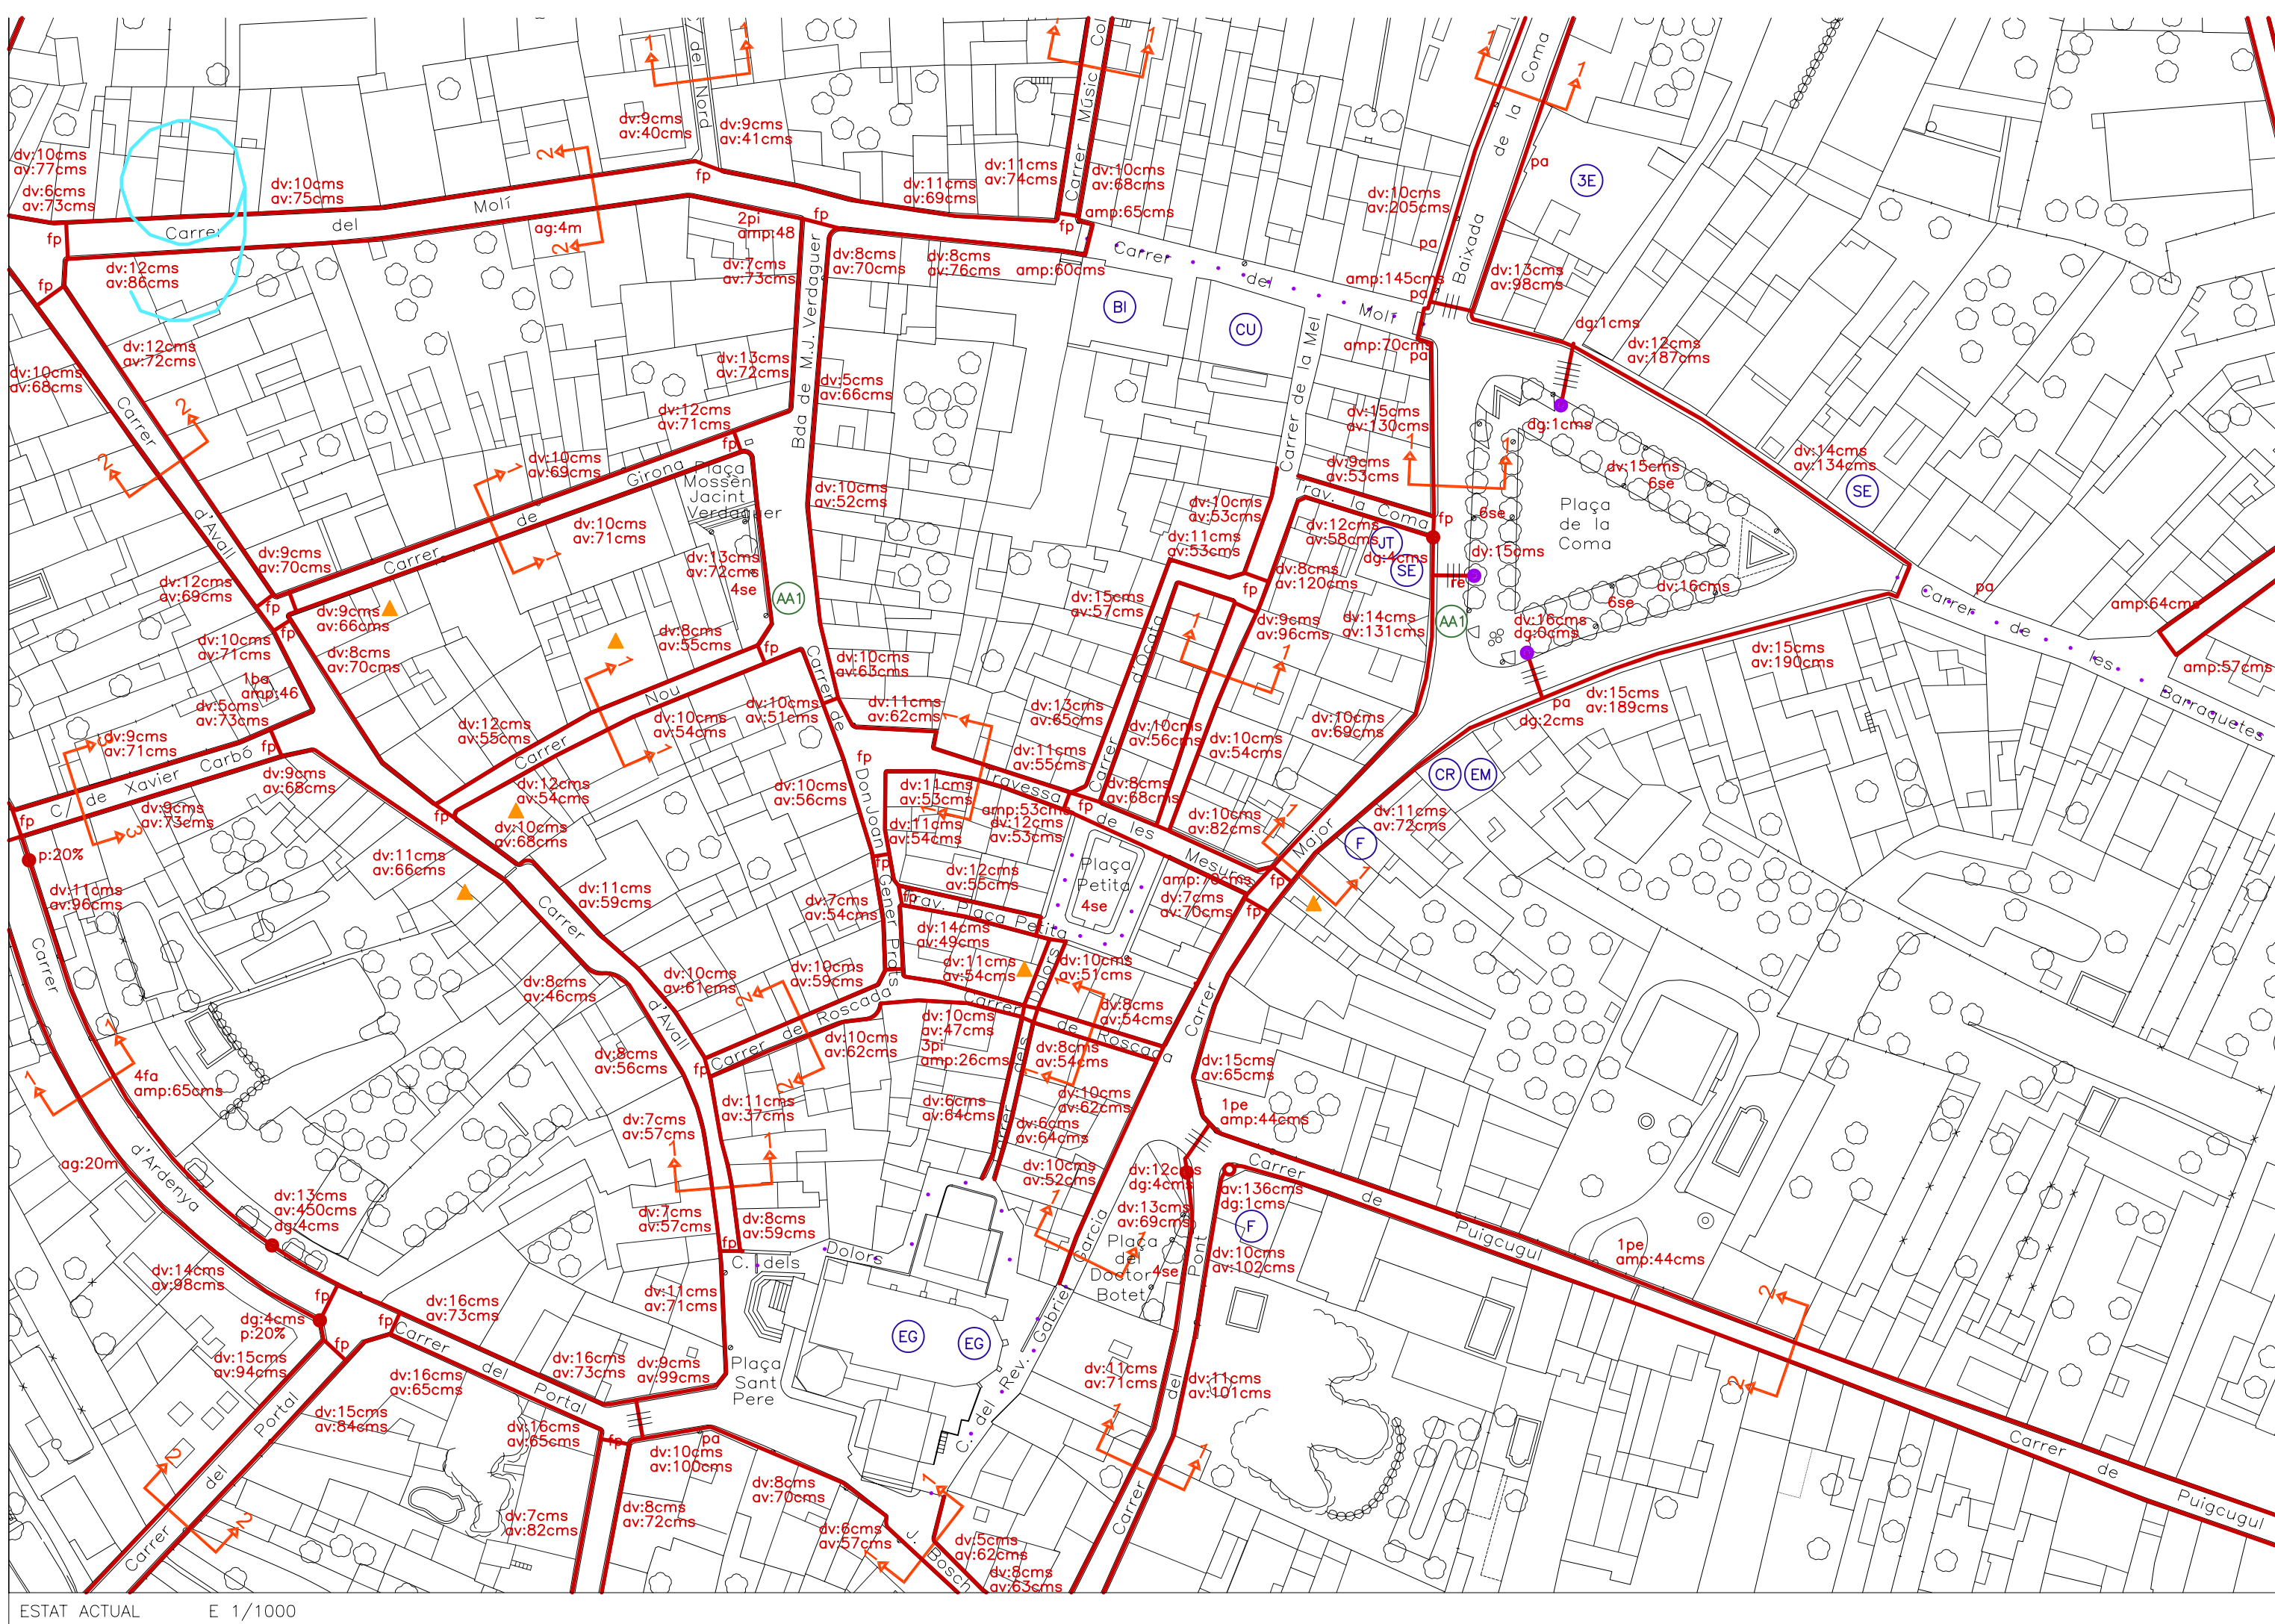







ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

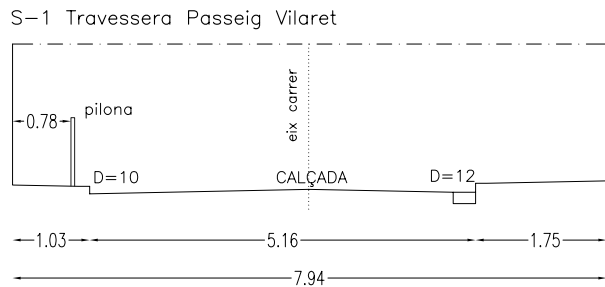


PROPOSTA  
Ampliar una vorera  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Trasllat de pilona

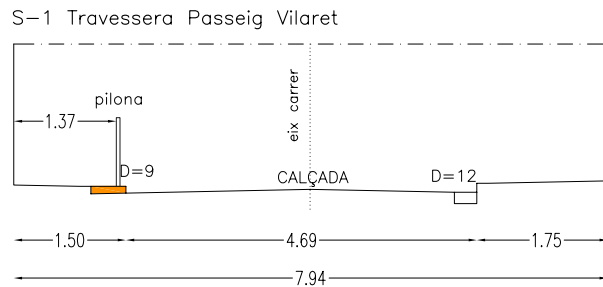


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

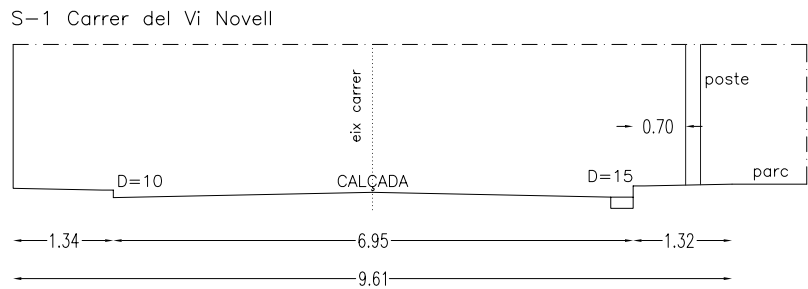


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Dos sentits de circulació  
Traslladar postes elèctrics

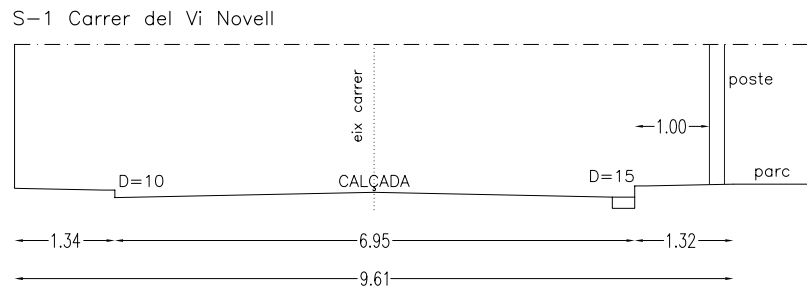


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

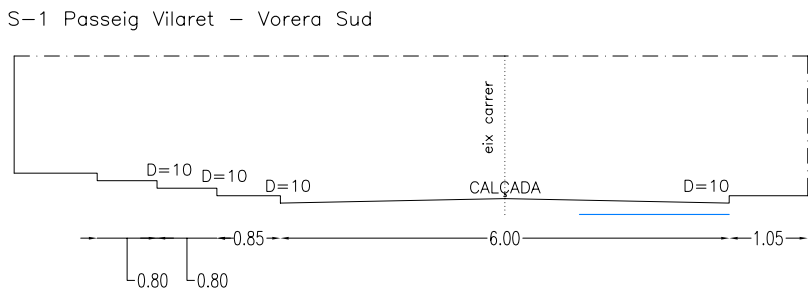


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat  
Ampliar una vorera  
Trasllat de pilona

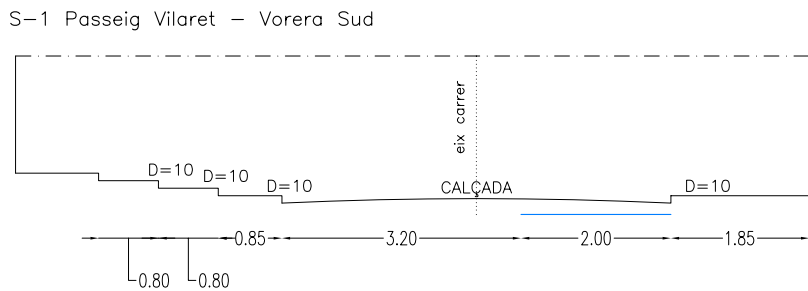


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

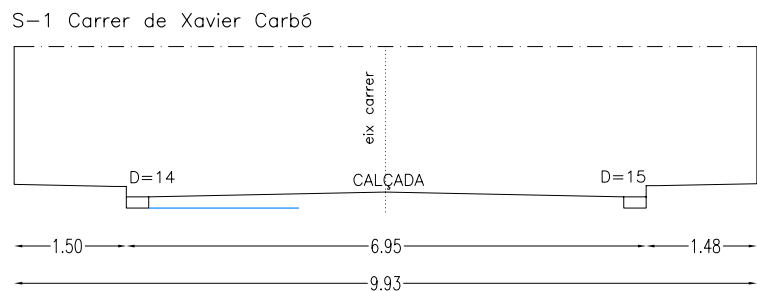


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Dos sentits de circulació  
Una franja d'aparcament

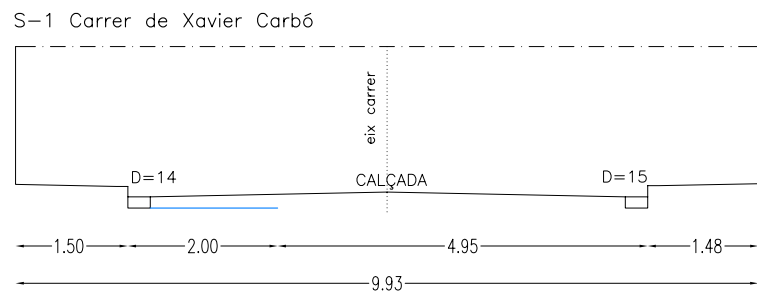


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

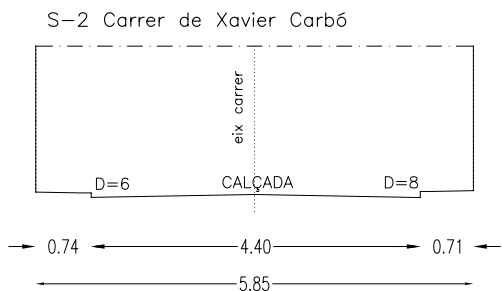


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

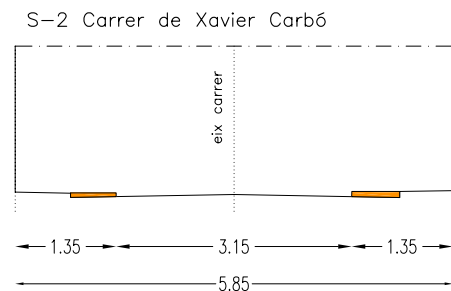


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

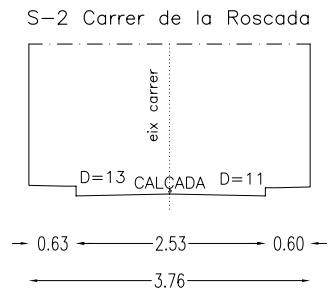


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

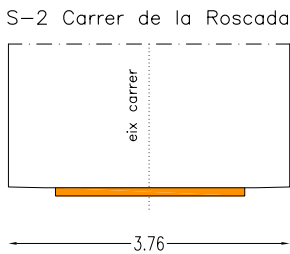


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

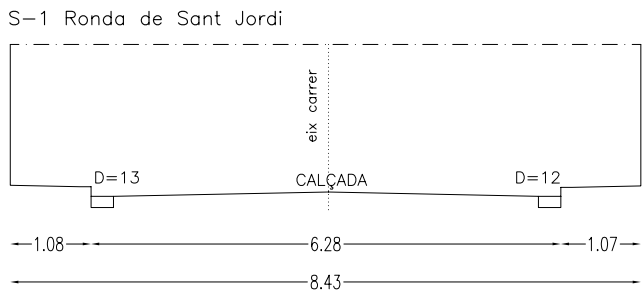


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

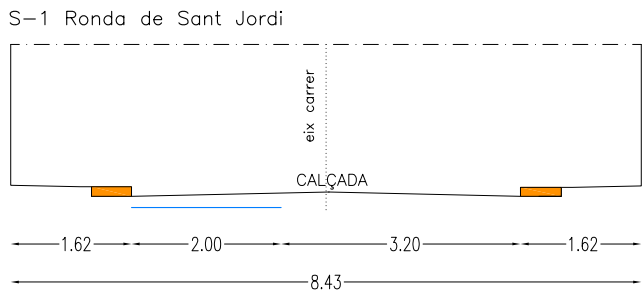


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats als dos costats

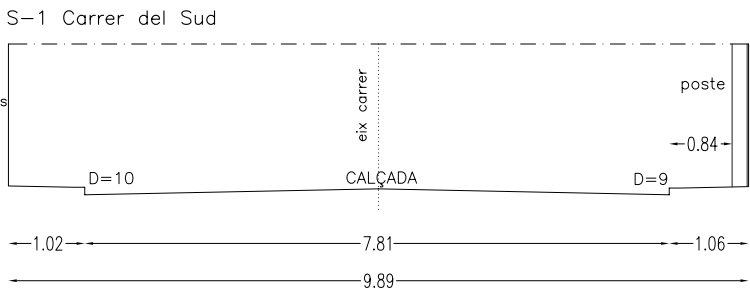


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Dos sentits de circulació

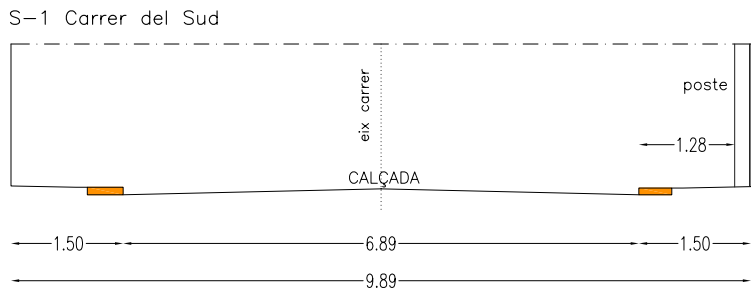


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

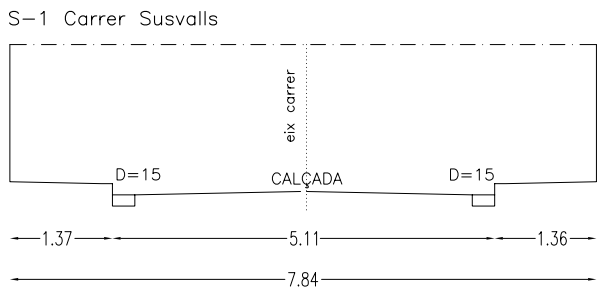


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

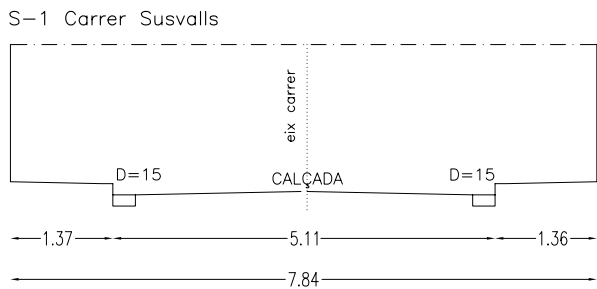


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

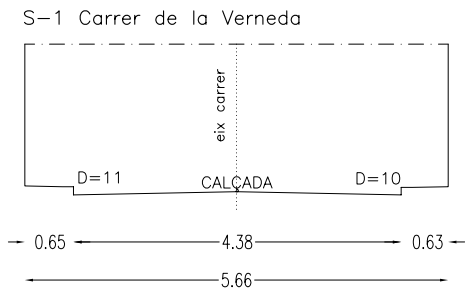


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

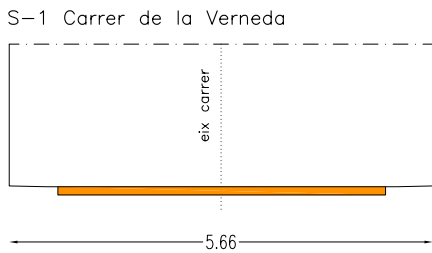


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

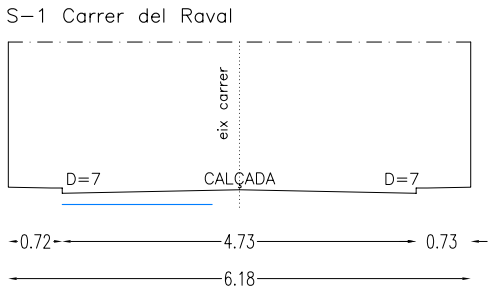


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

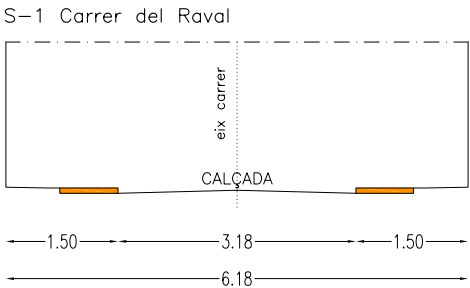


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

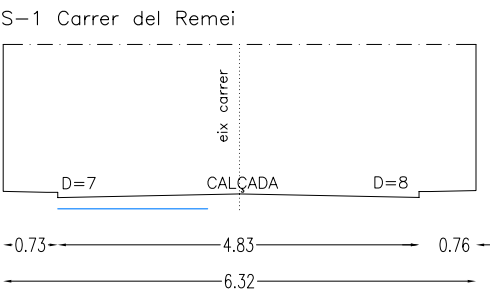


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

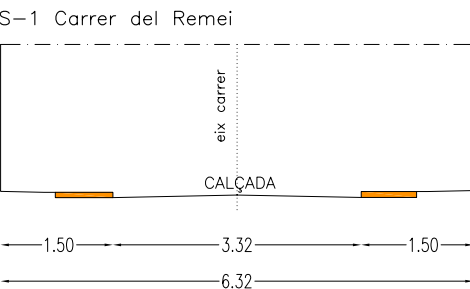


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

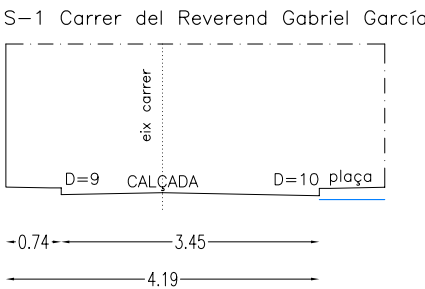


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació




ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

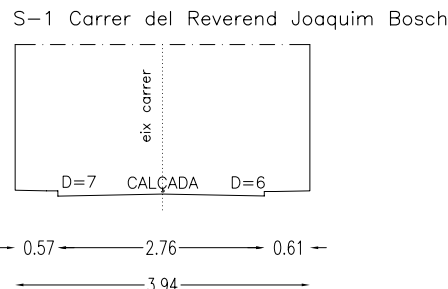


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

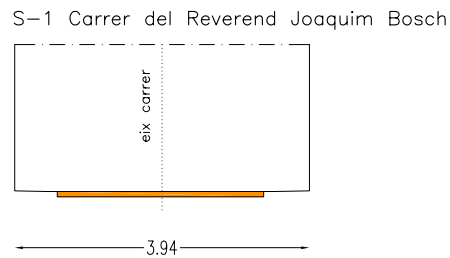

ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

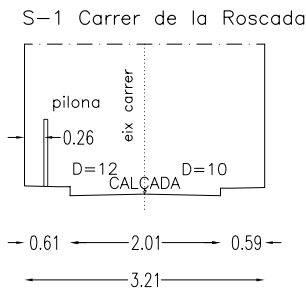


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació




ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

S-1 Carrer de Primitiu Artigues

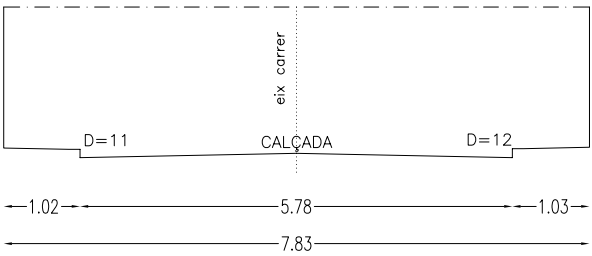


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

S-1 Carrer del Progrés

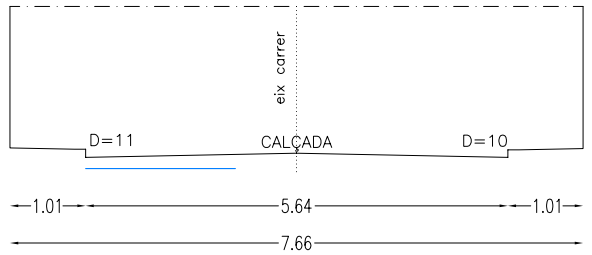


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

S-1 Carrer del Puigcugull

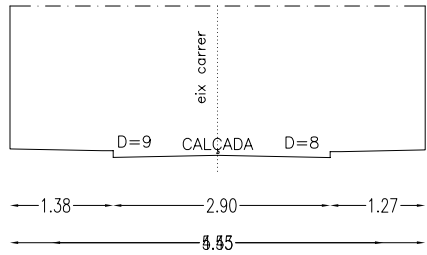


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

S-2 Carrer del Puigcugull

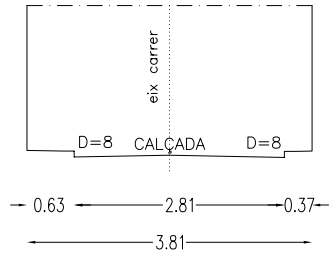


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

S-1 Carrer del Puig Gros




PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

S-1 Carrer de Primitiu Artigues

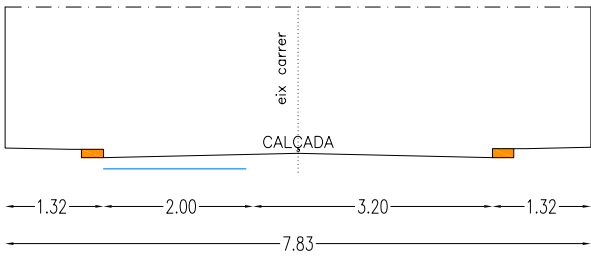


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

S-1 Carrer del Progrés

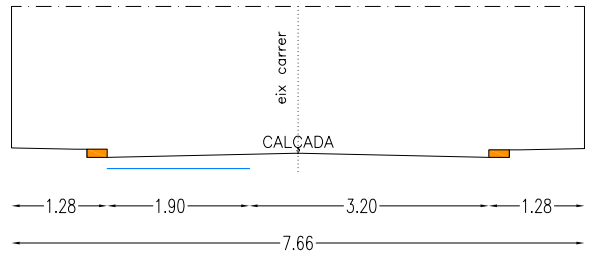


PROPOSTA  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

S-1 Carrer del Puigcugull

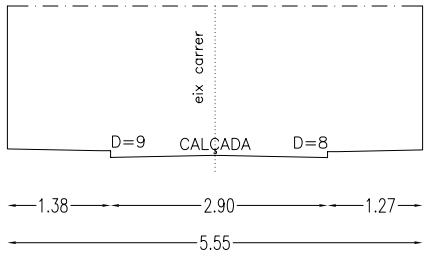


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

S-2 Carrer del Puigcugull




PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació


S-1 Carrer del Puig Gros




ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

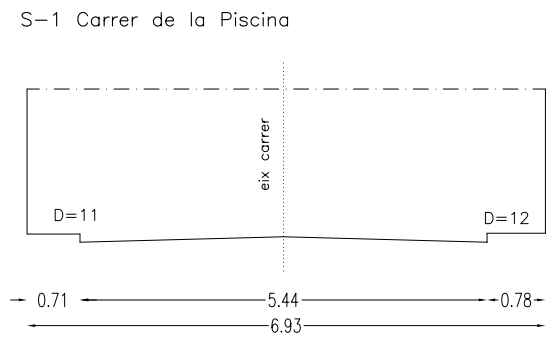


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

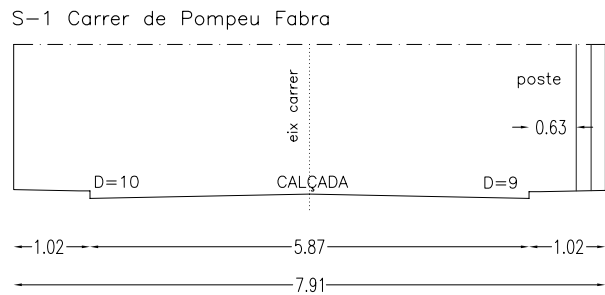


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

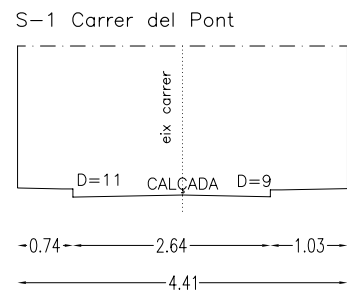


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

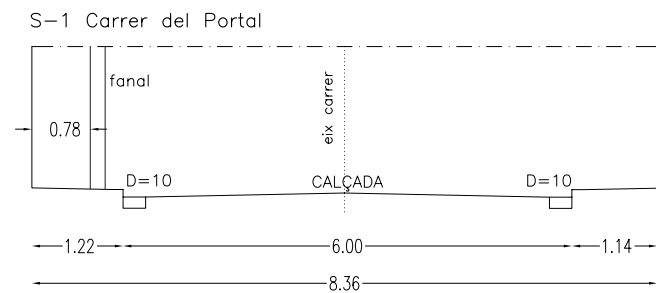


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

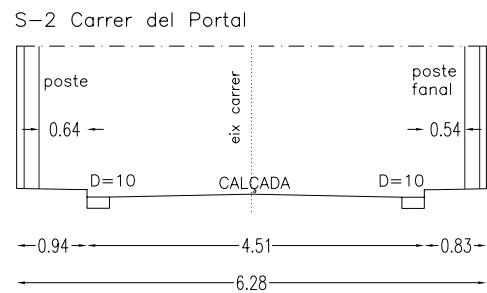


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

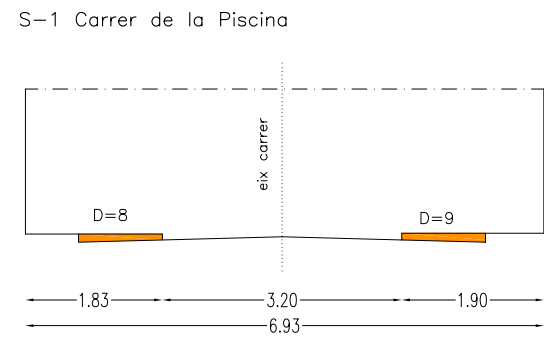


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament  
Traslladar poste elèctric

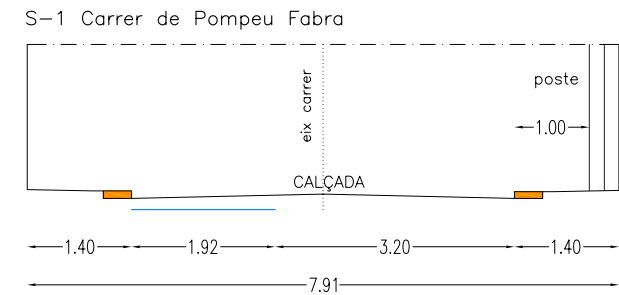


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

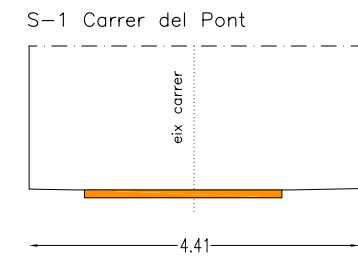


PROPOSTA  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Trasllat de fanal

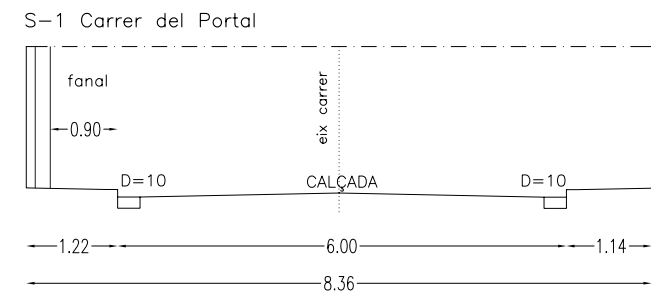


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

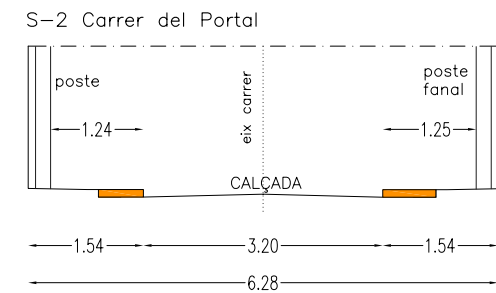


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

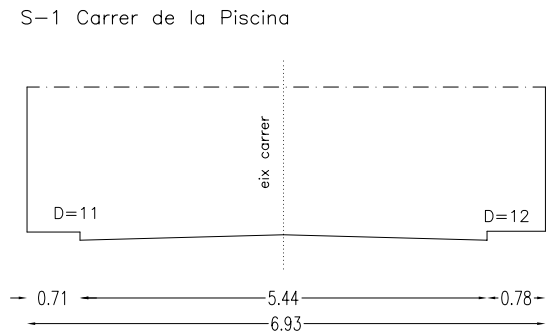


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

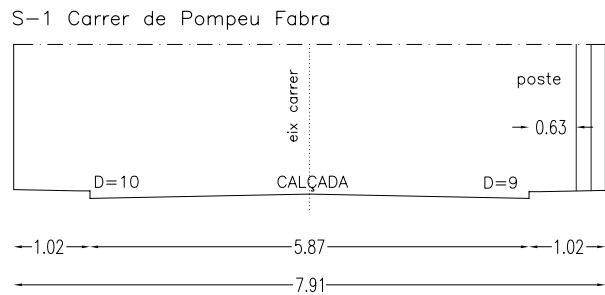


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

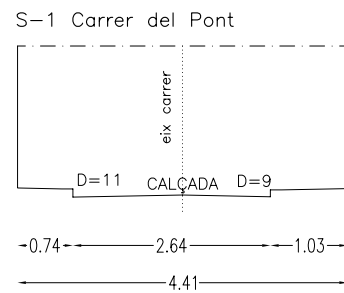


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

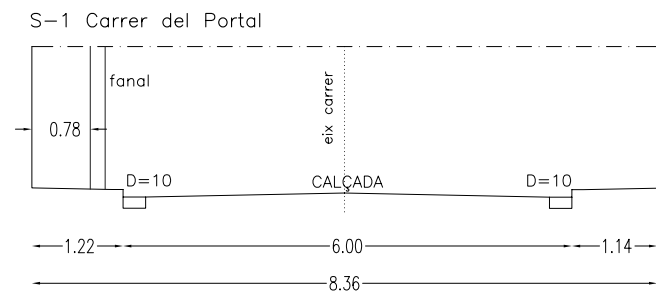


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

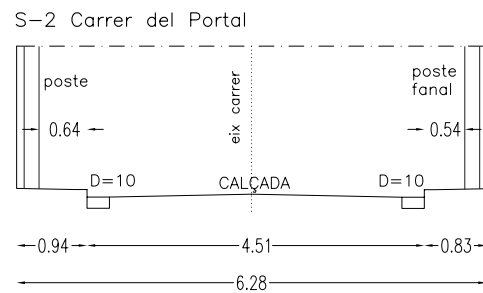


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

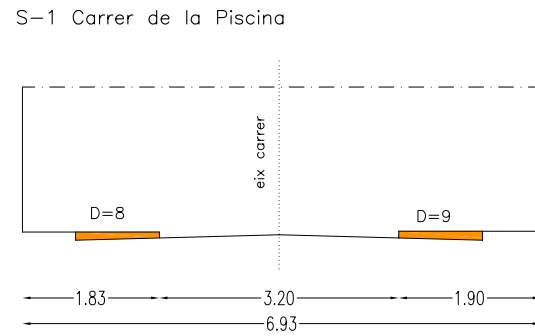


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament  
Traslladar poste elèctric

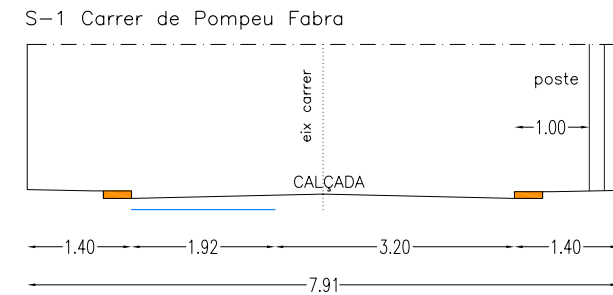


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

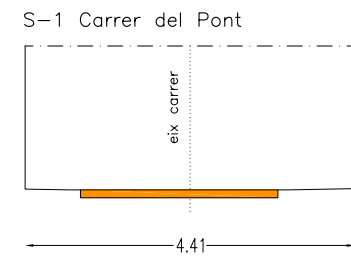

PROPOSTA  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Trasllat de fanal

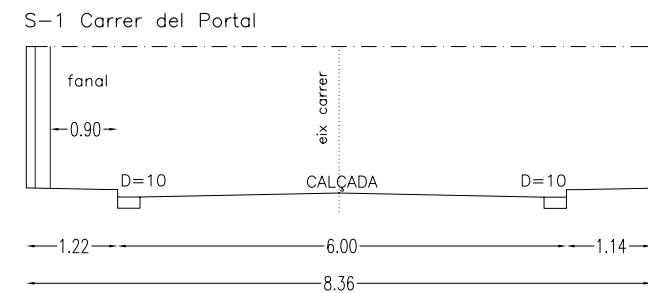


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

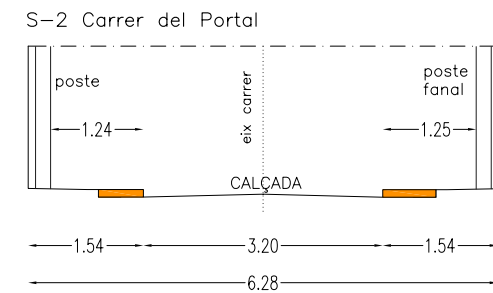





ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació

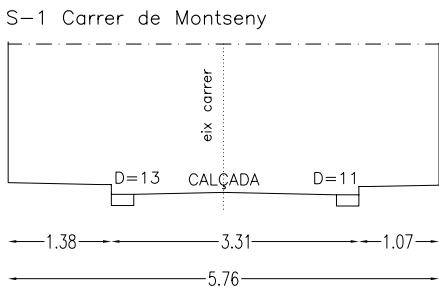


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

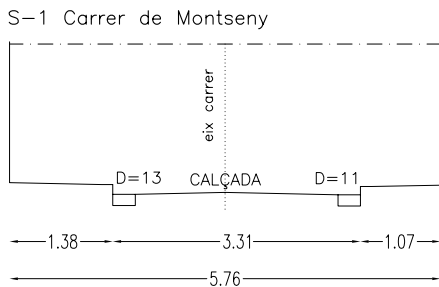


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

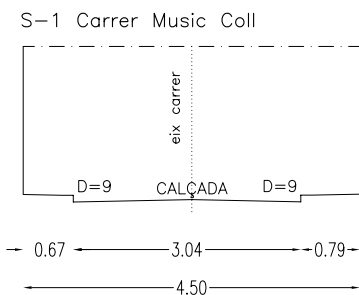


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

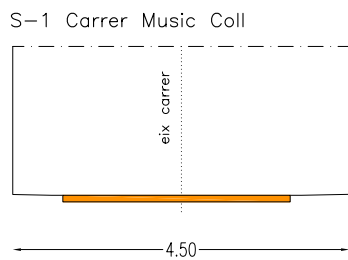


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

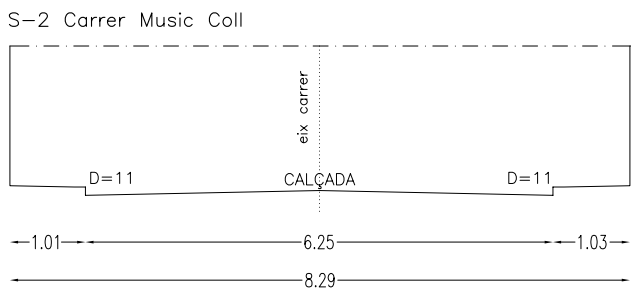


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

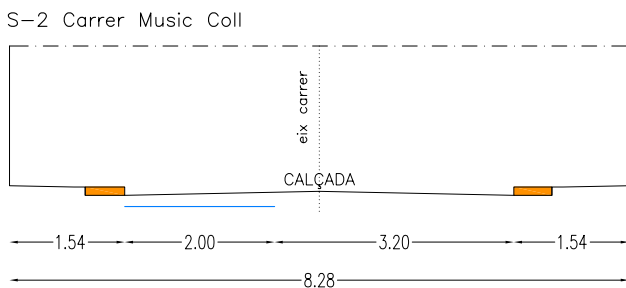


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

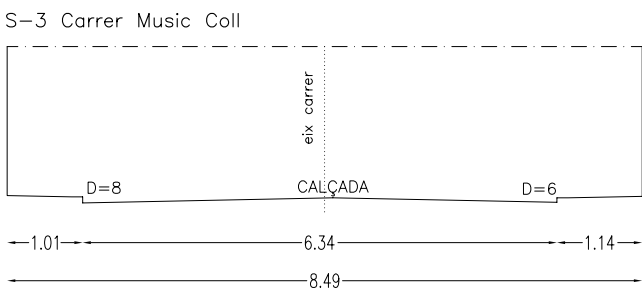


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

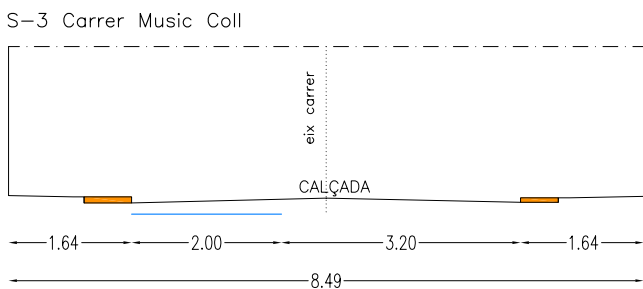


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

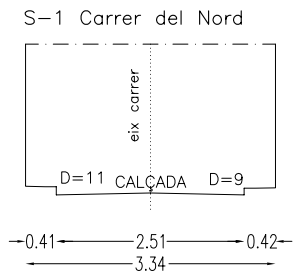


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació




ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

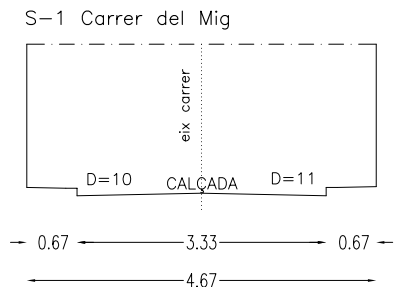


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

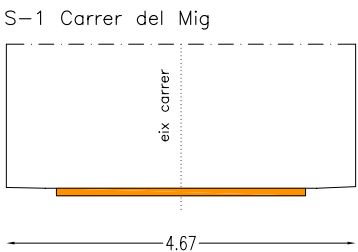


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

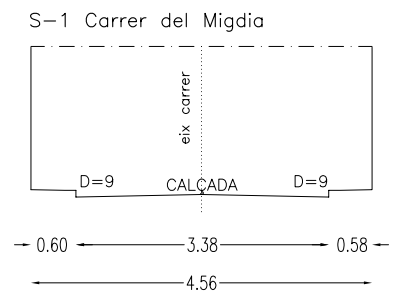


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

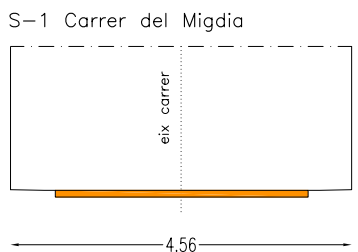


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

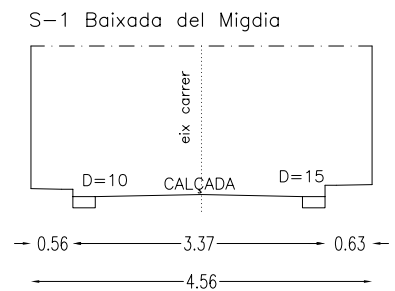


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

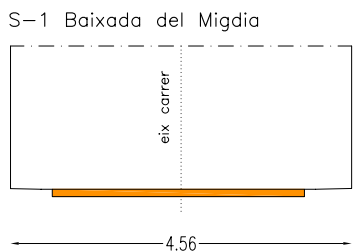


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

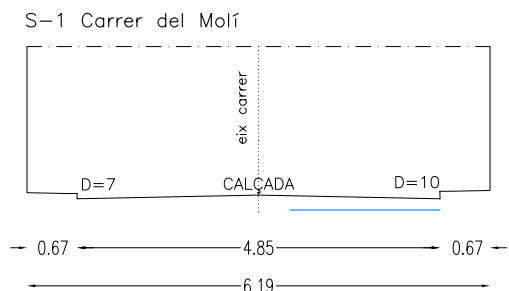


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

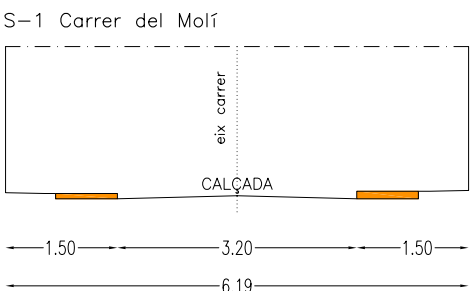


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

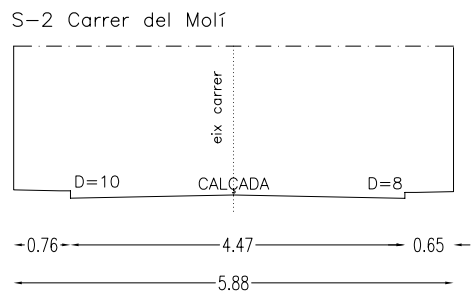


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

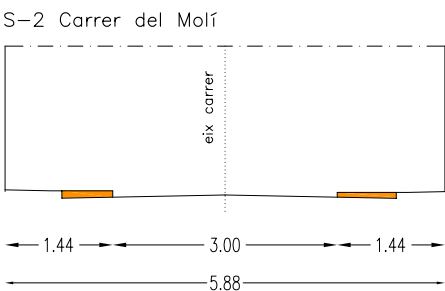


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Dos sentits de circulació

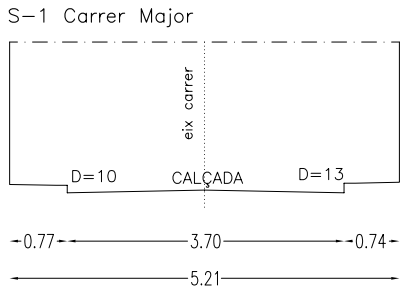


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Dos sentits de circulació

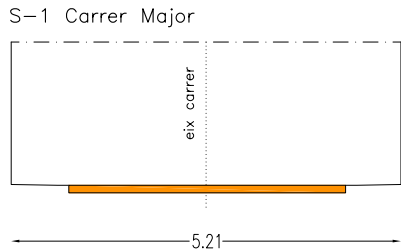


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

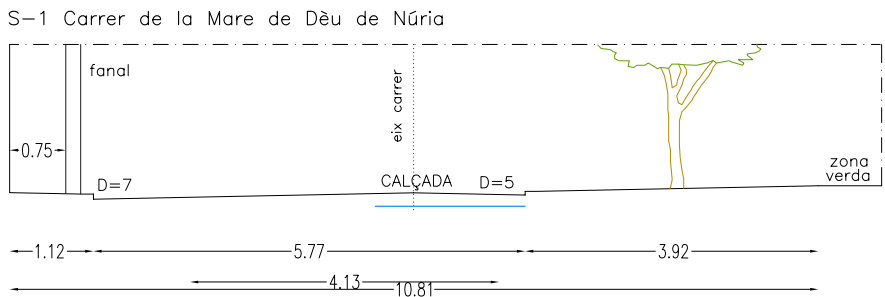


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament  
Traslladar de fanal

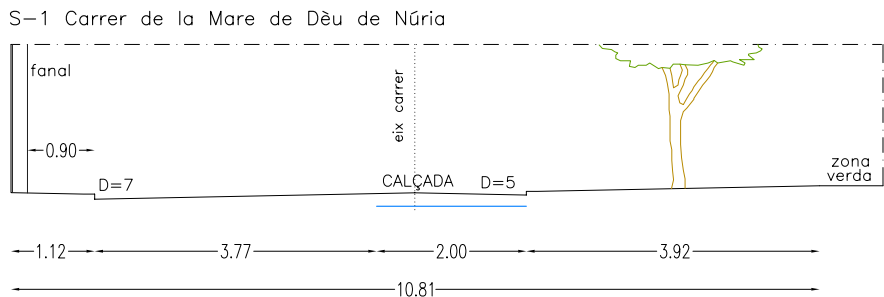


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

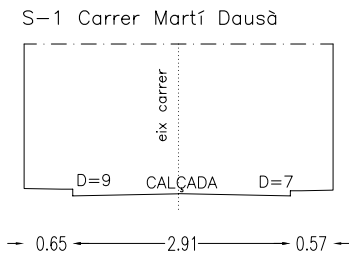


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

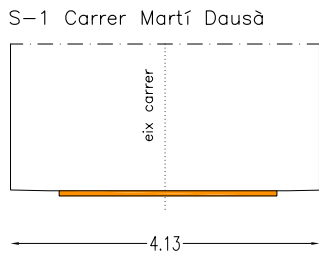


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

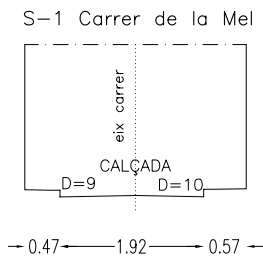


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació




ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

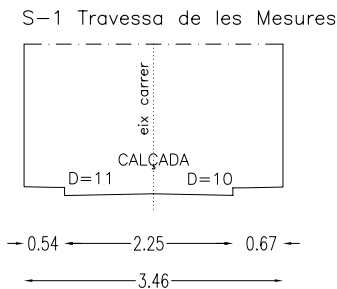


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

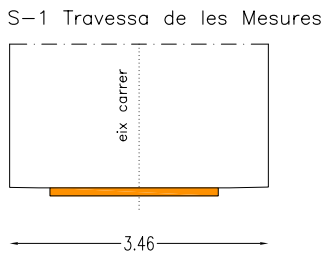


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

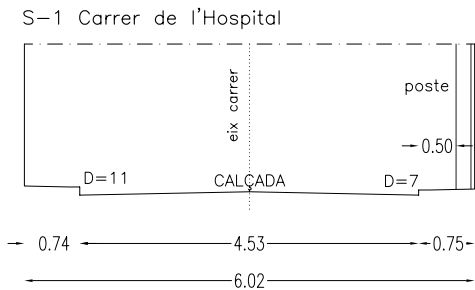


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

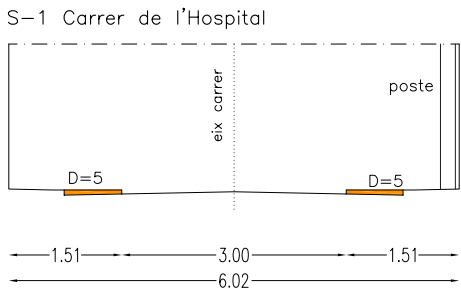


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

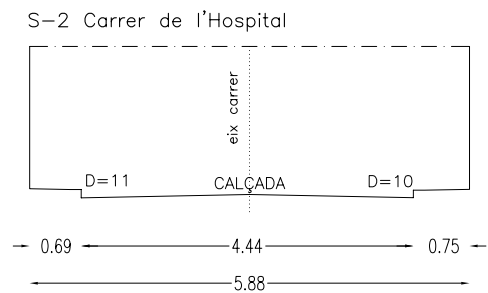


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

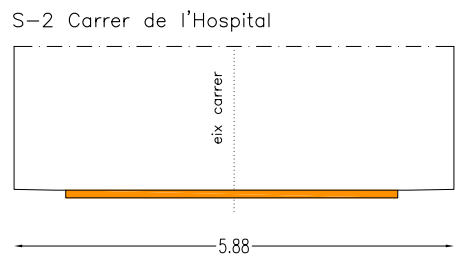


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

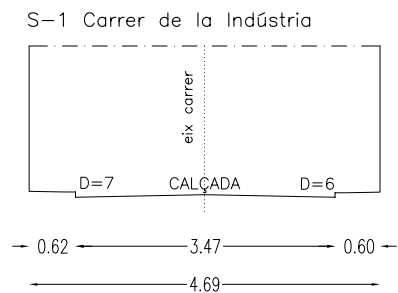


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

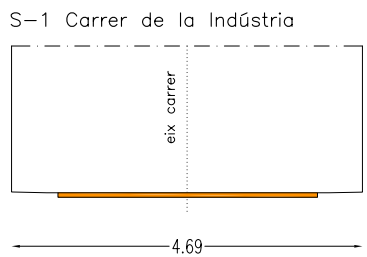


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

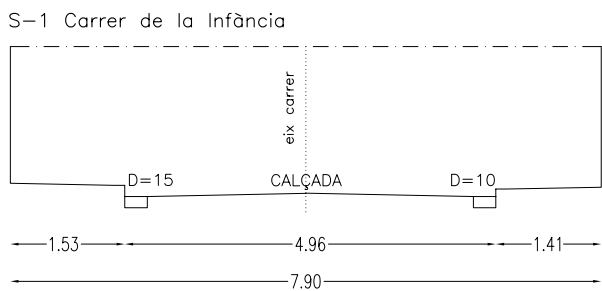


PROPOSTA  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

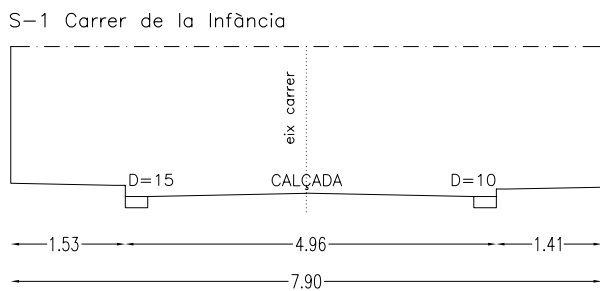


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

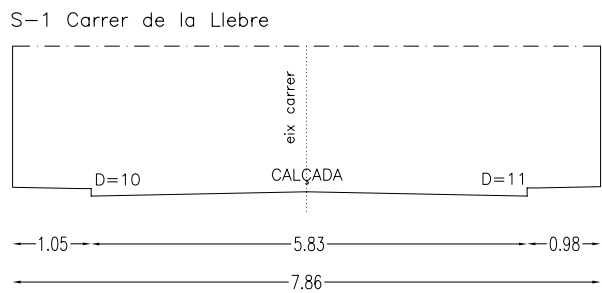


PROPOSTA  
Ampliar vorera dreta  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

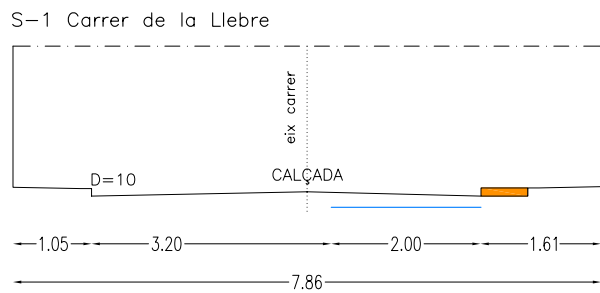


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

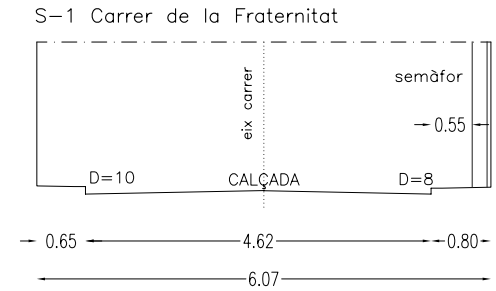


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

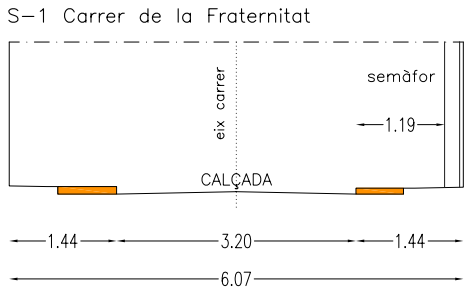


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

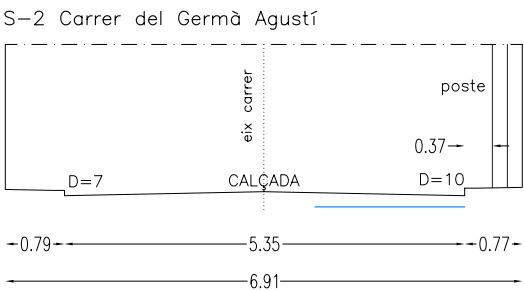


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

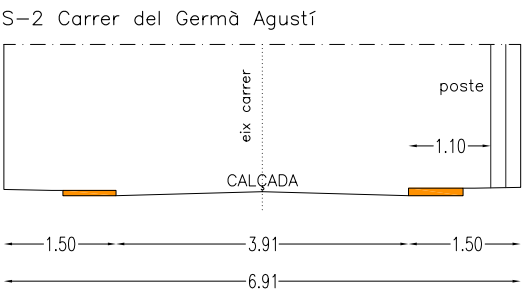


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

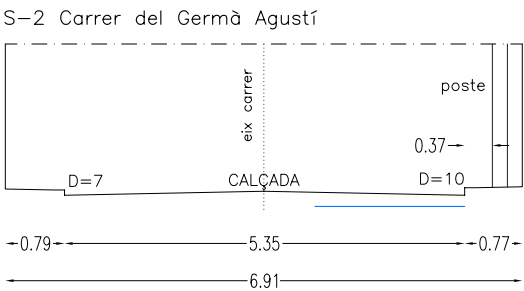


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

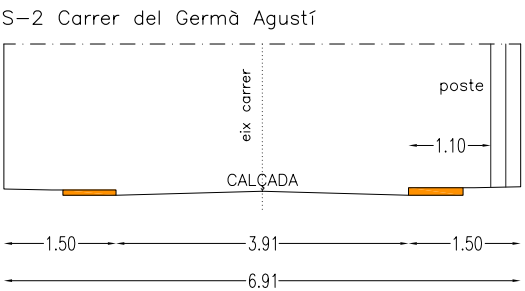


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

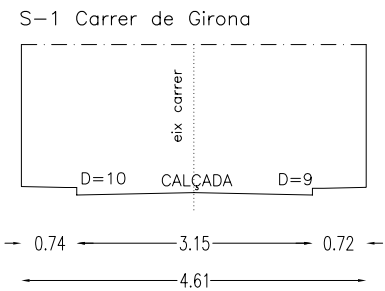


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

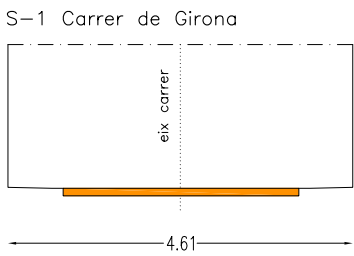


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

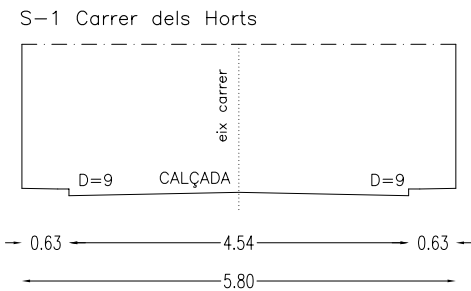


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

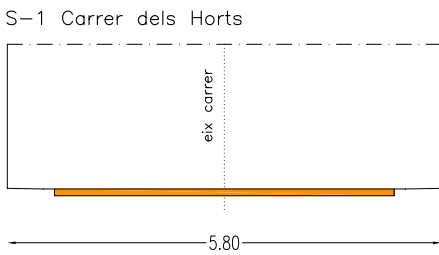


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

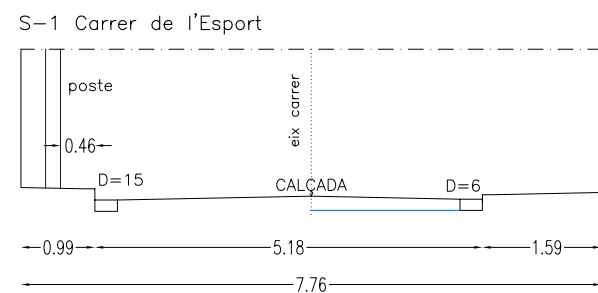


PROPOSTA  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament  
Traslladar poste elèctric

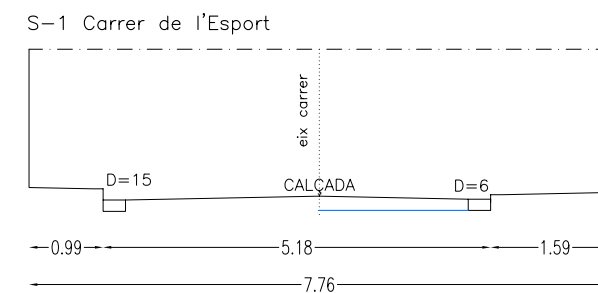


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

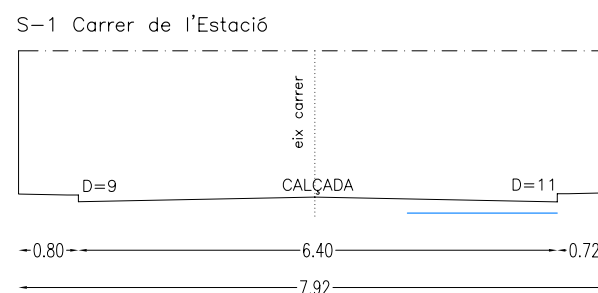


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

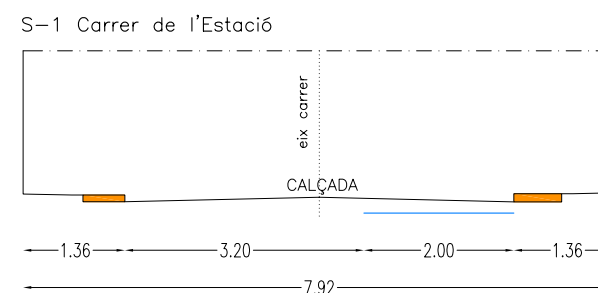


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

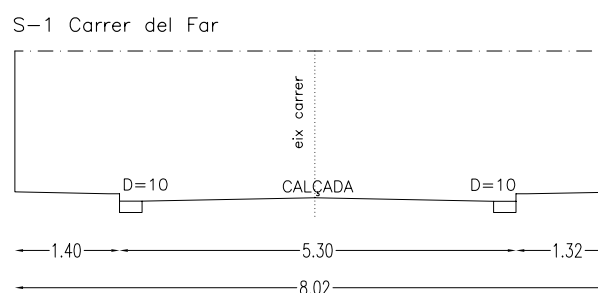


PROPOSTA  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

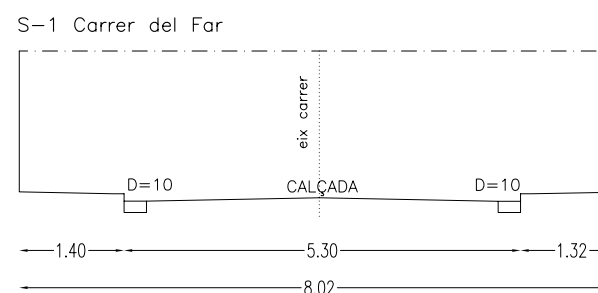


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Una franja d'aparcament

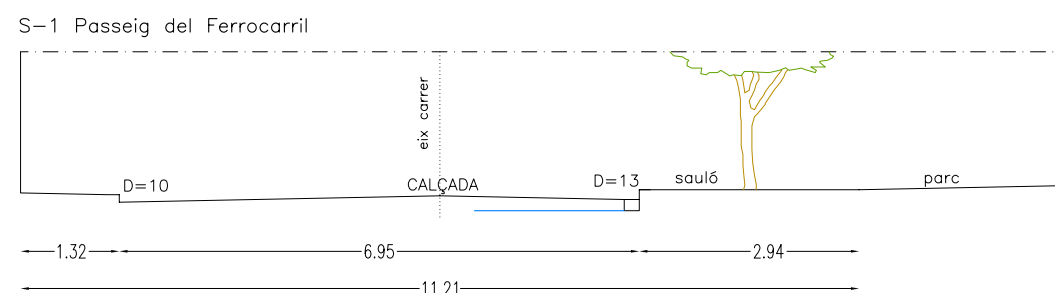


PROPOSTA  
Construir guais de vianants  
Dos sentits de circulació  
Una franja d'aparcament

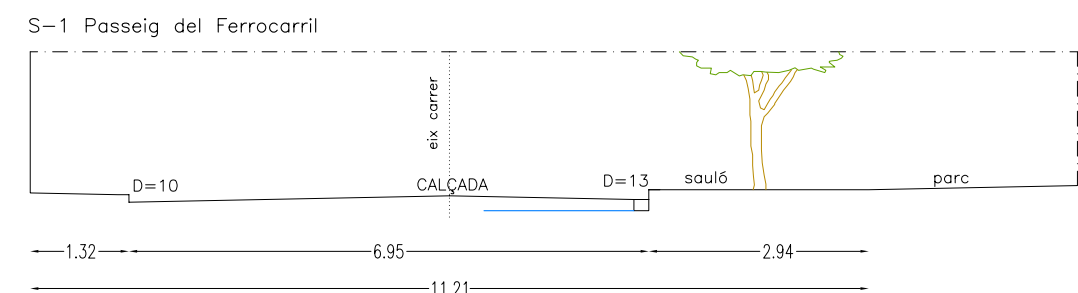


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

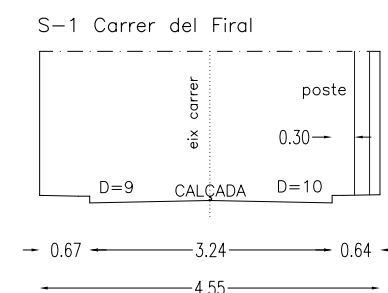


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

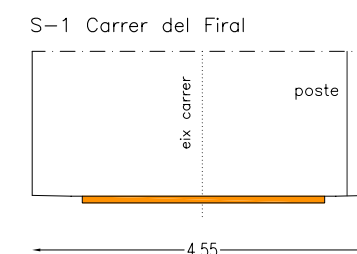


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

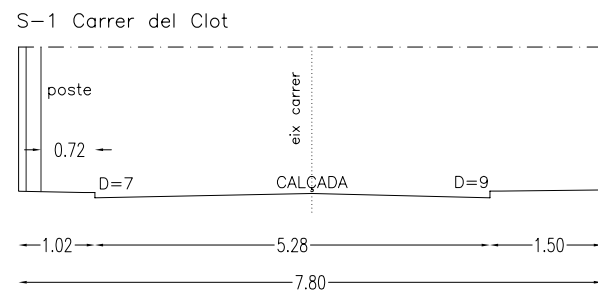


PROPOSTA  
Ampliar vorera esquerra  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

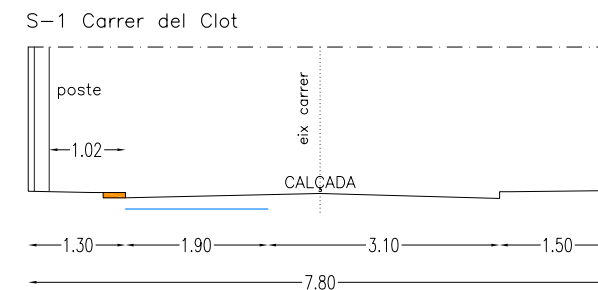


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

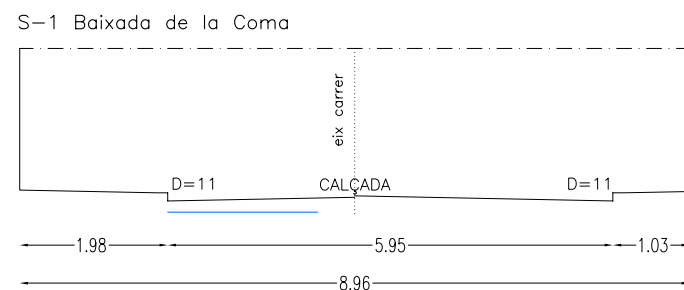


PROPOSTA  
Ampliar vorera dreta  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

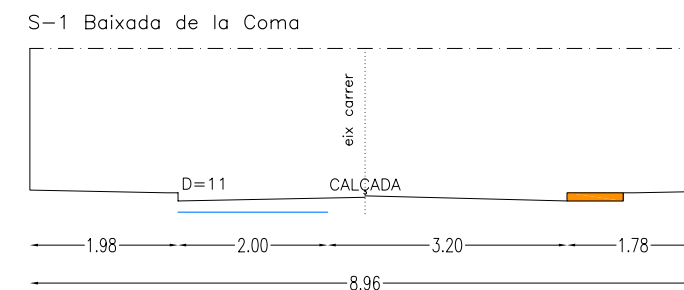


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

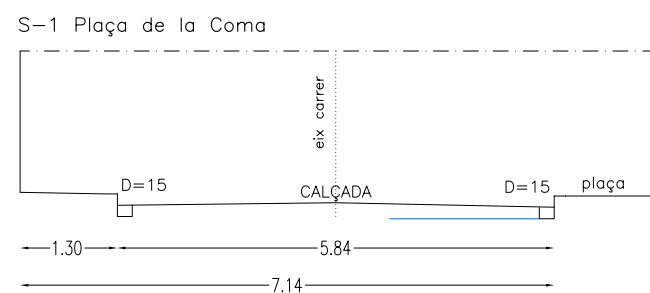


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

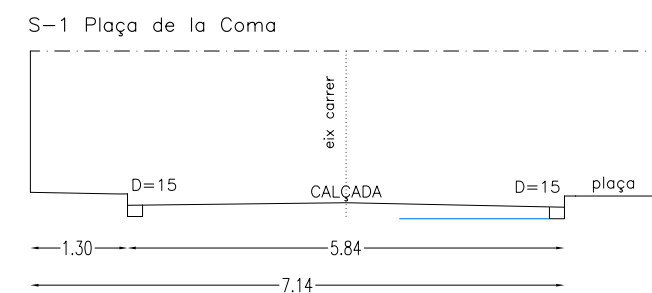


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

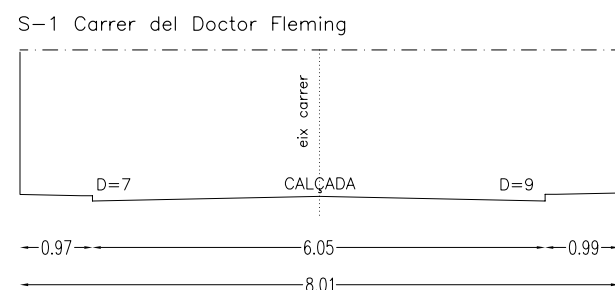


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

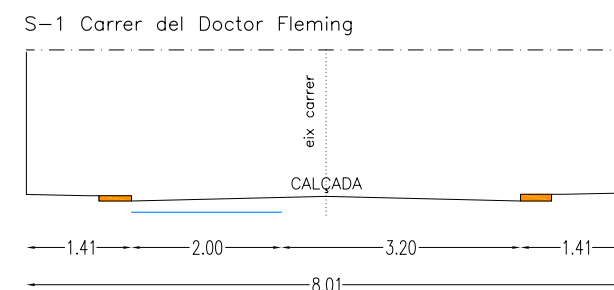


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

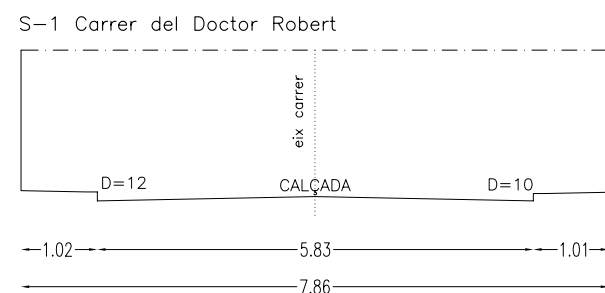


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Dos sentits de circulació  
Ampliar les dues voreres

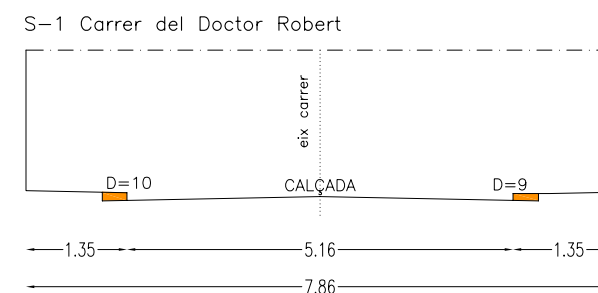


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

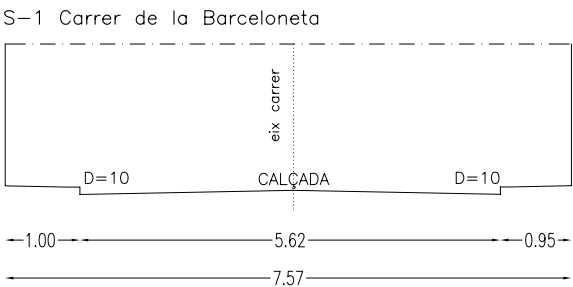


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

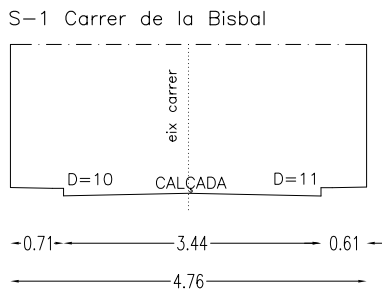


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

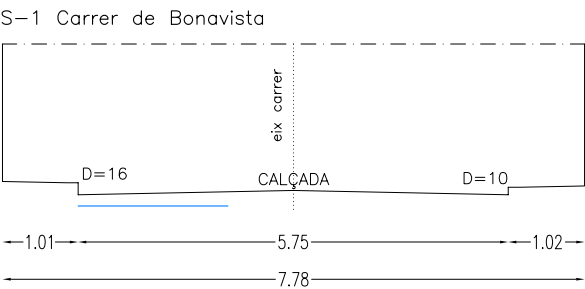


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

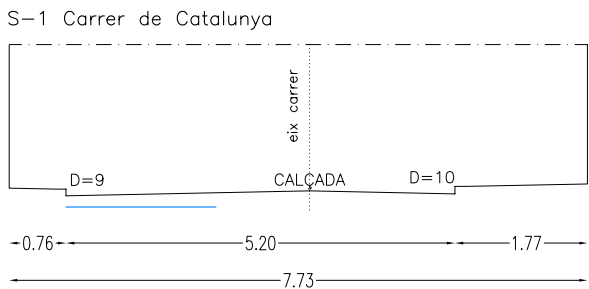


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

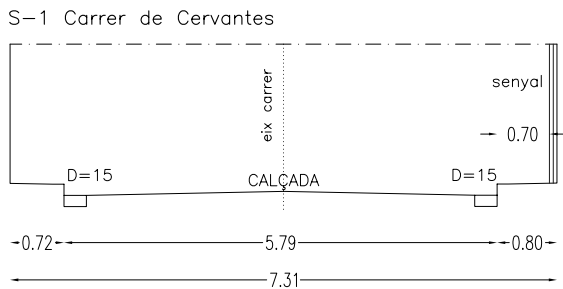


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

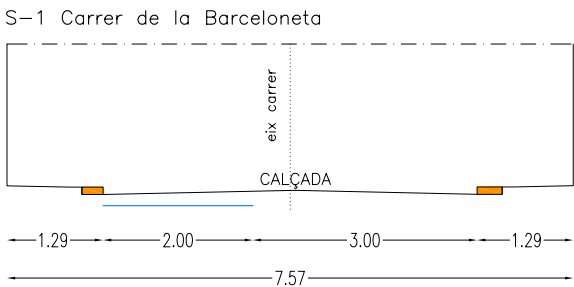


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

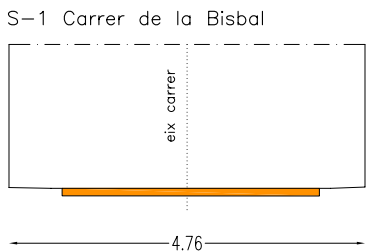


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

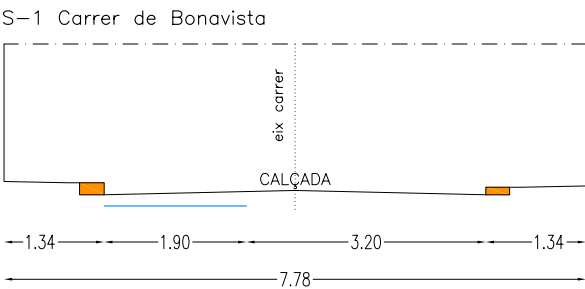

PROPOSTA  
Ampliar vorera esquerra  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

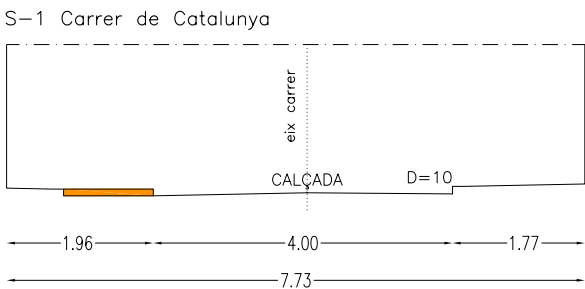


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guais de vianants  
Un sentit de circulació

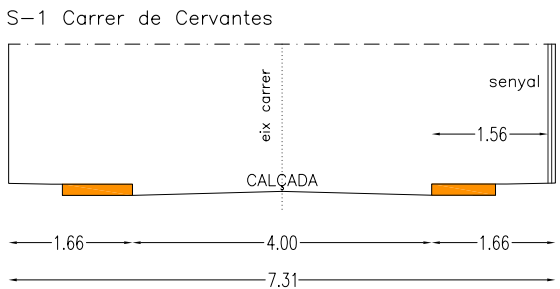





ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

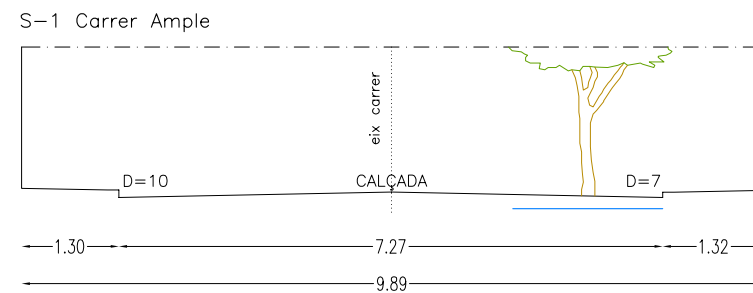


PROPOSTA  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

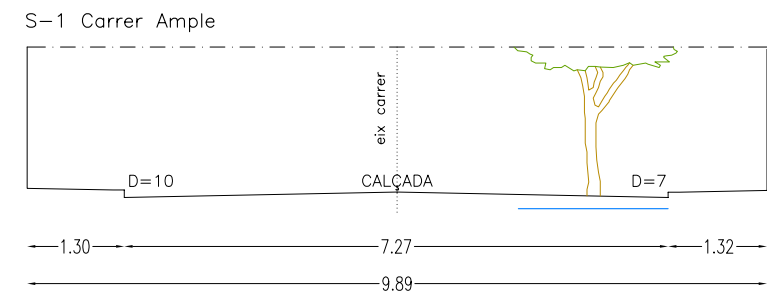


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Dos sentits de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

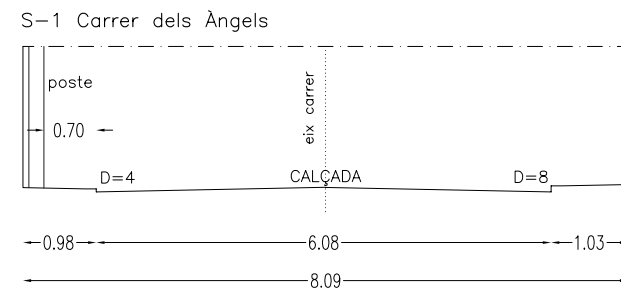


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

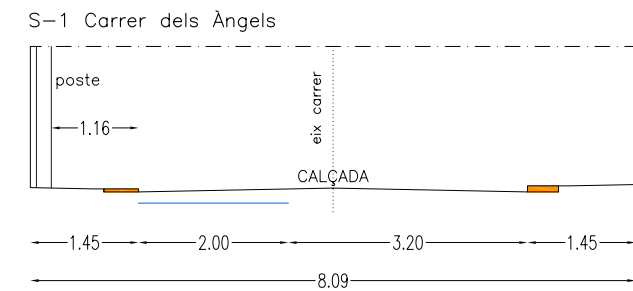


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació

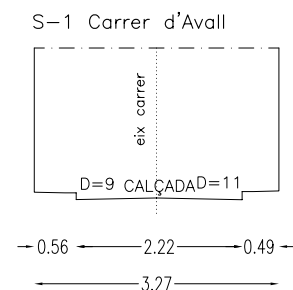


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació

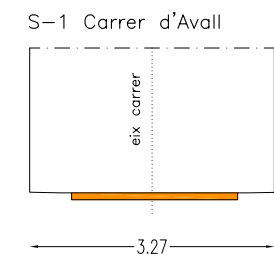


ESTAT ACTUAL  
Voreres > 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

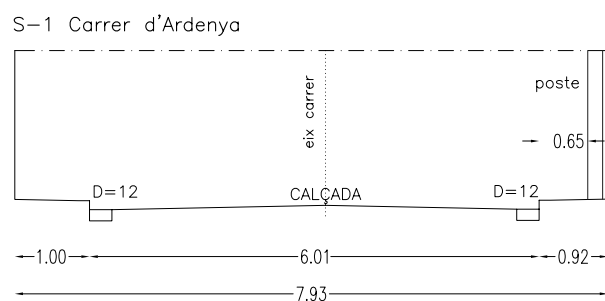


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació  
Una franja d'aparcament

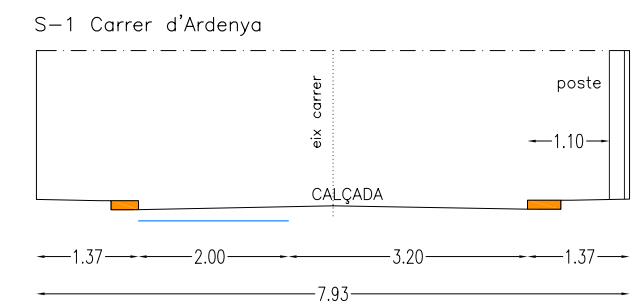


ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació  
Cotxes aparcats a un costat

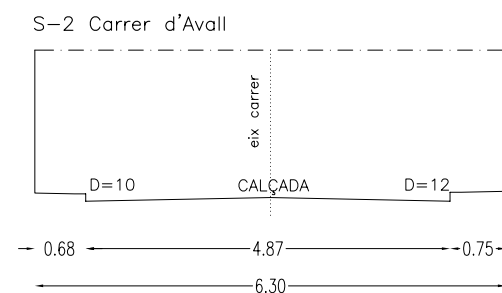


PROPOSTA  
Ampliar les dues voreres  
Construir guals de vianants  
Un sentit de circulació

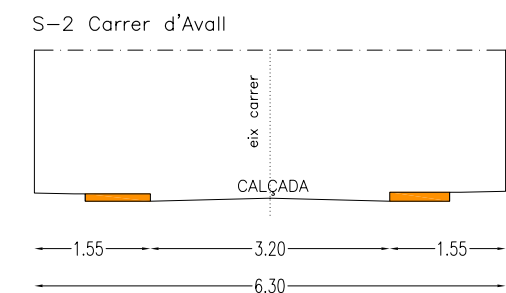

ESTAT ACTUAL  
Voreres < 90cms  
Un sentit de circulació






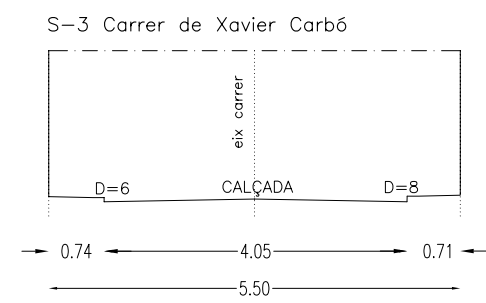


PROPOSTA  
Suprimir voreres  
Construir itinerari mixt adaptat  
Un sentit de circulació







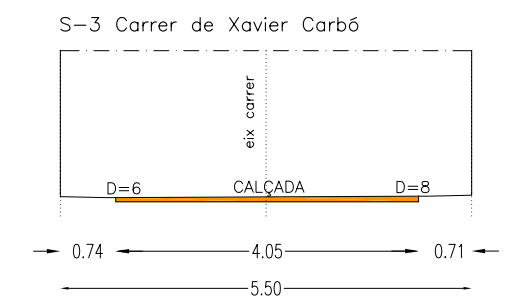






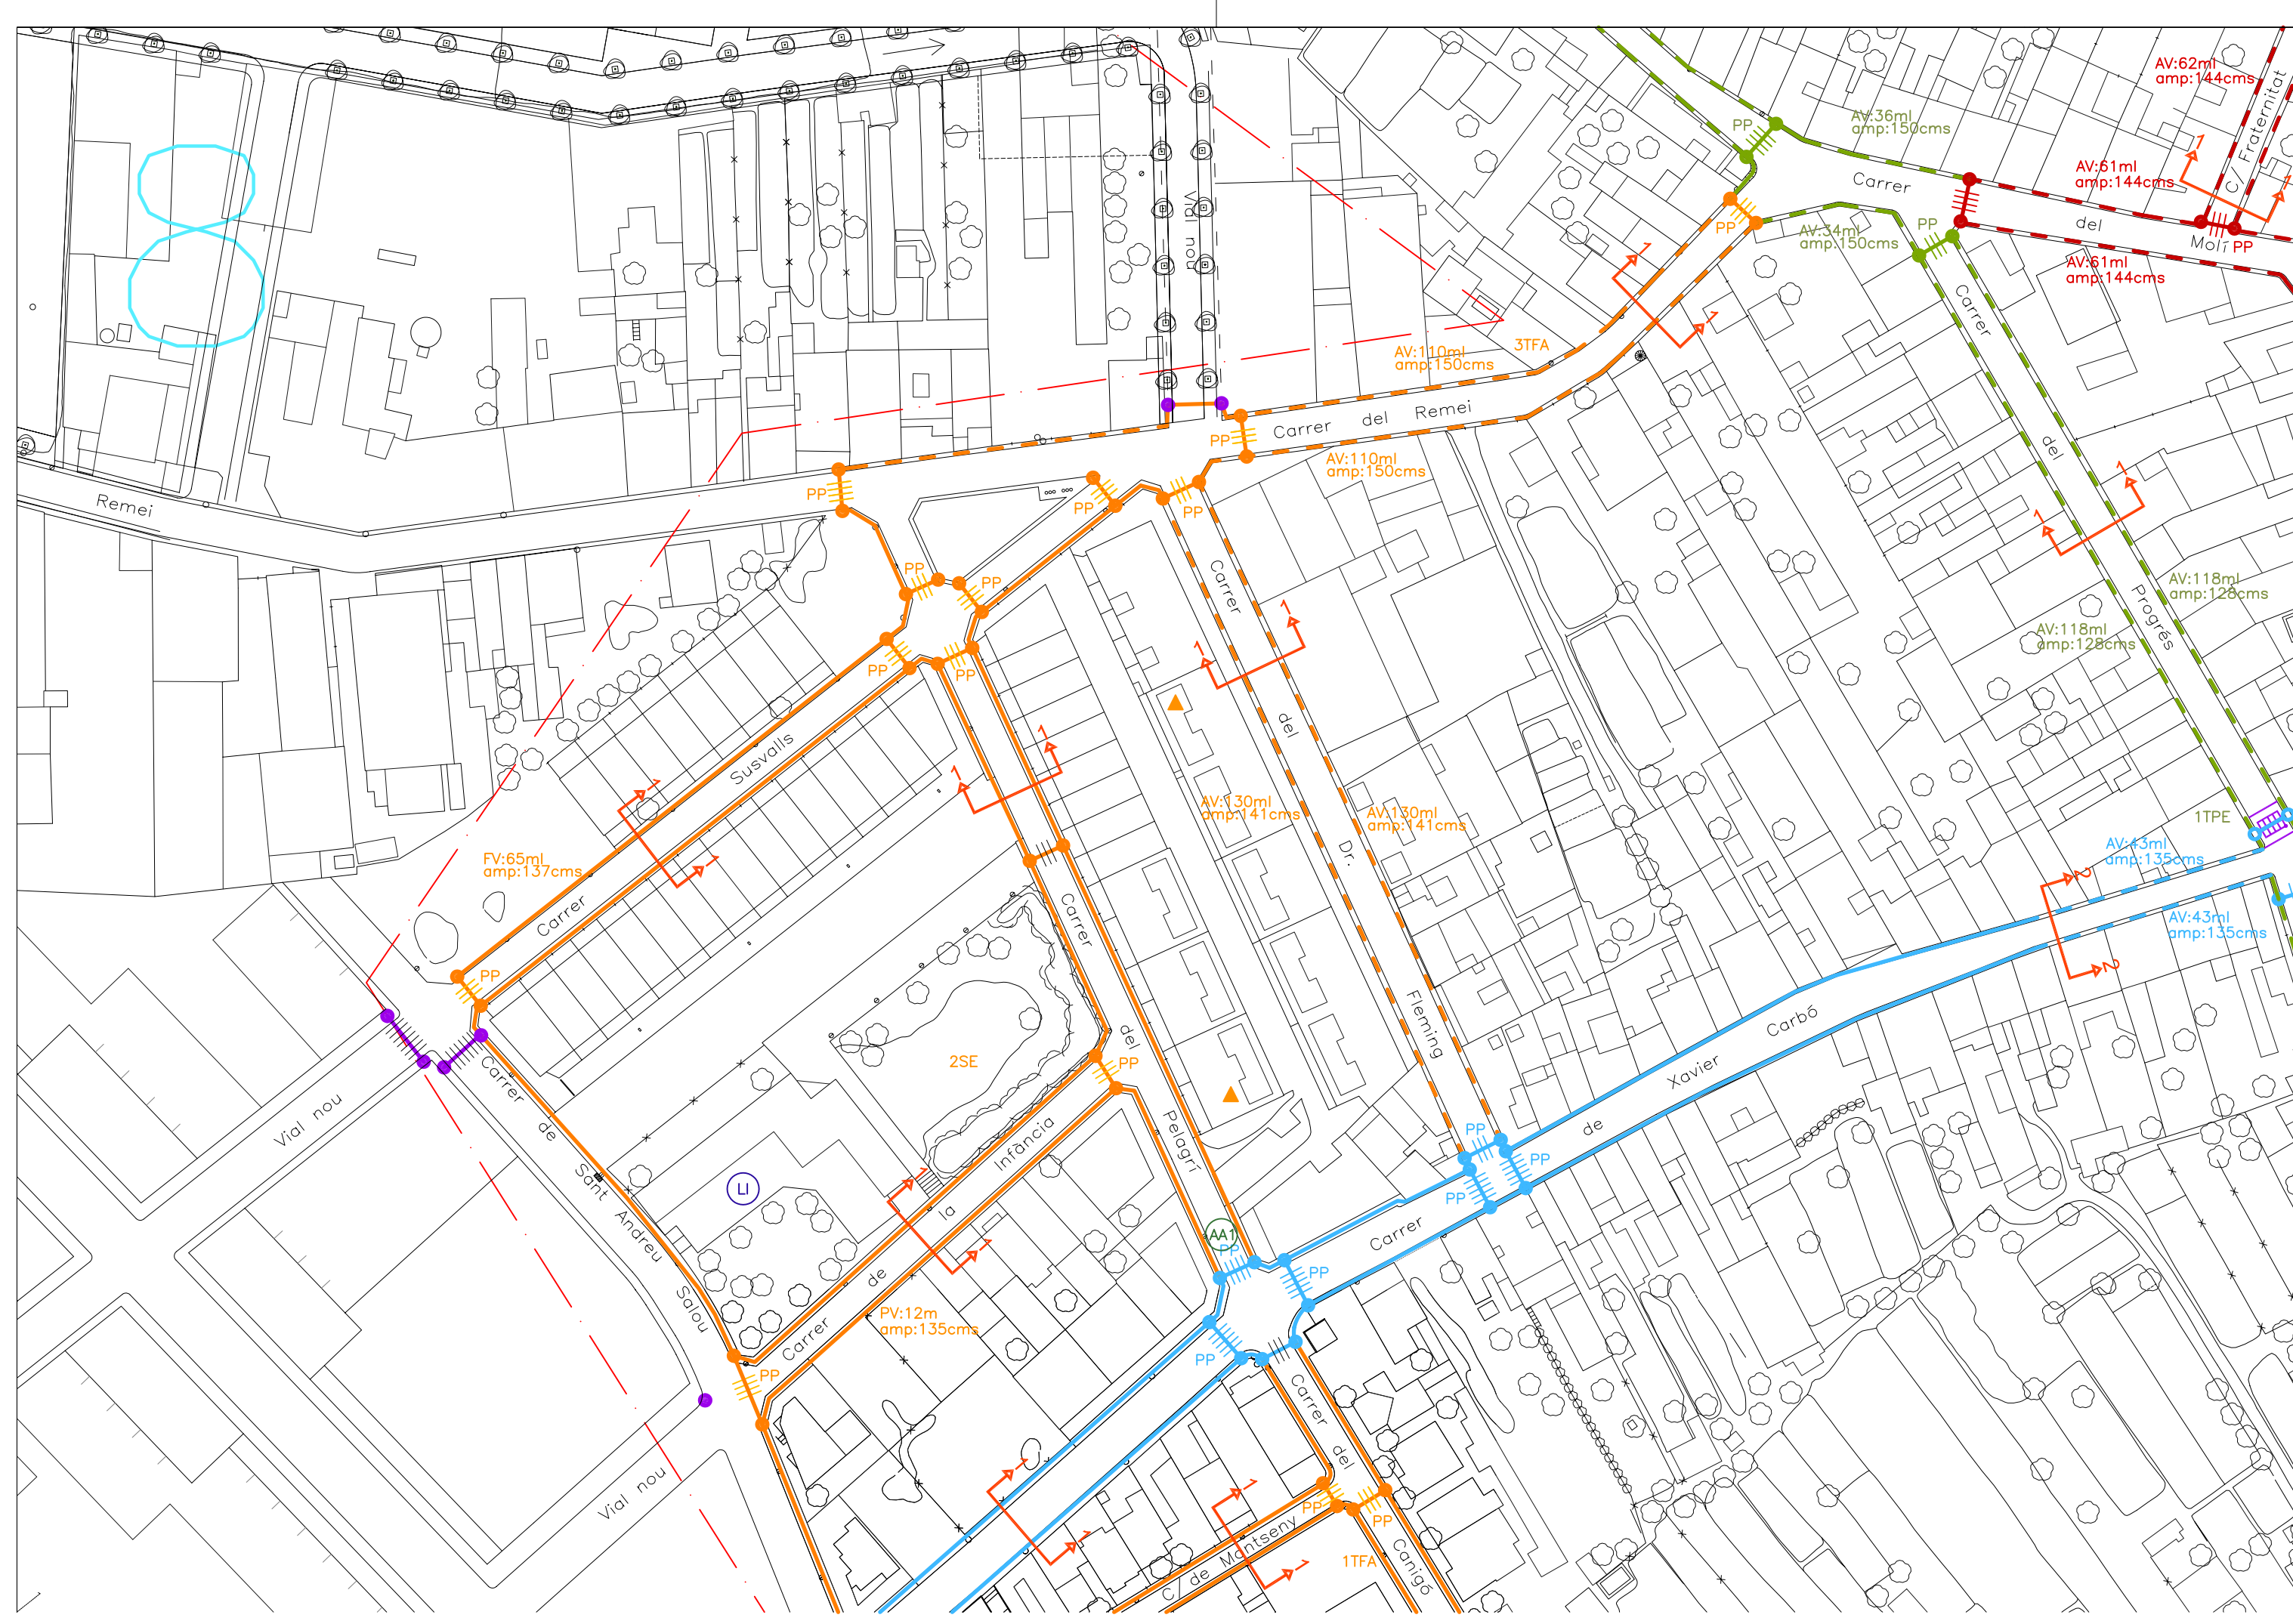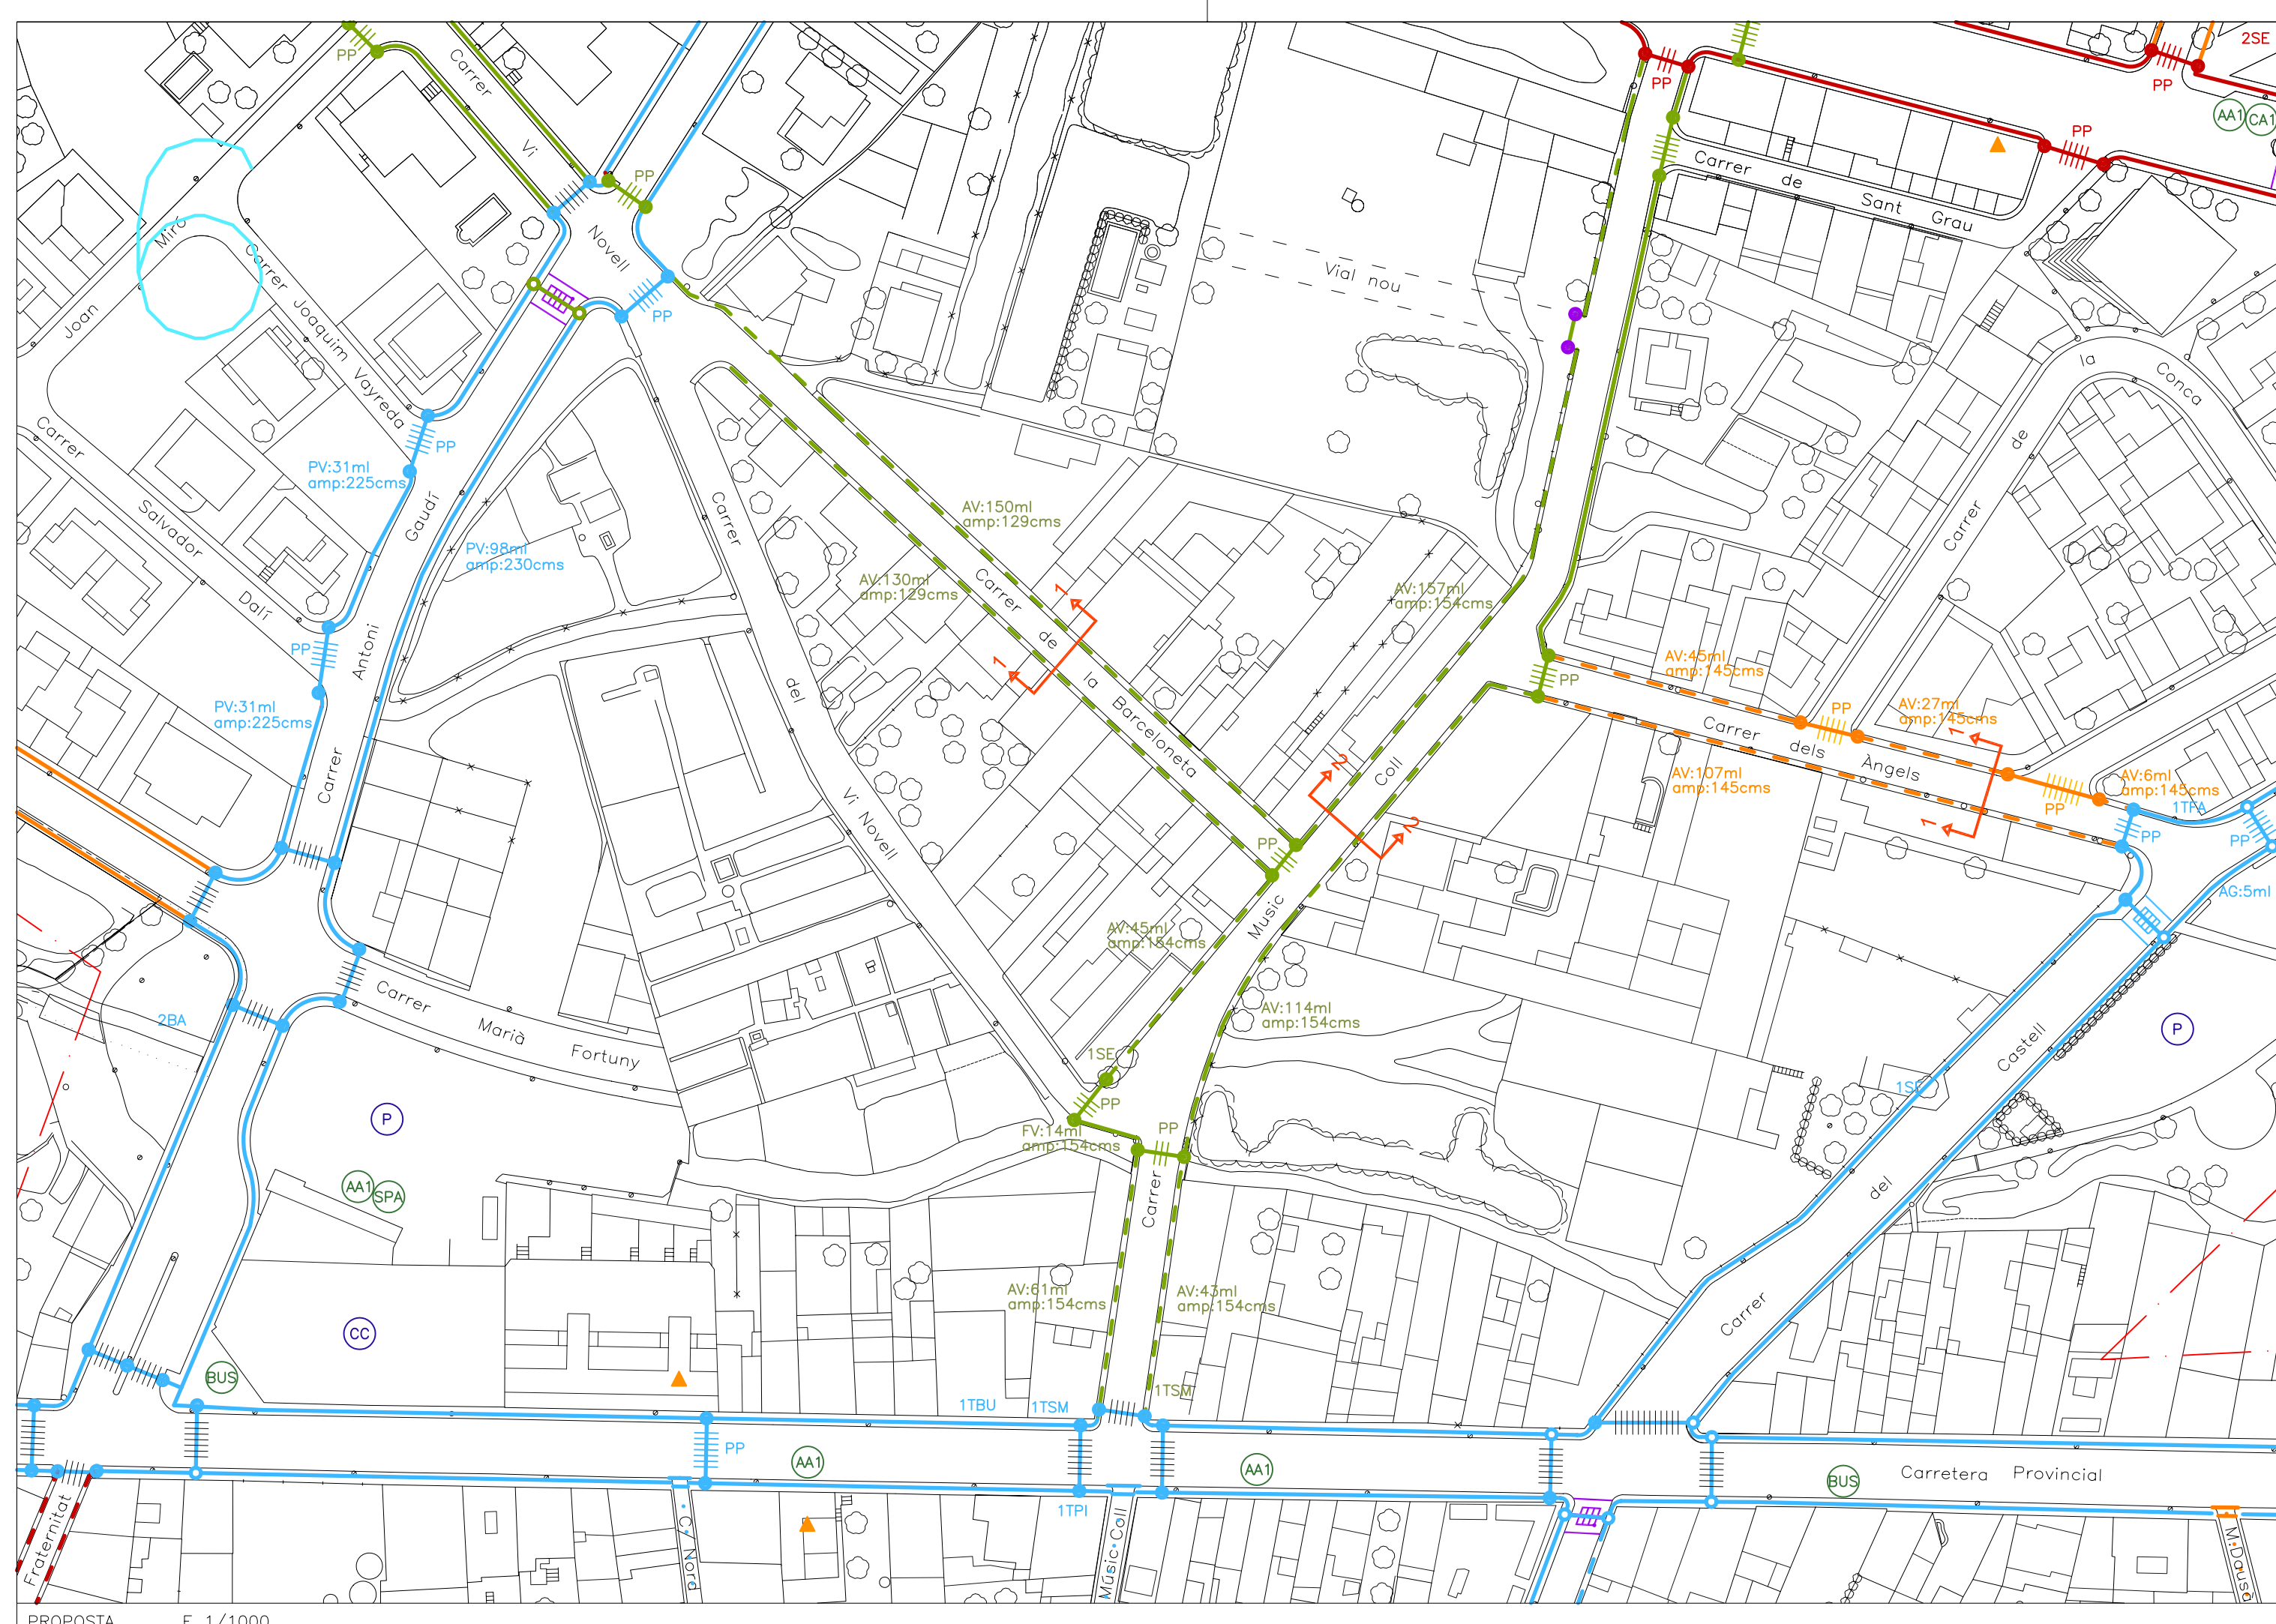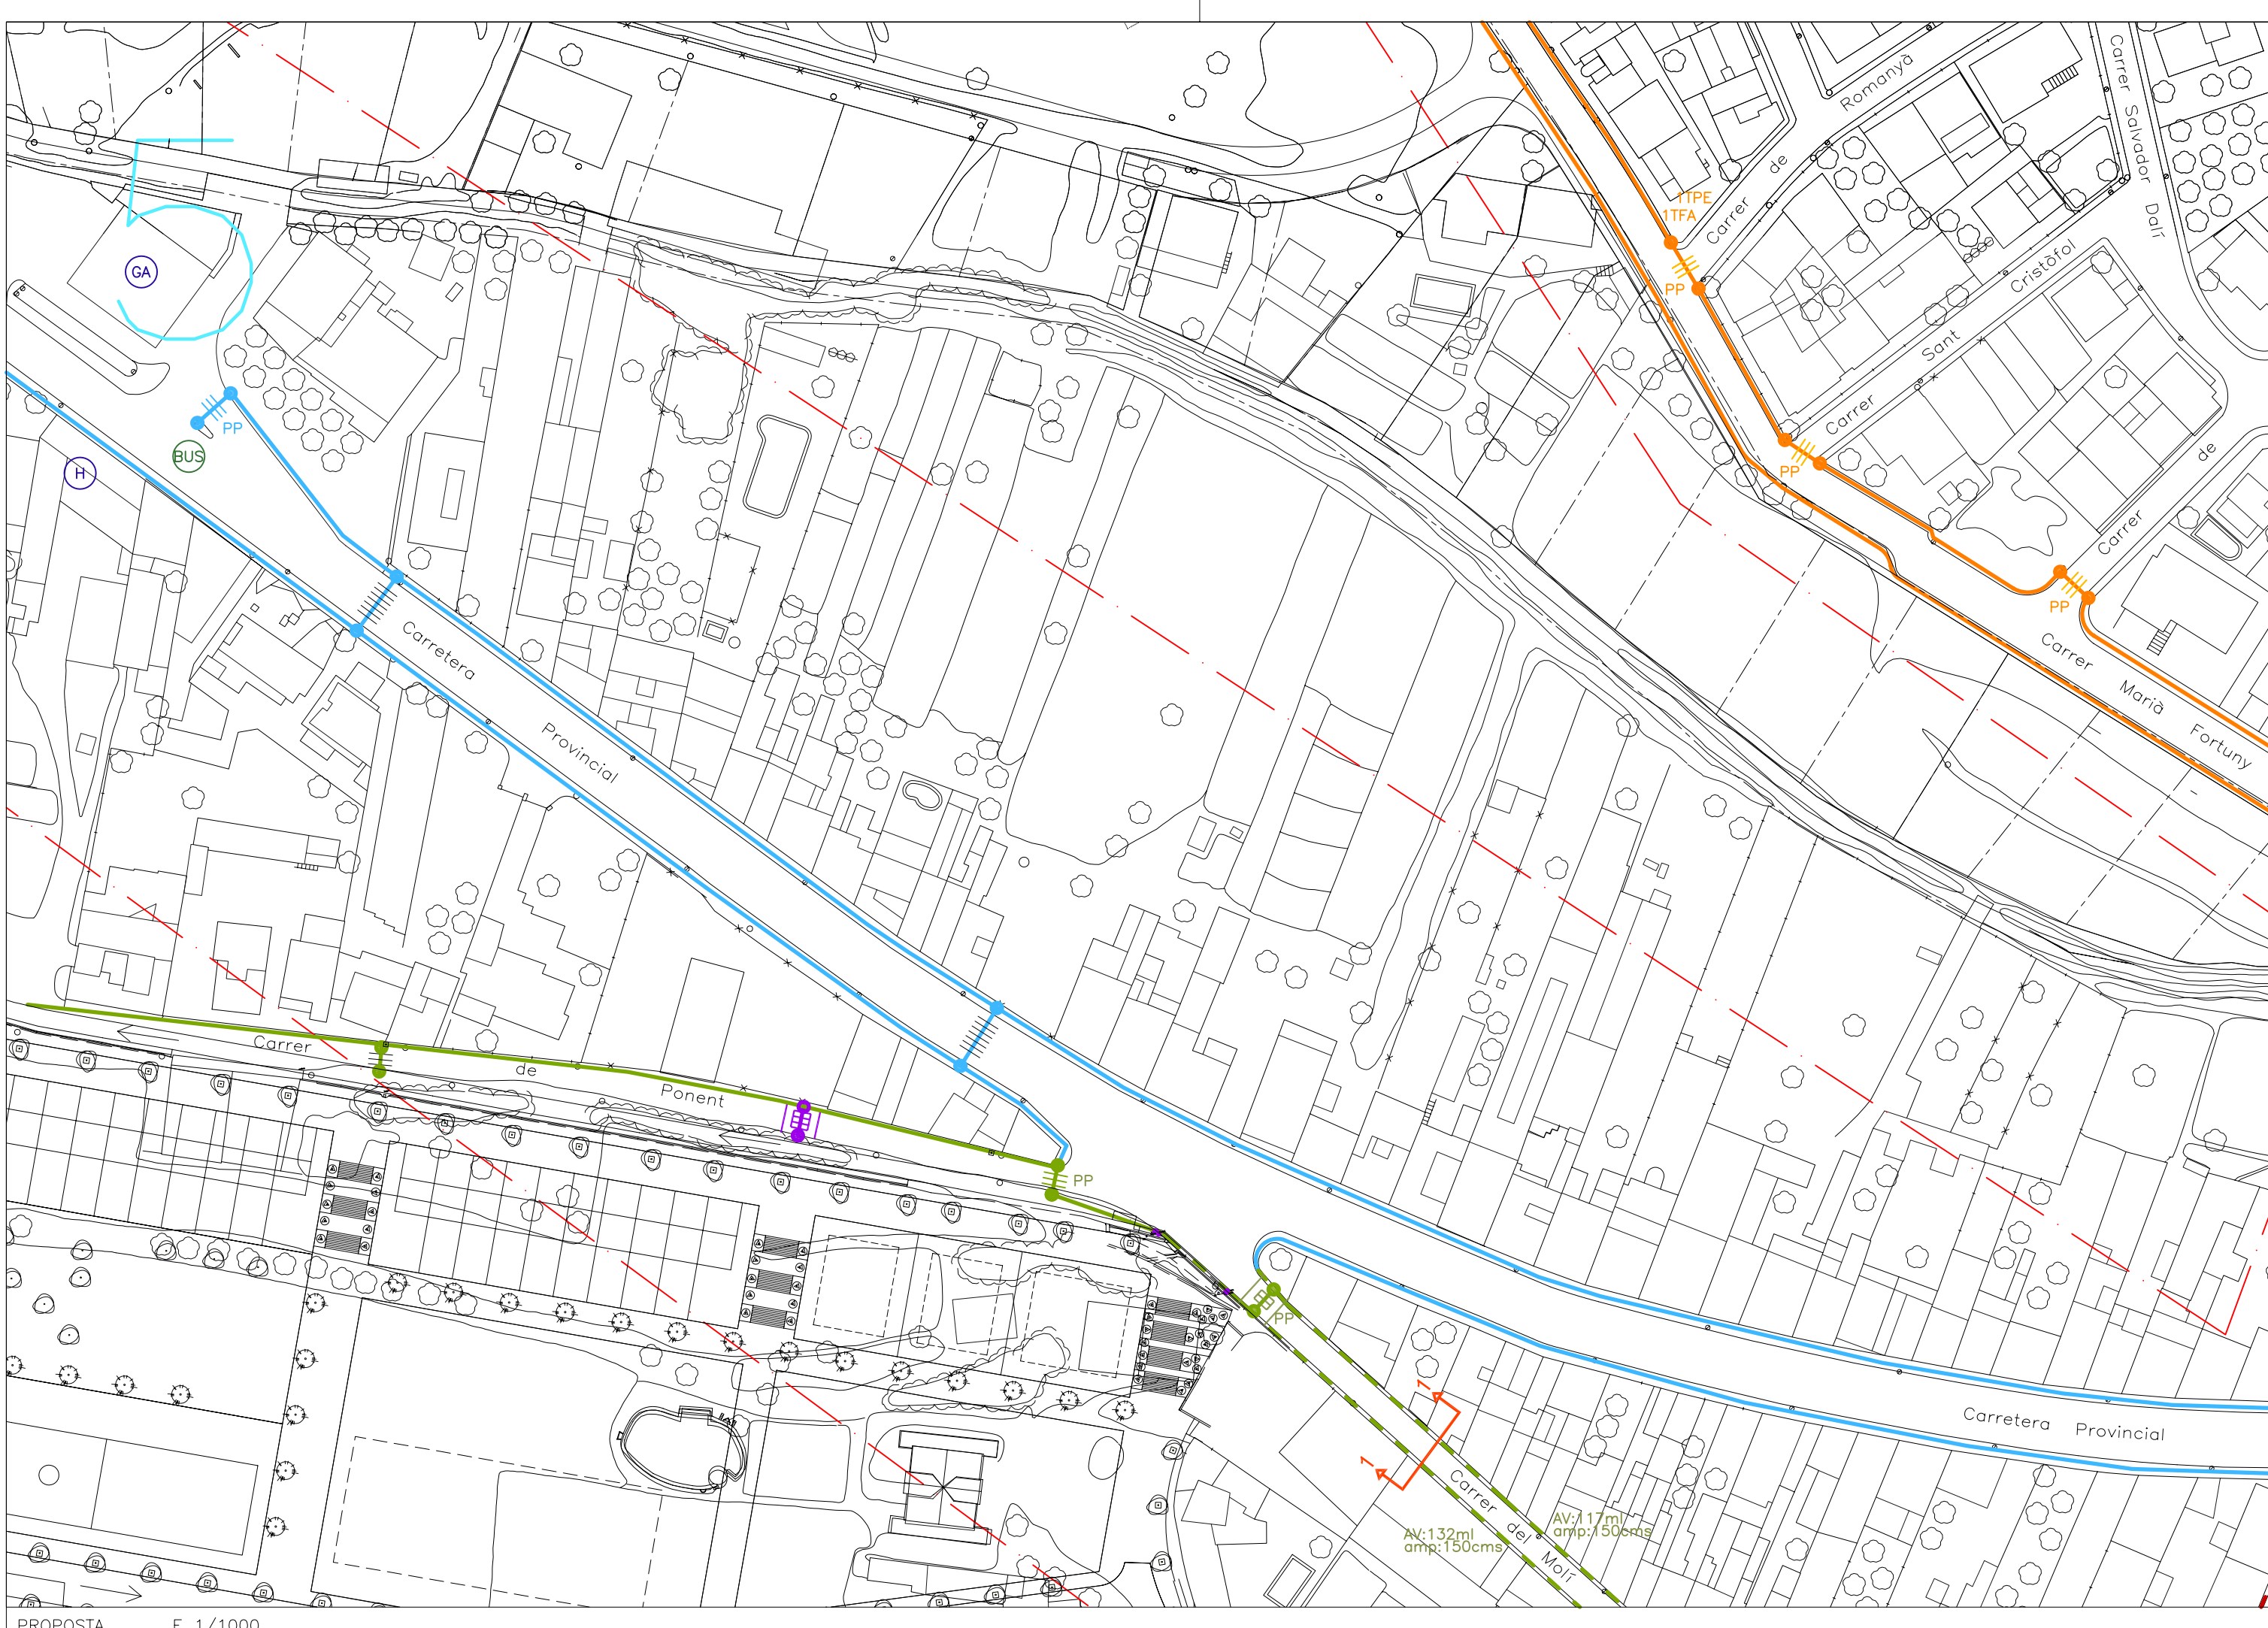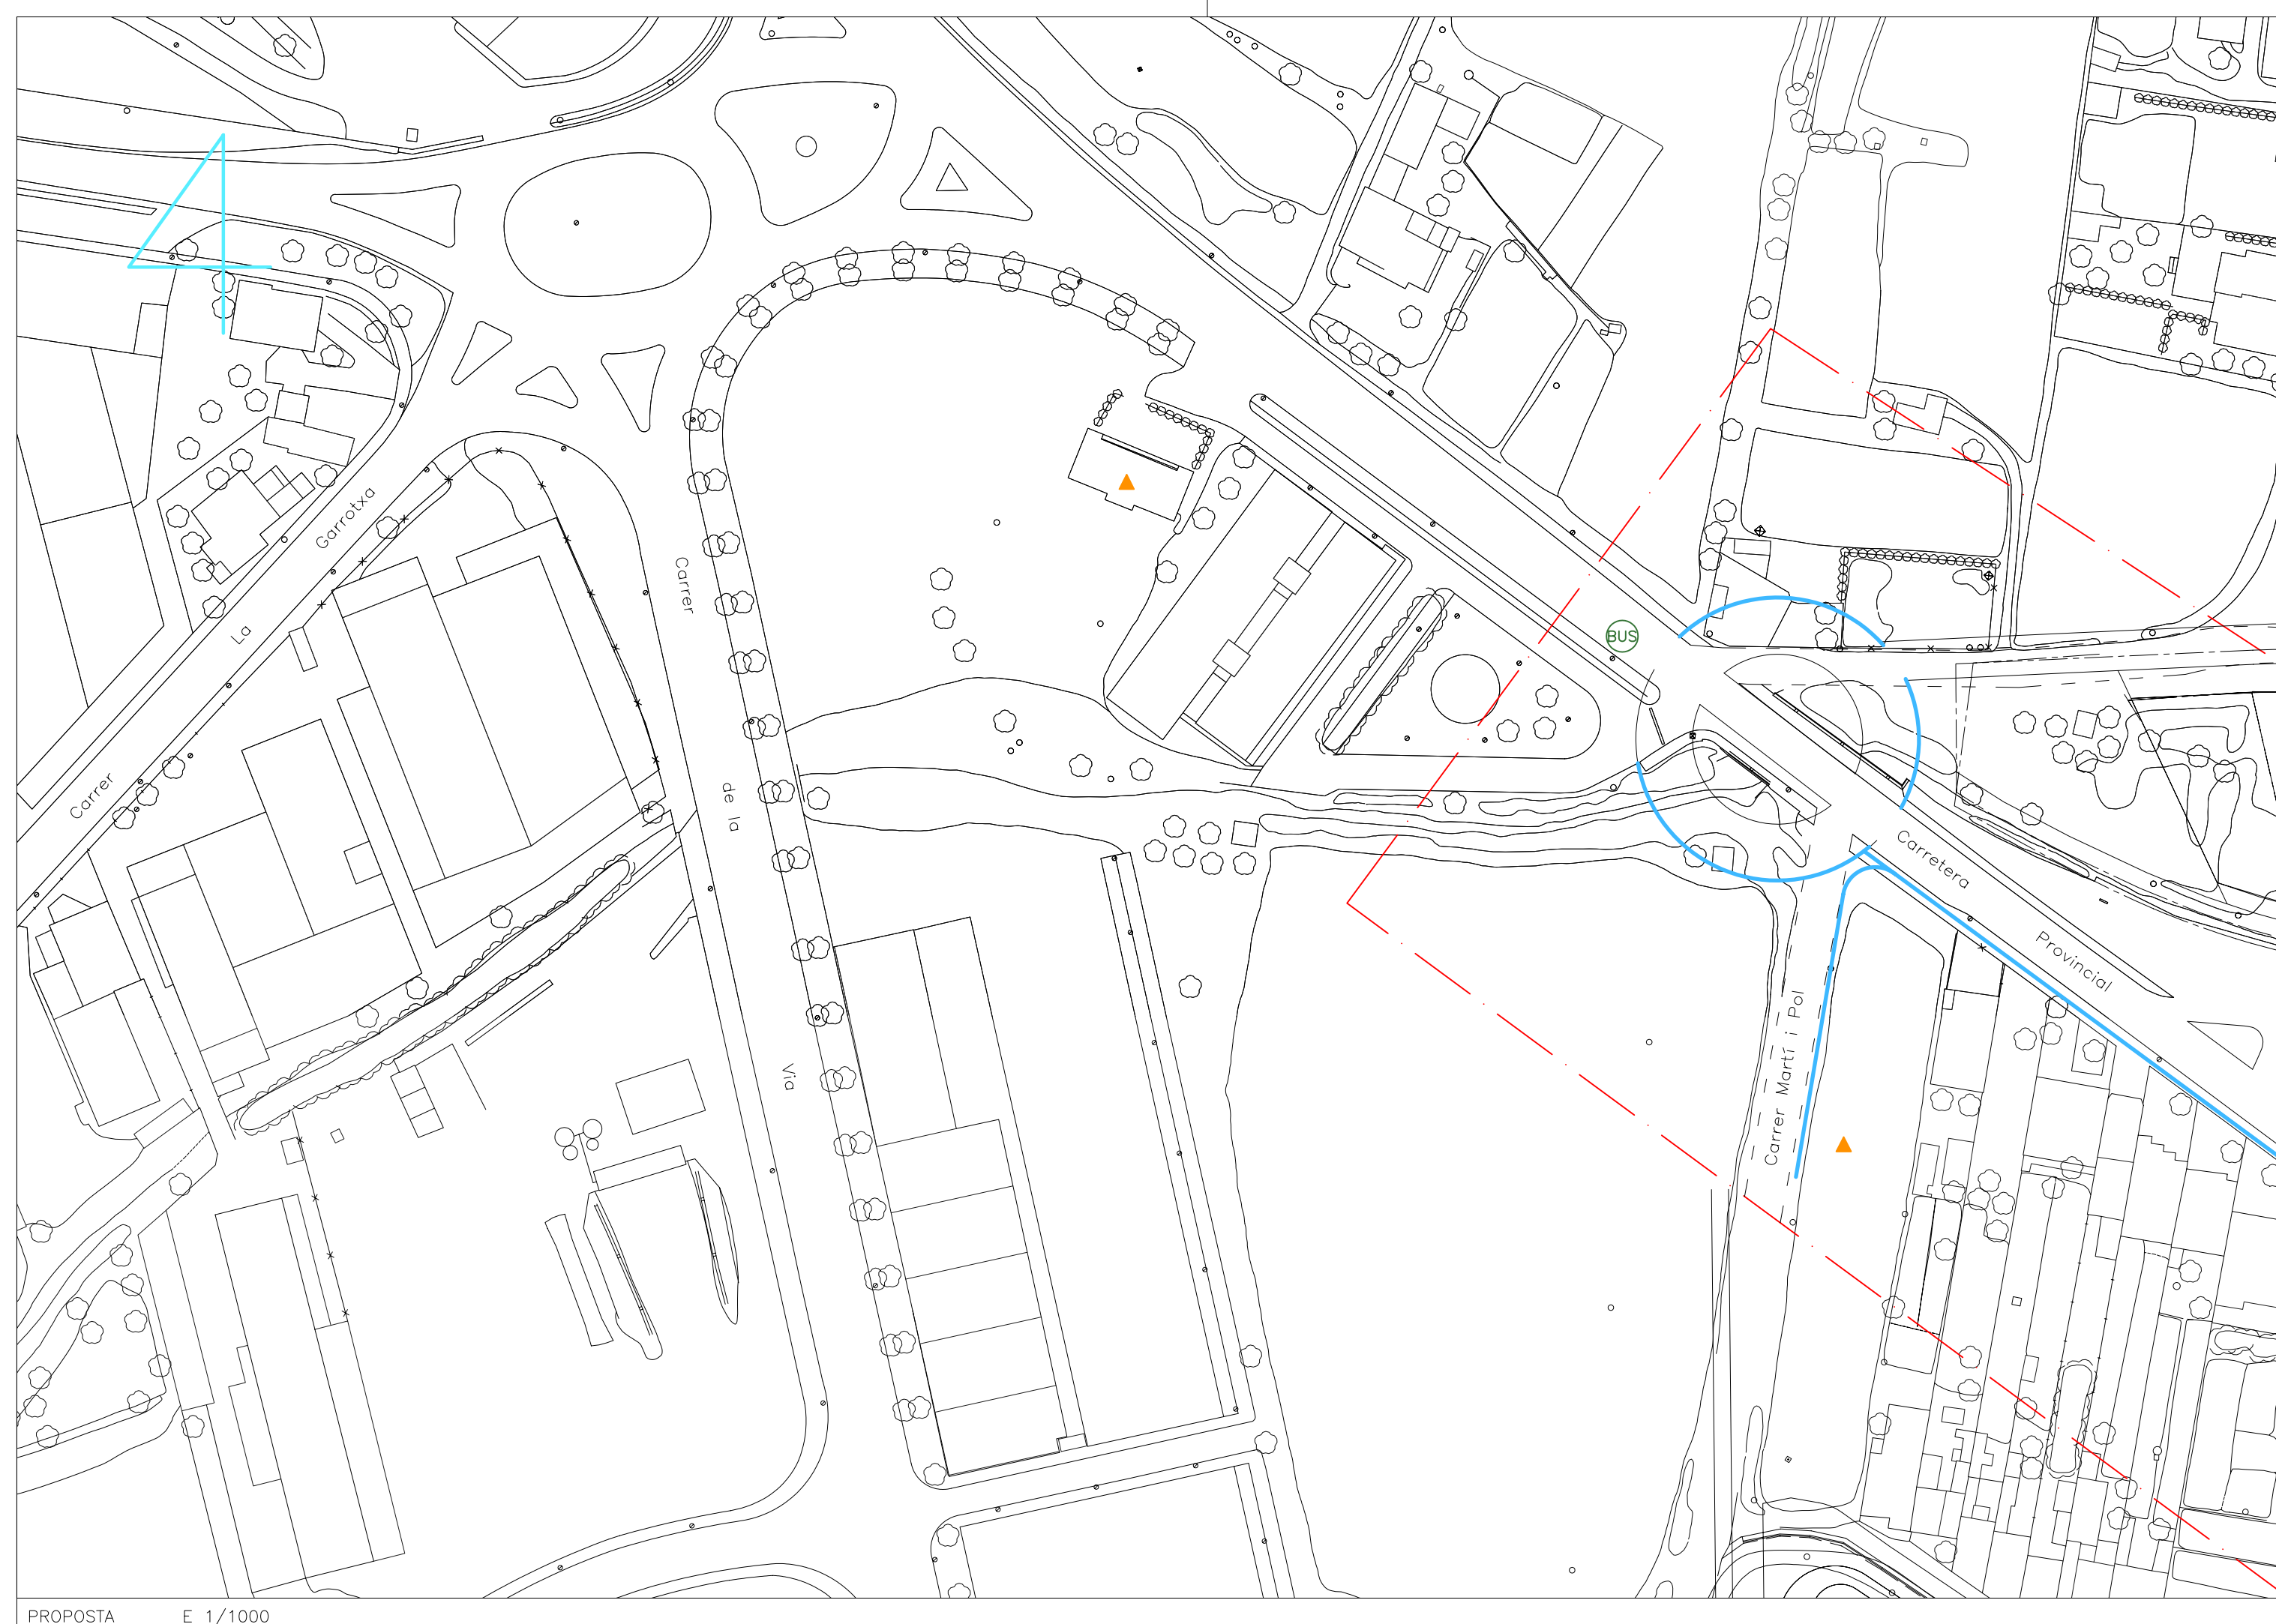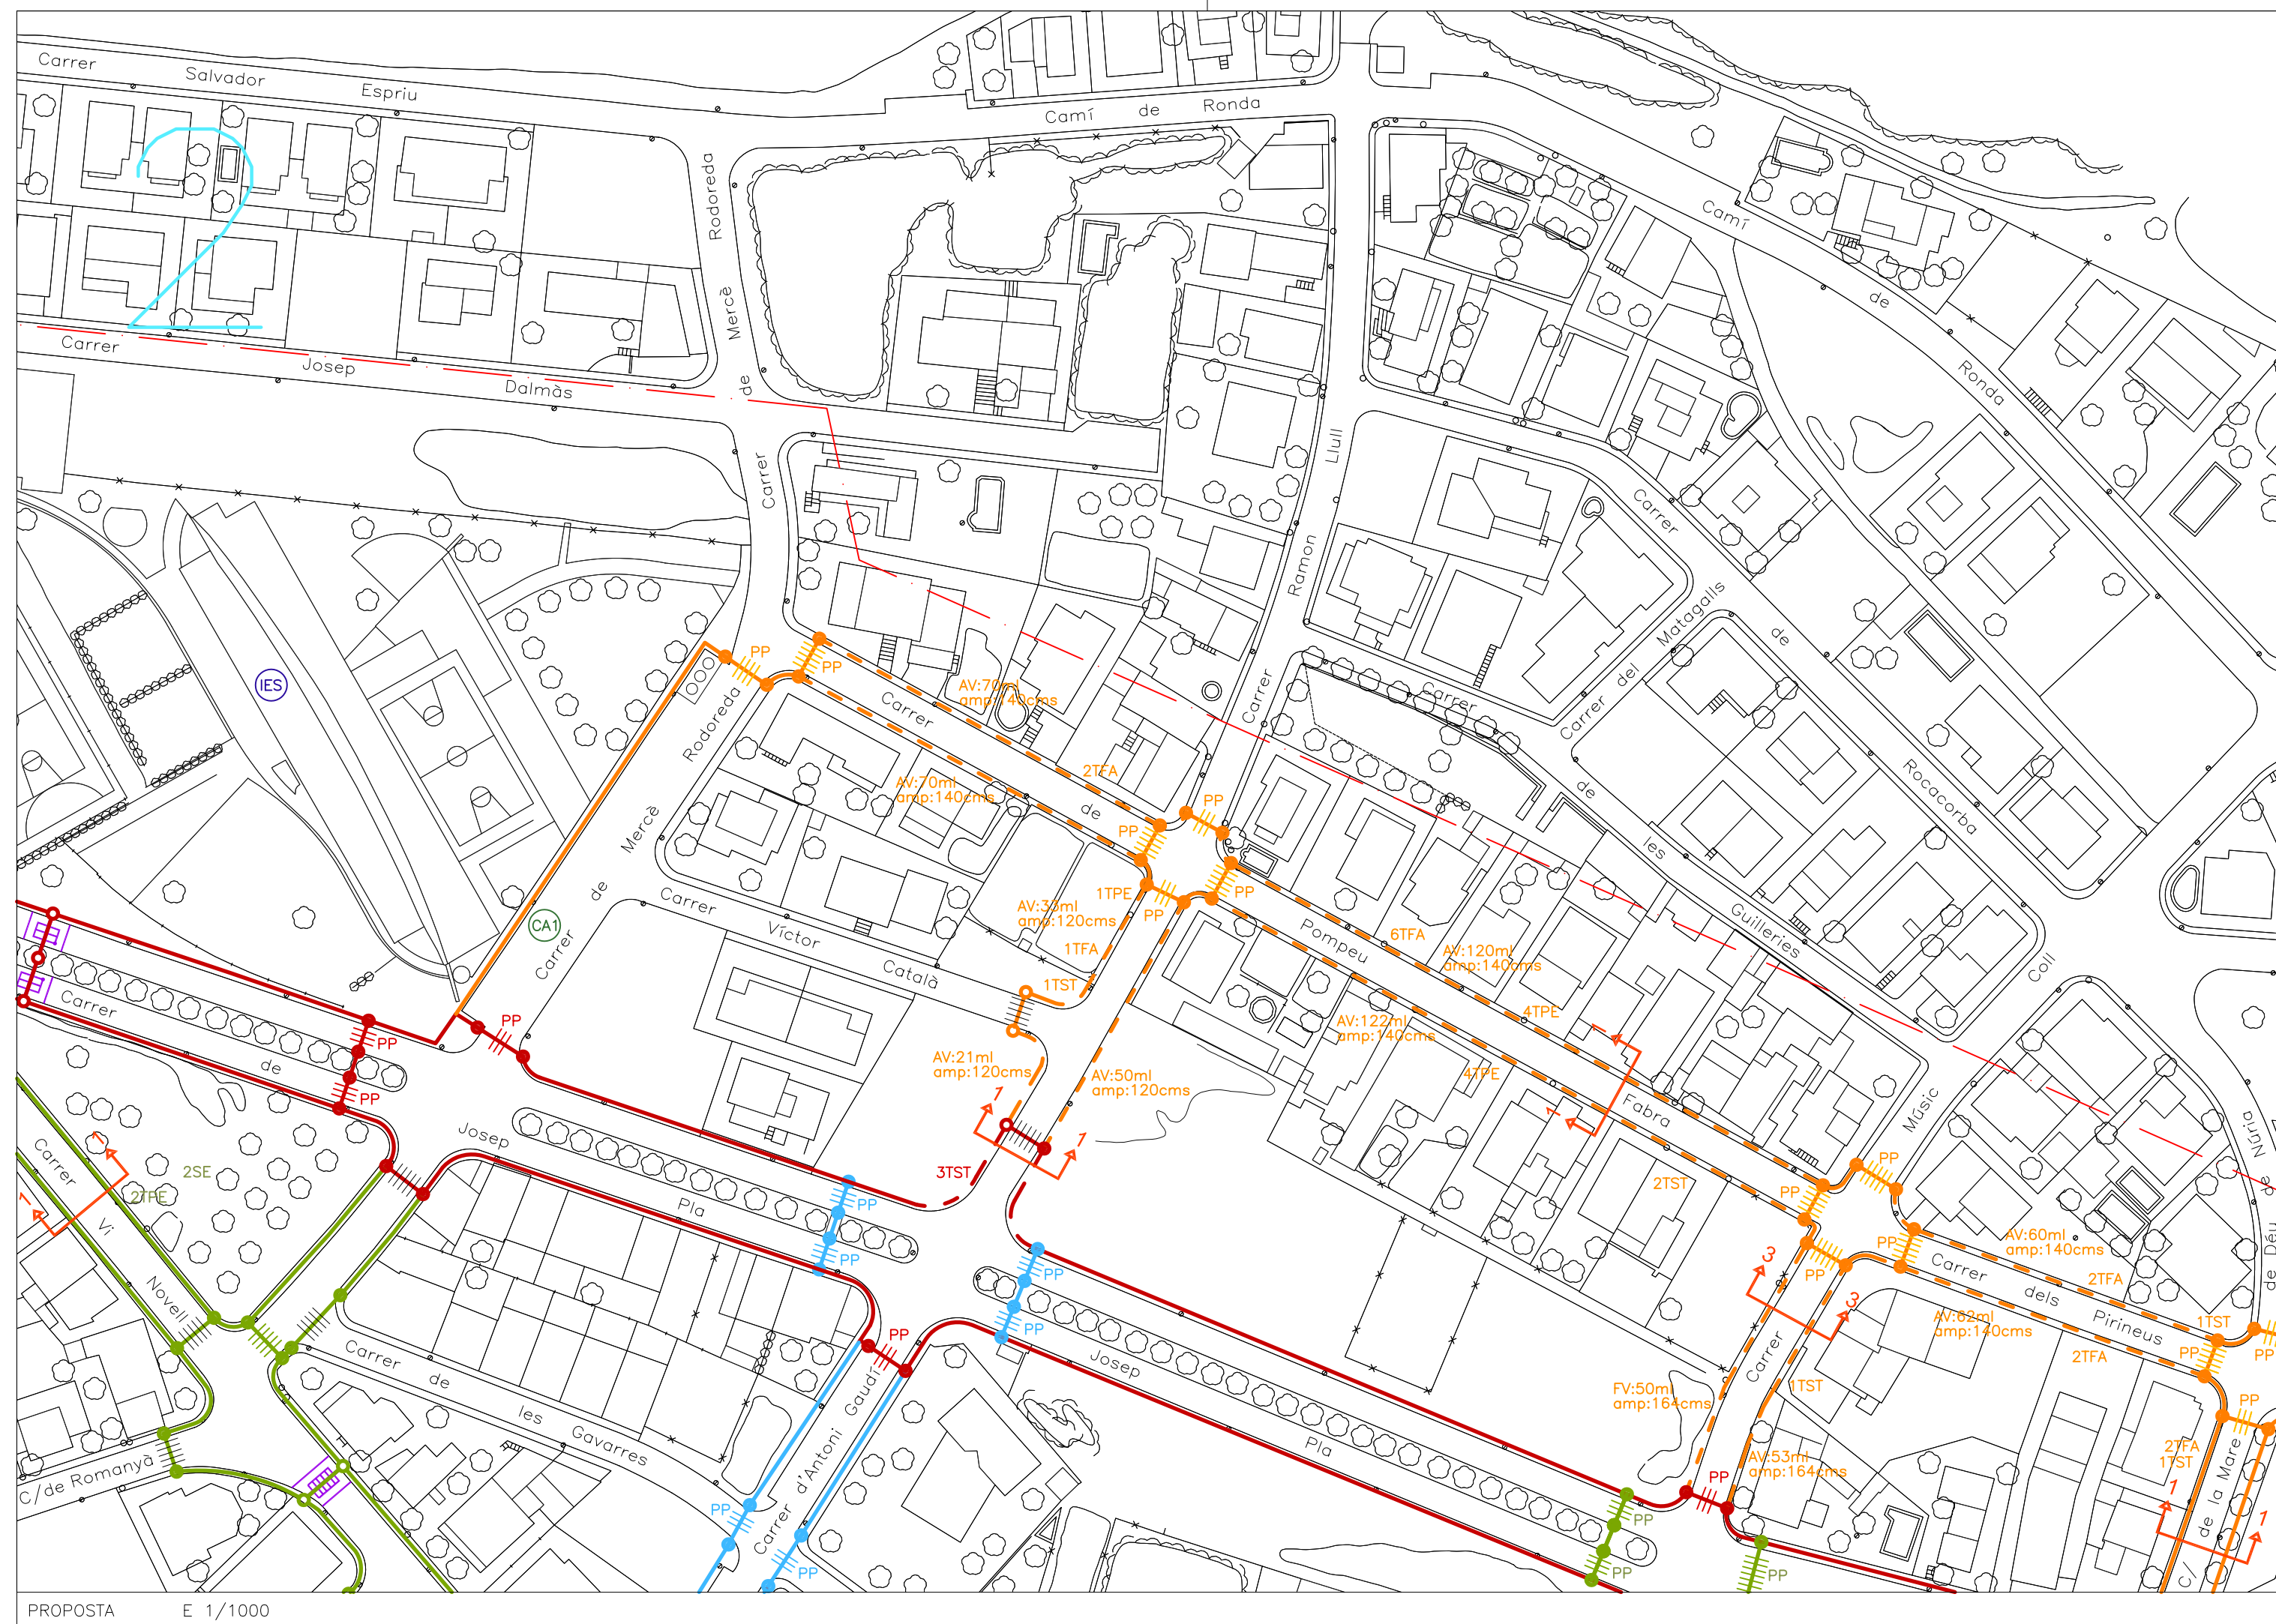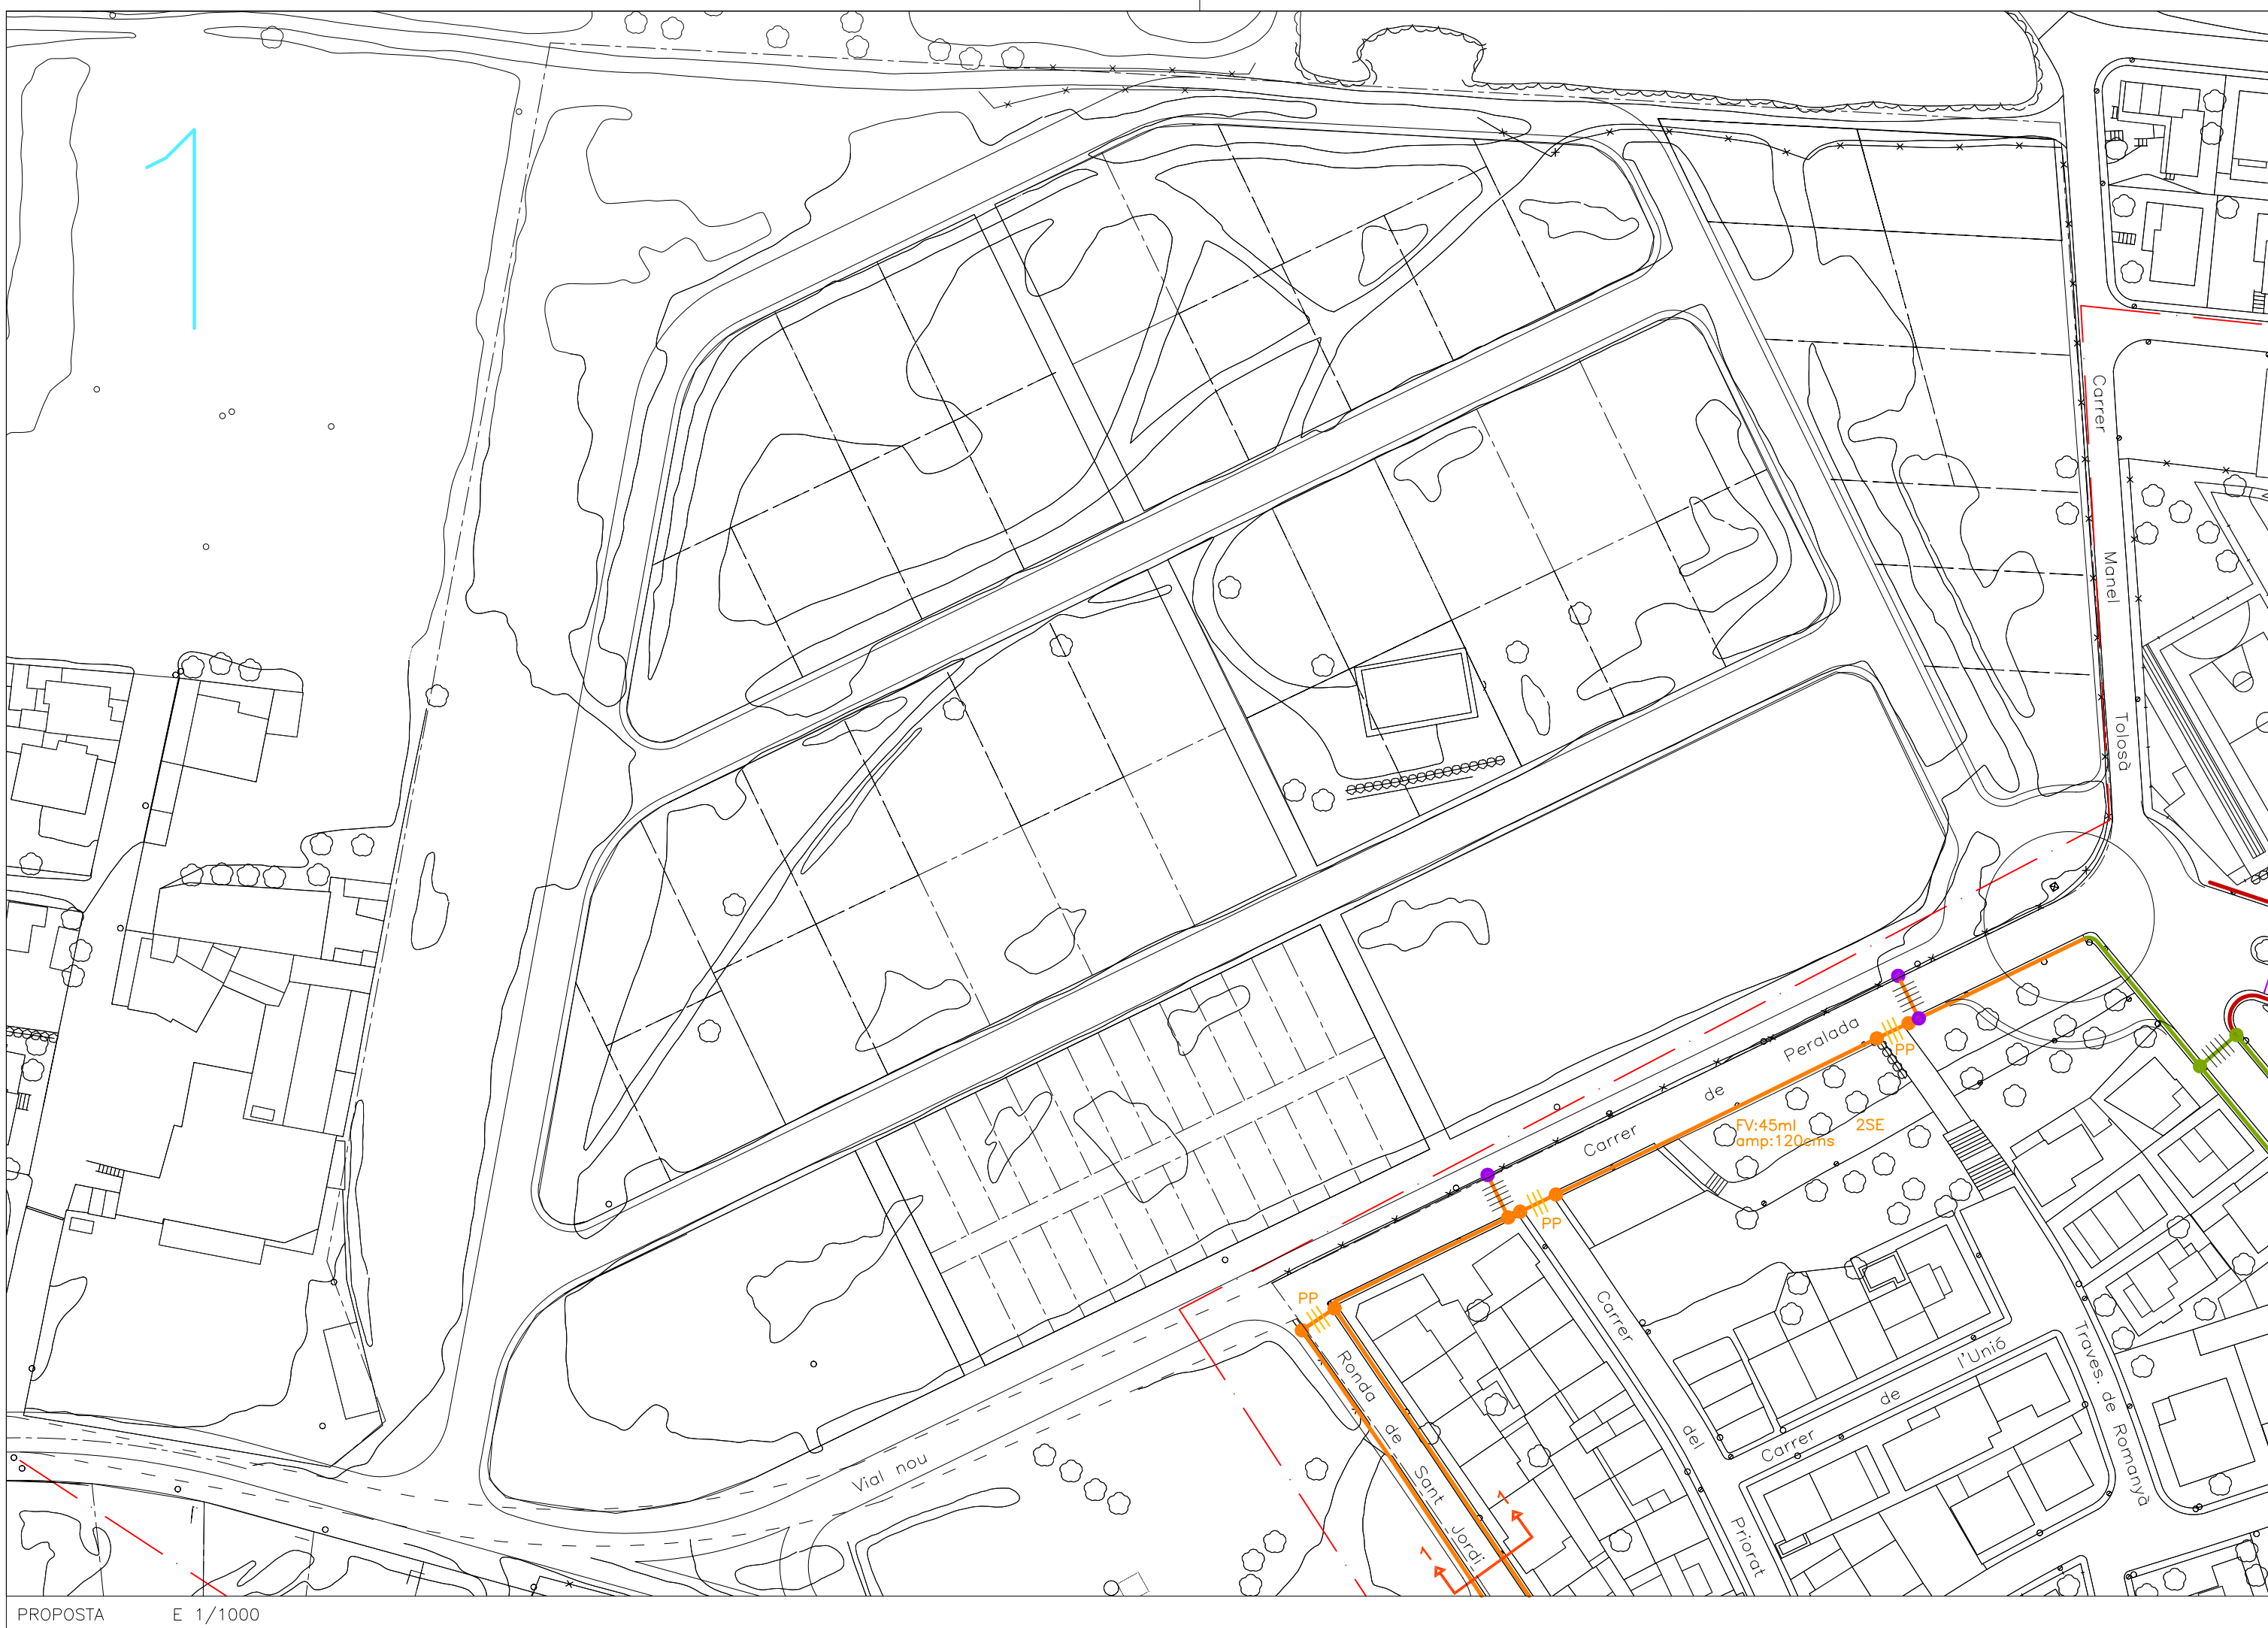



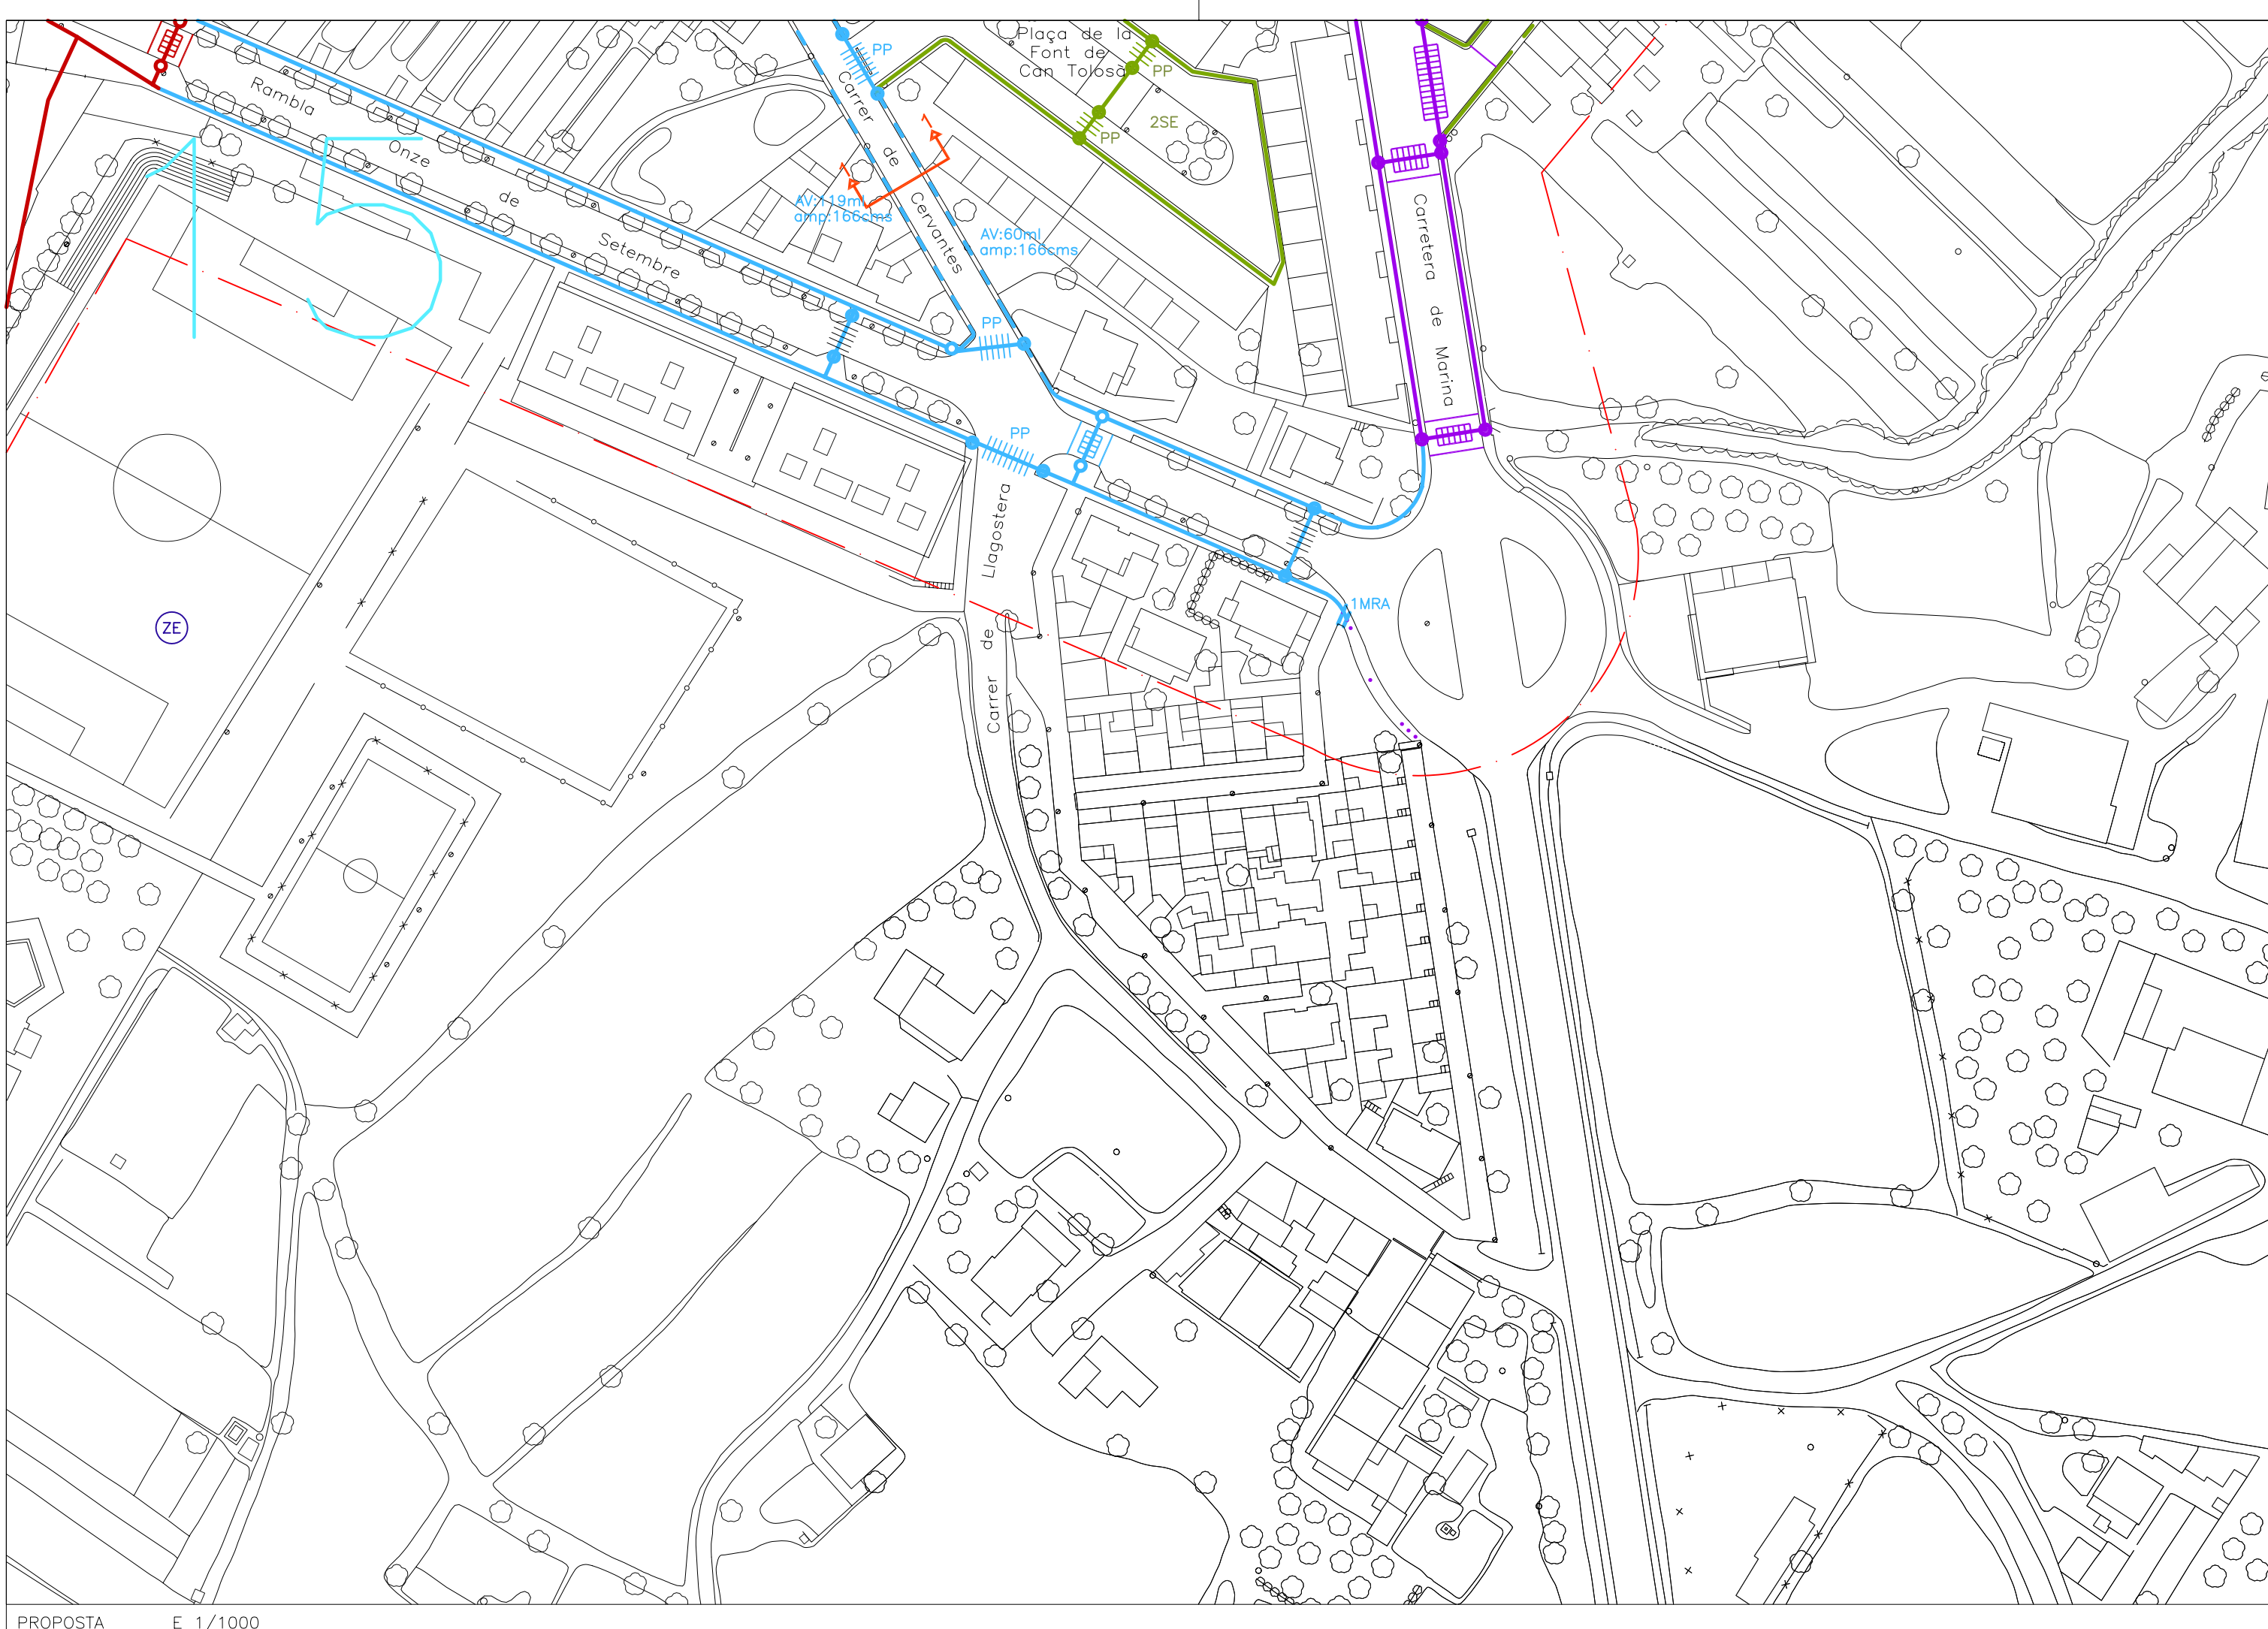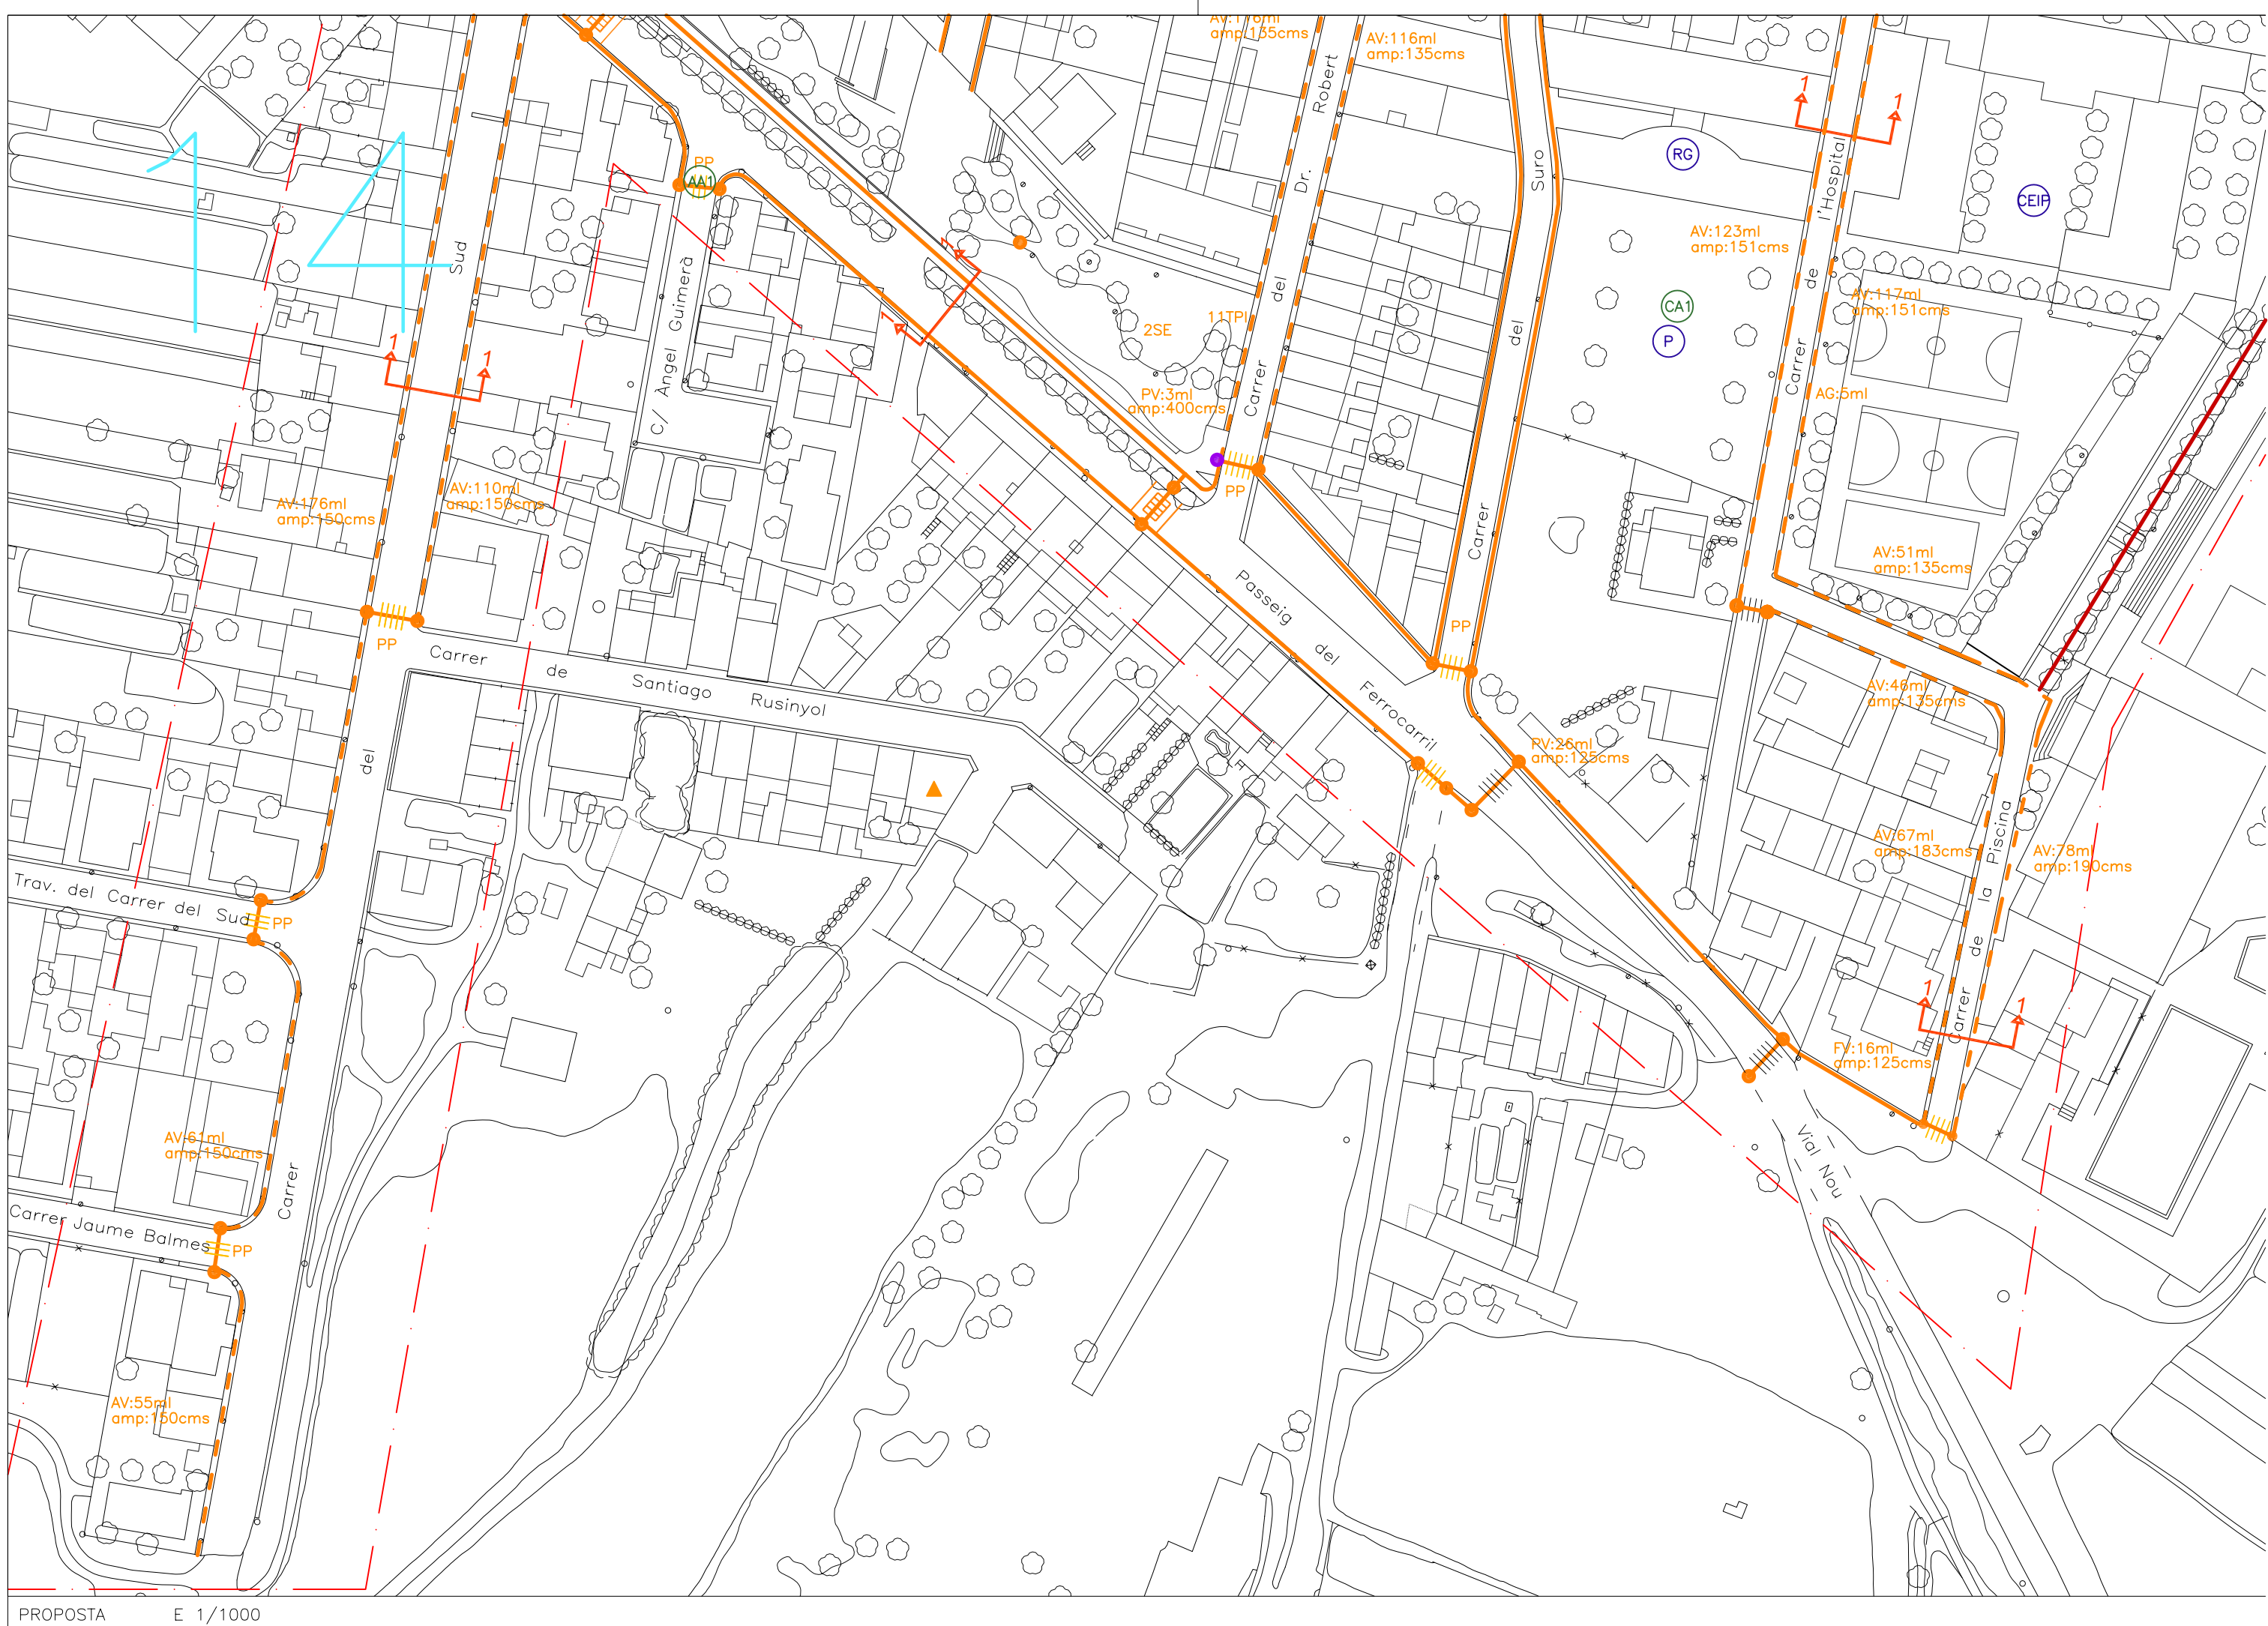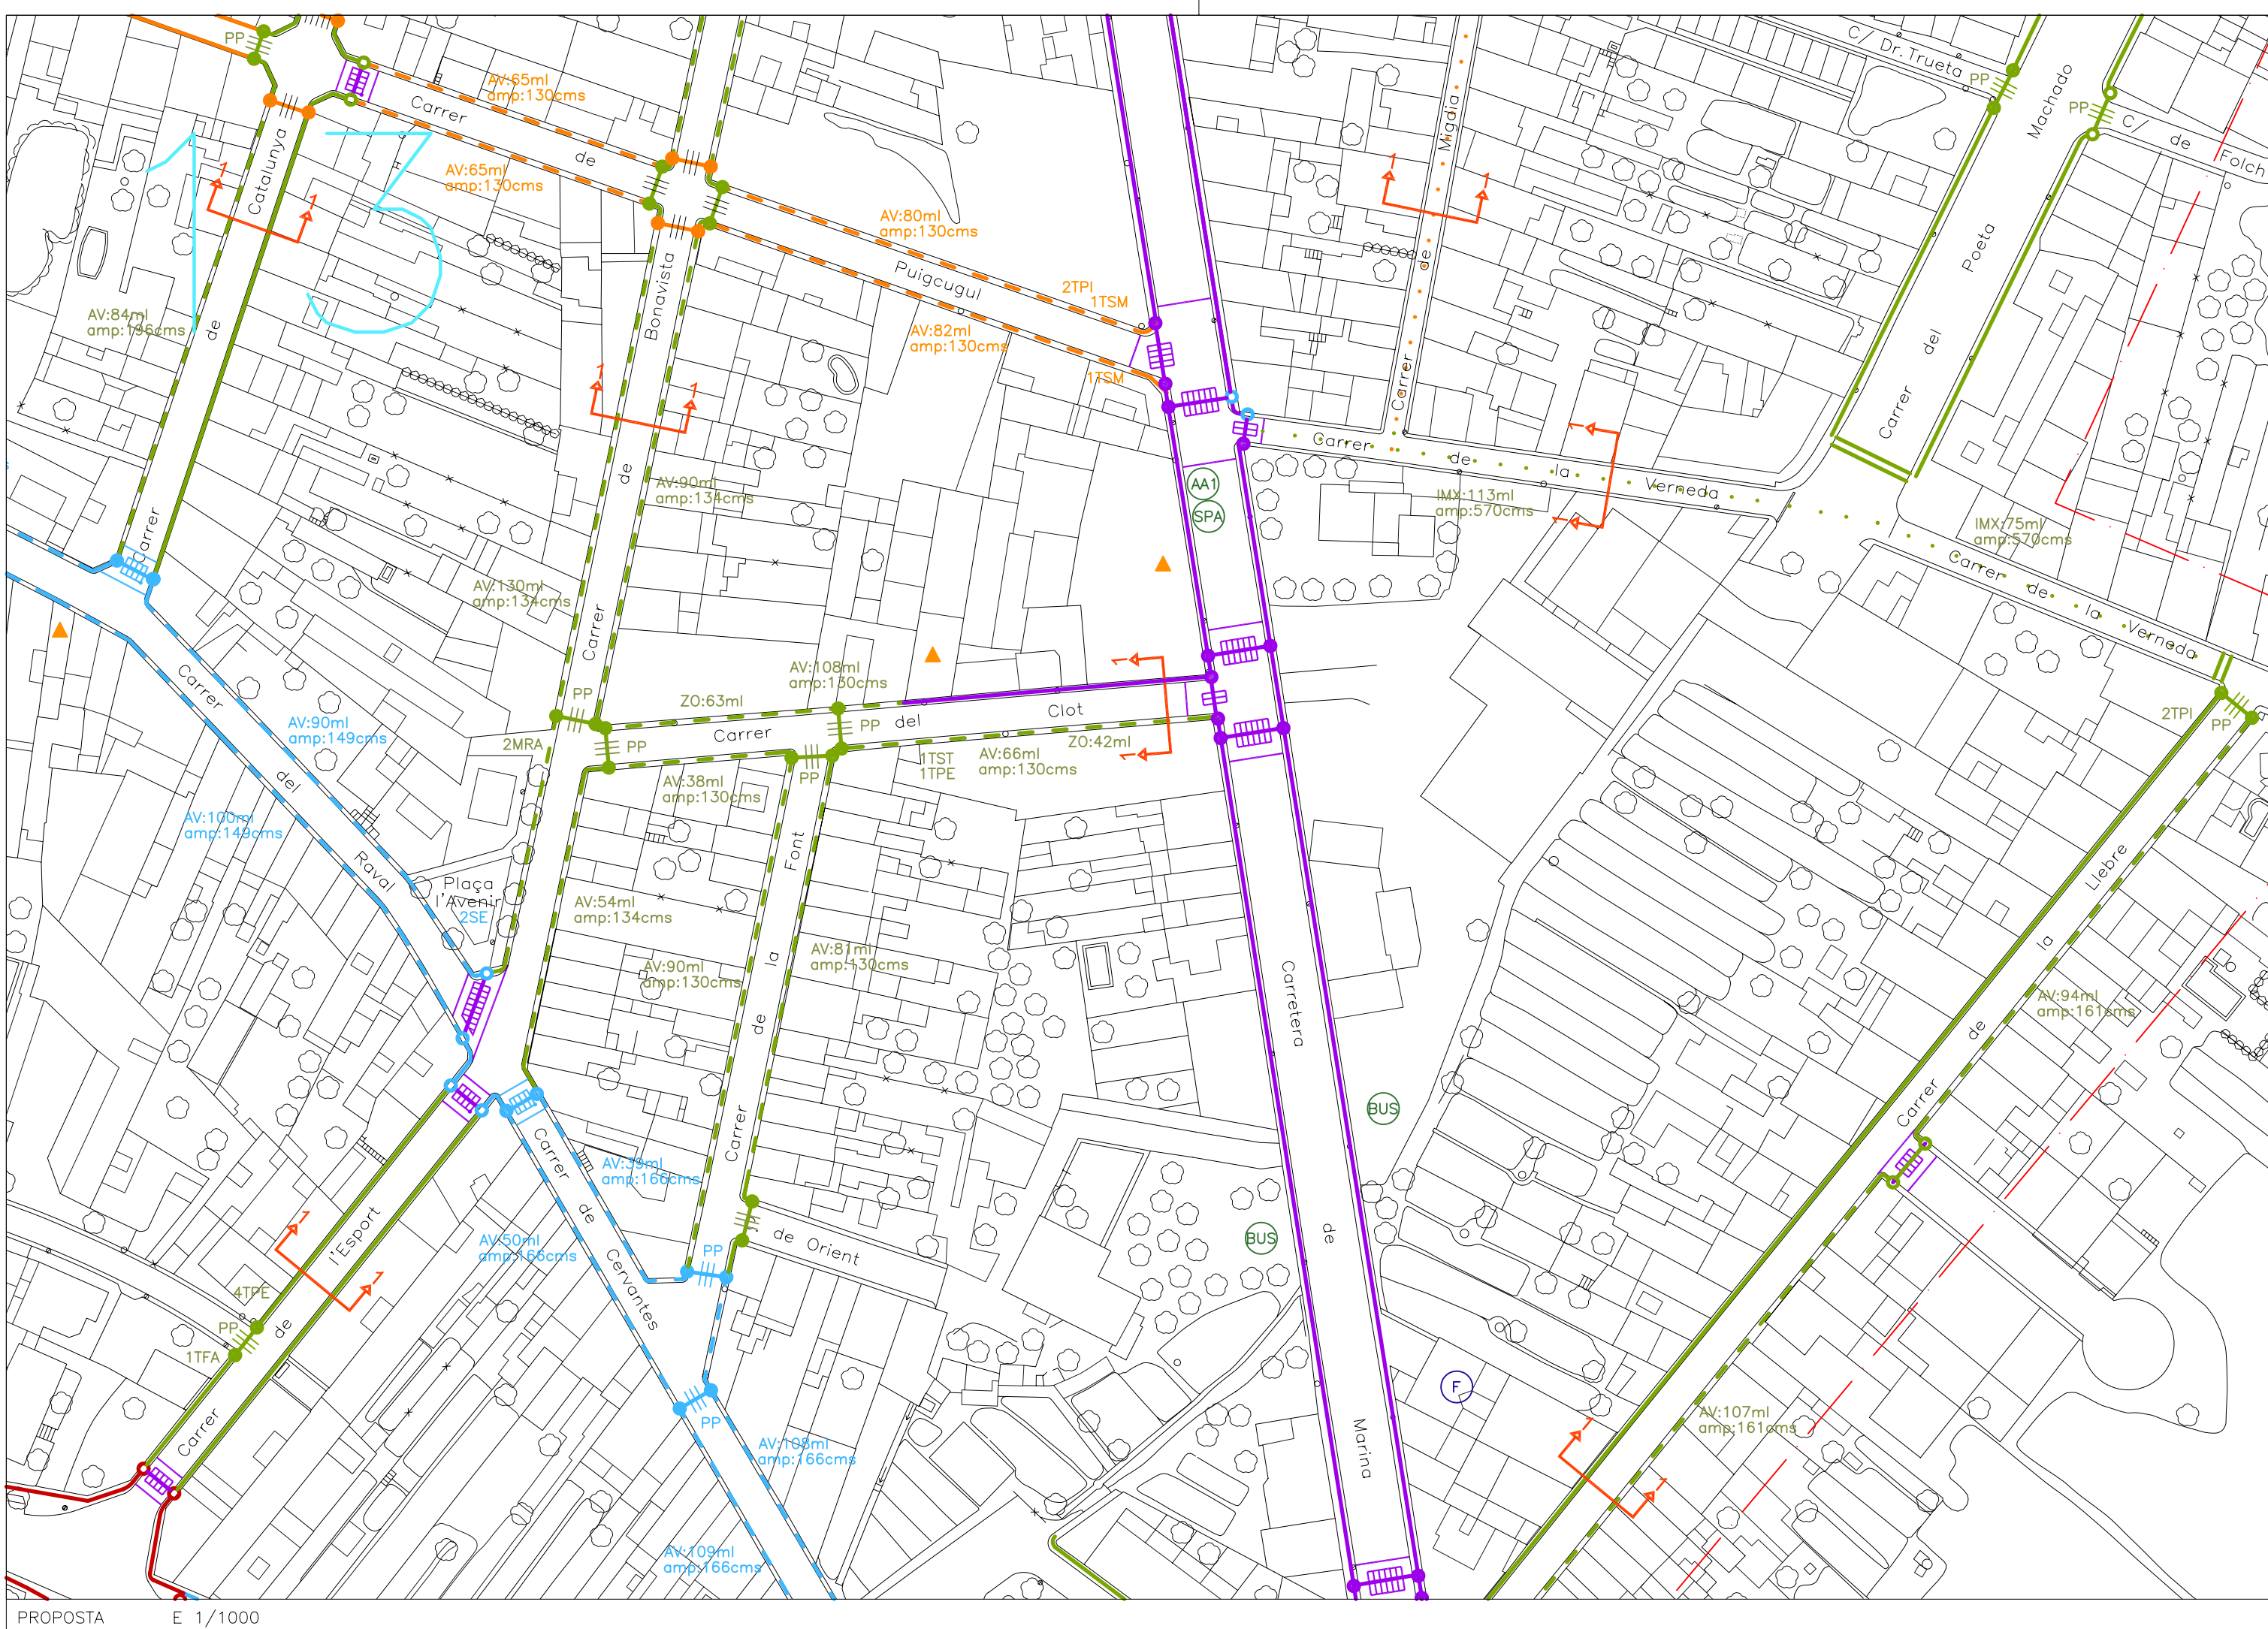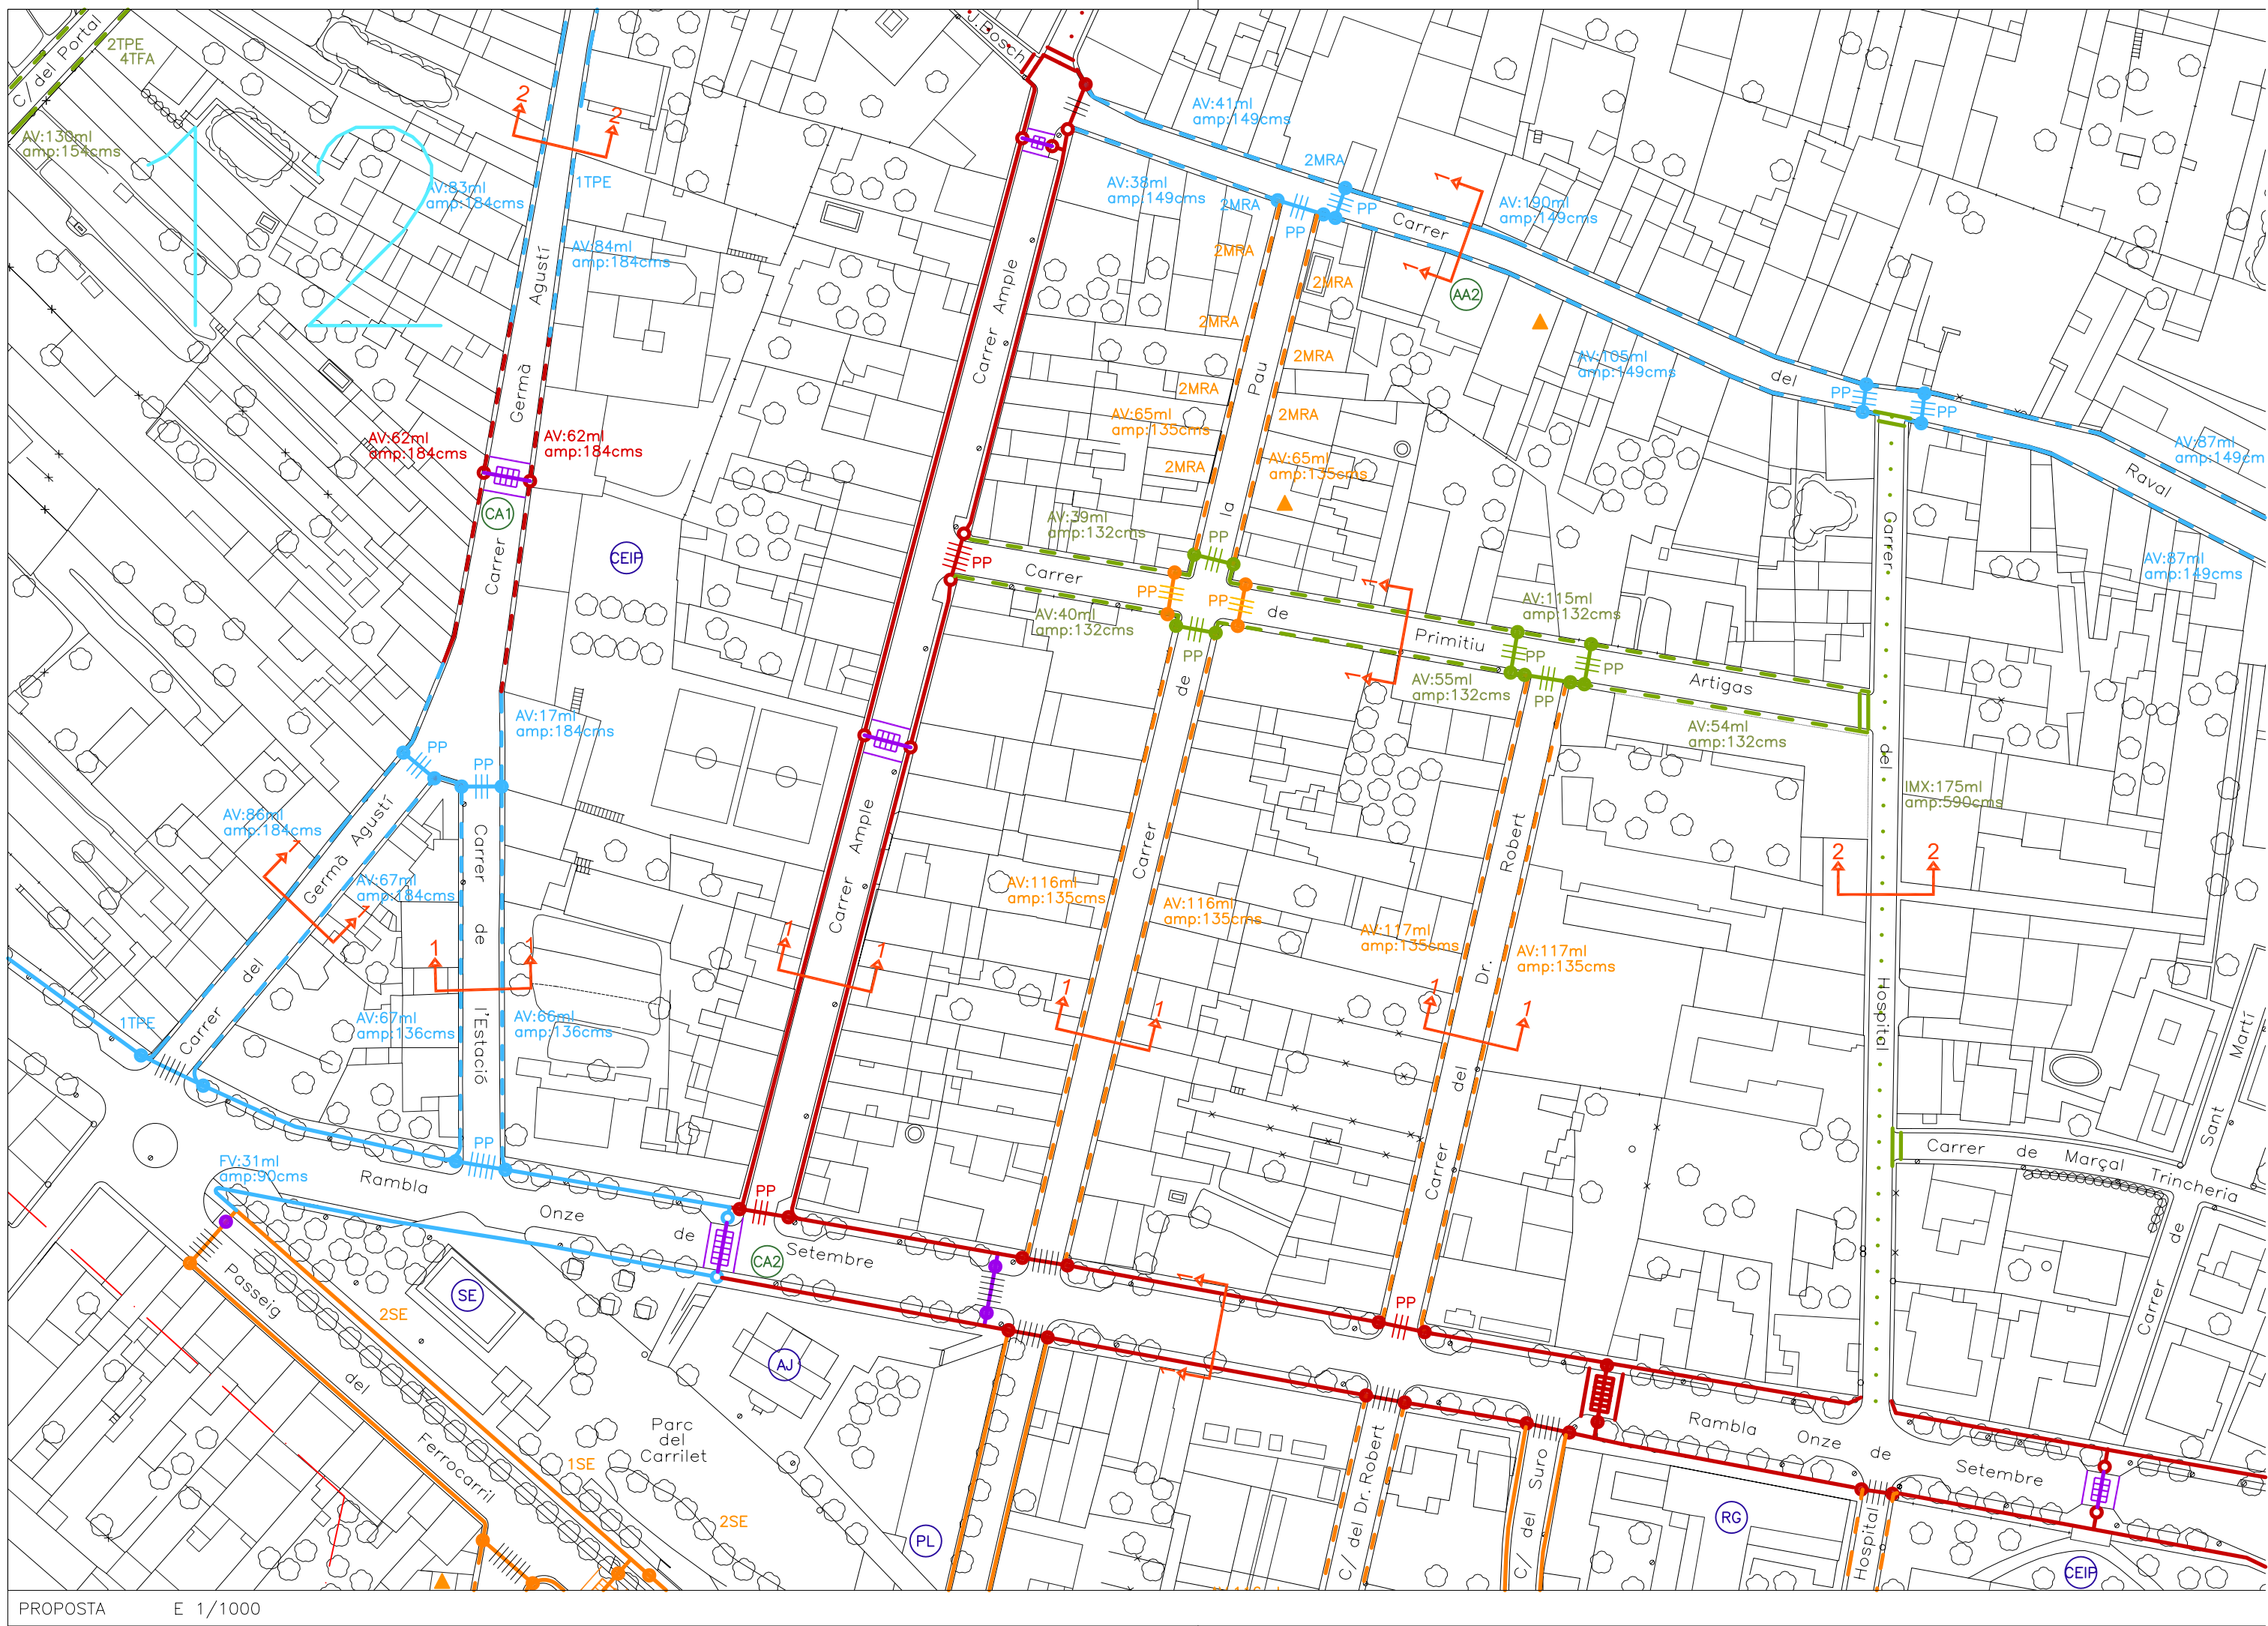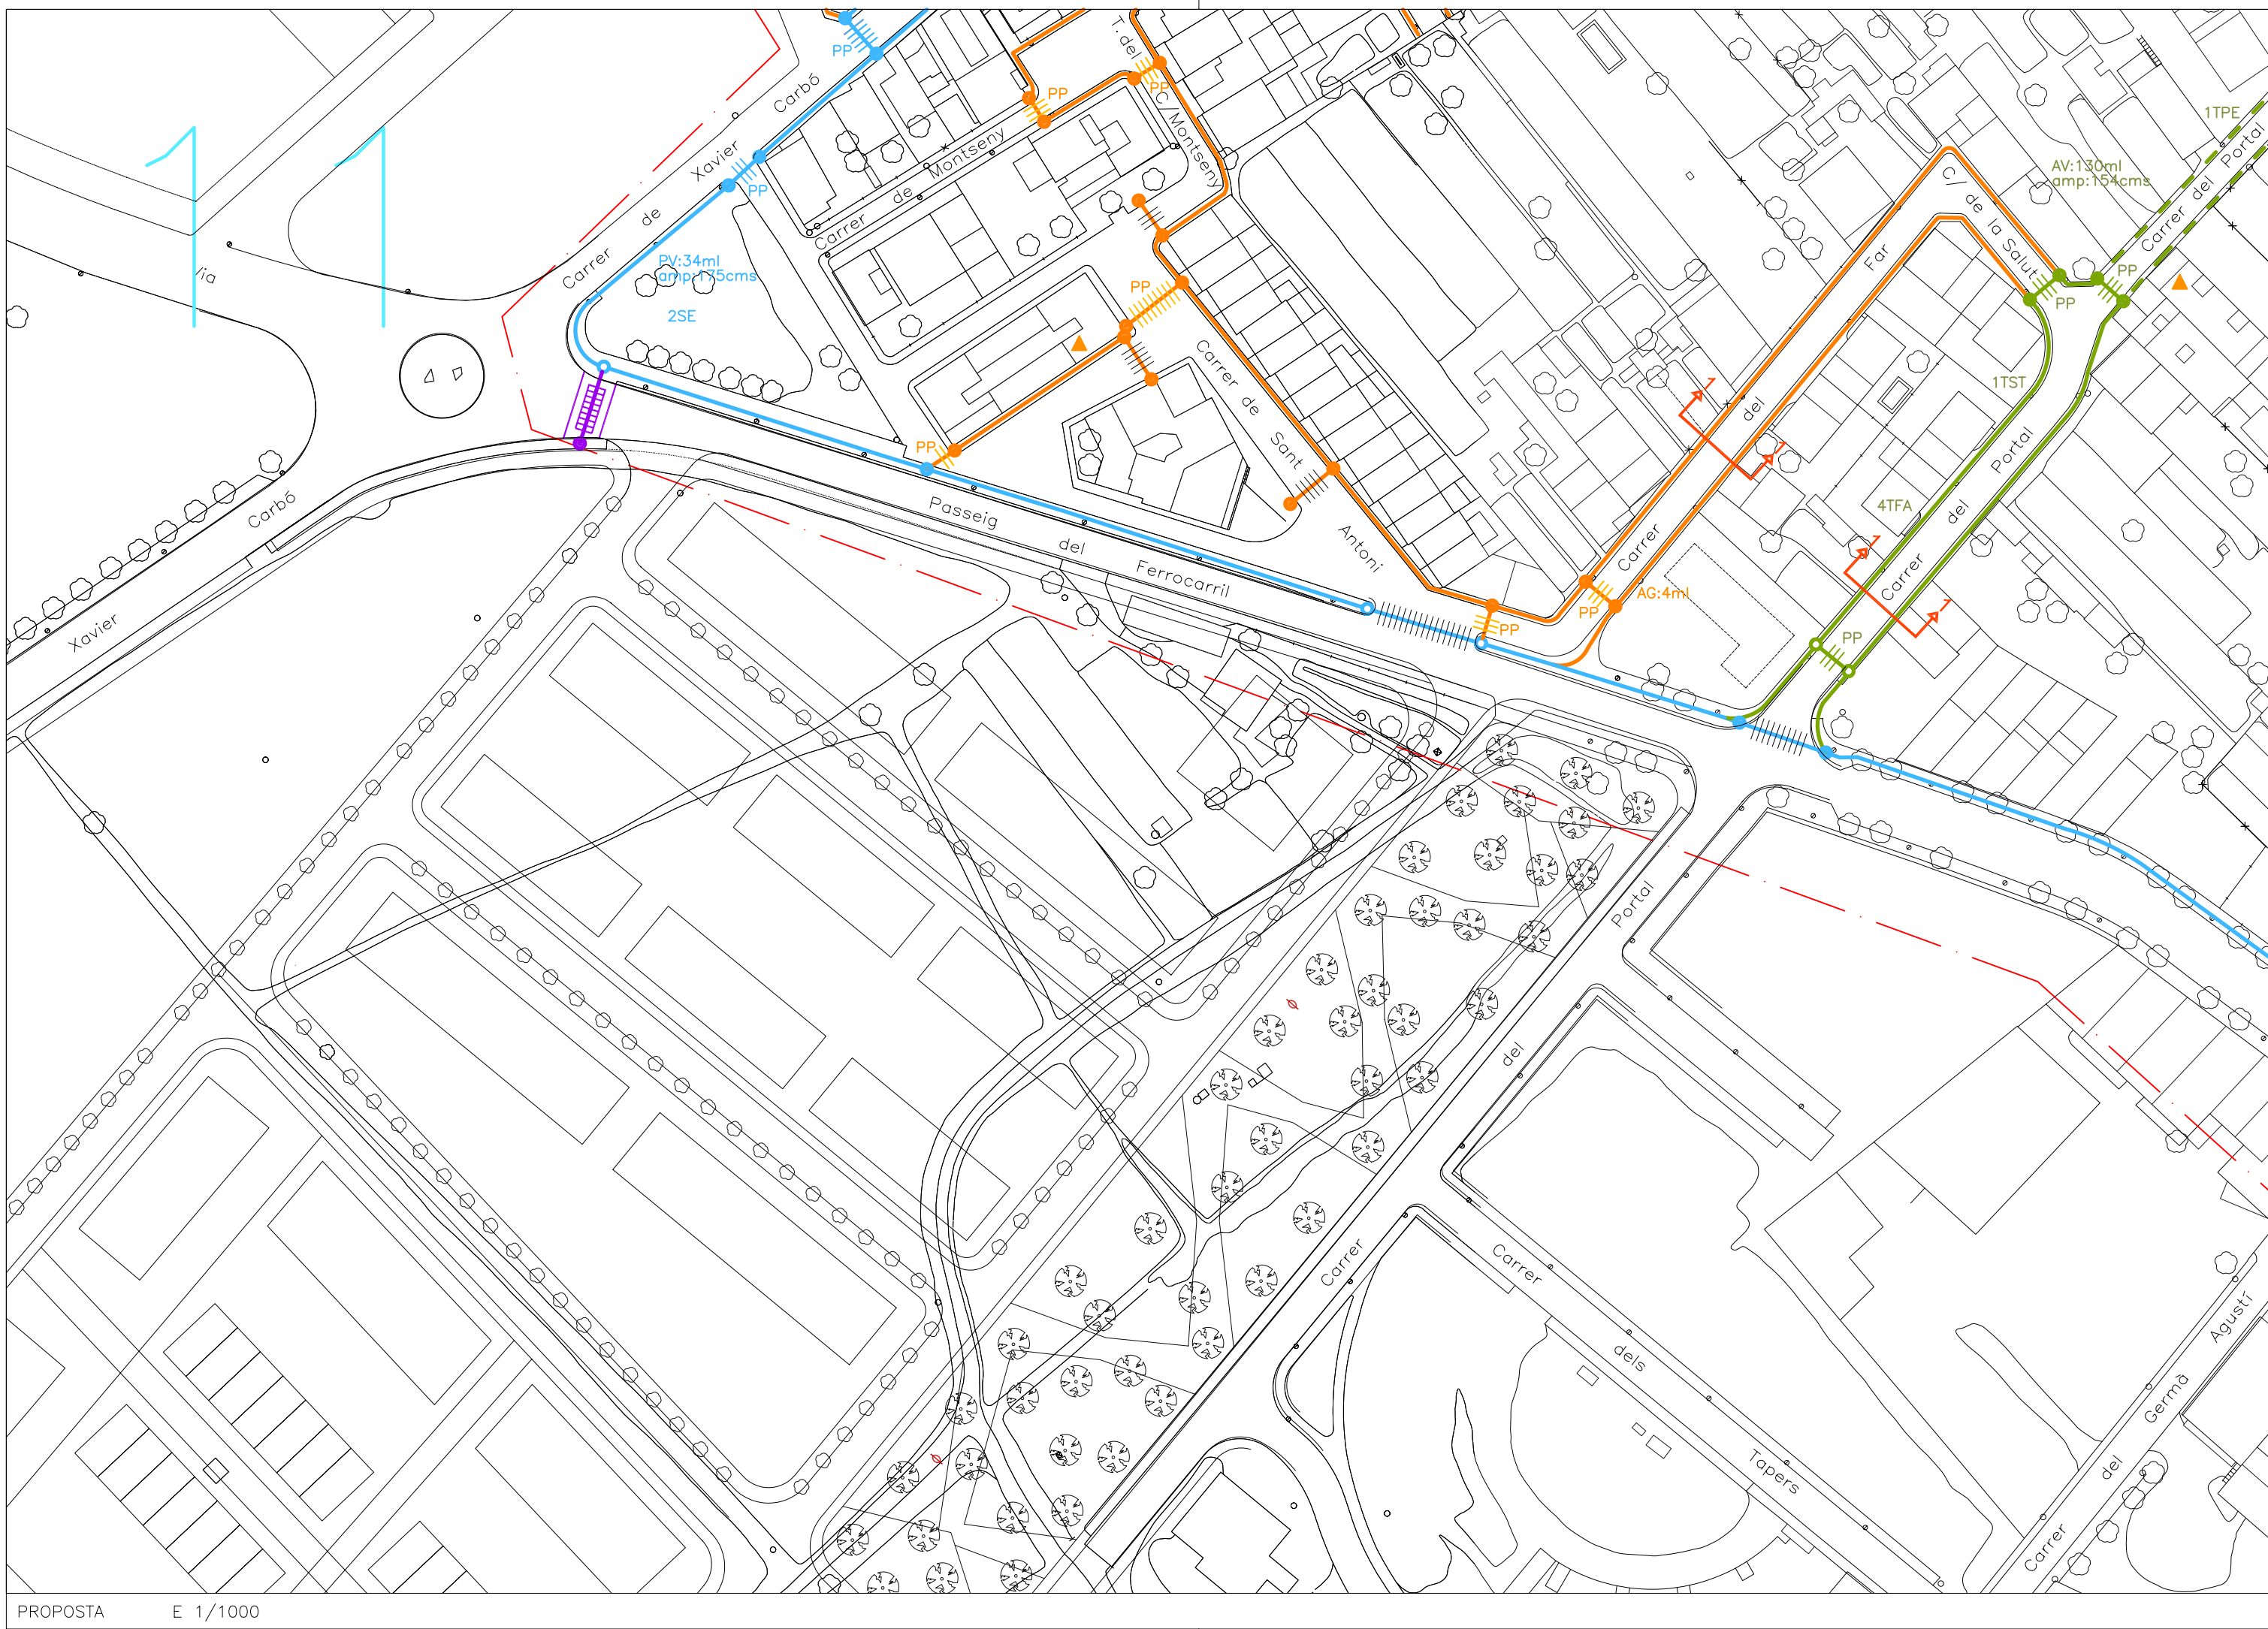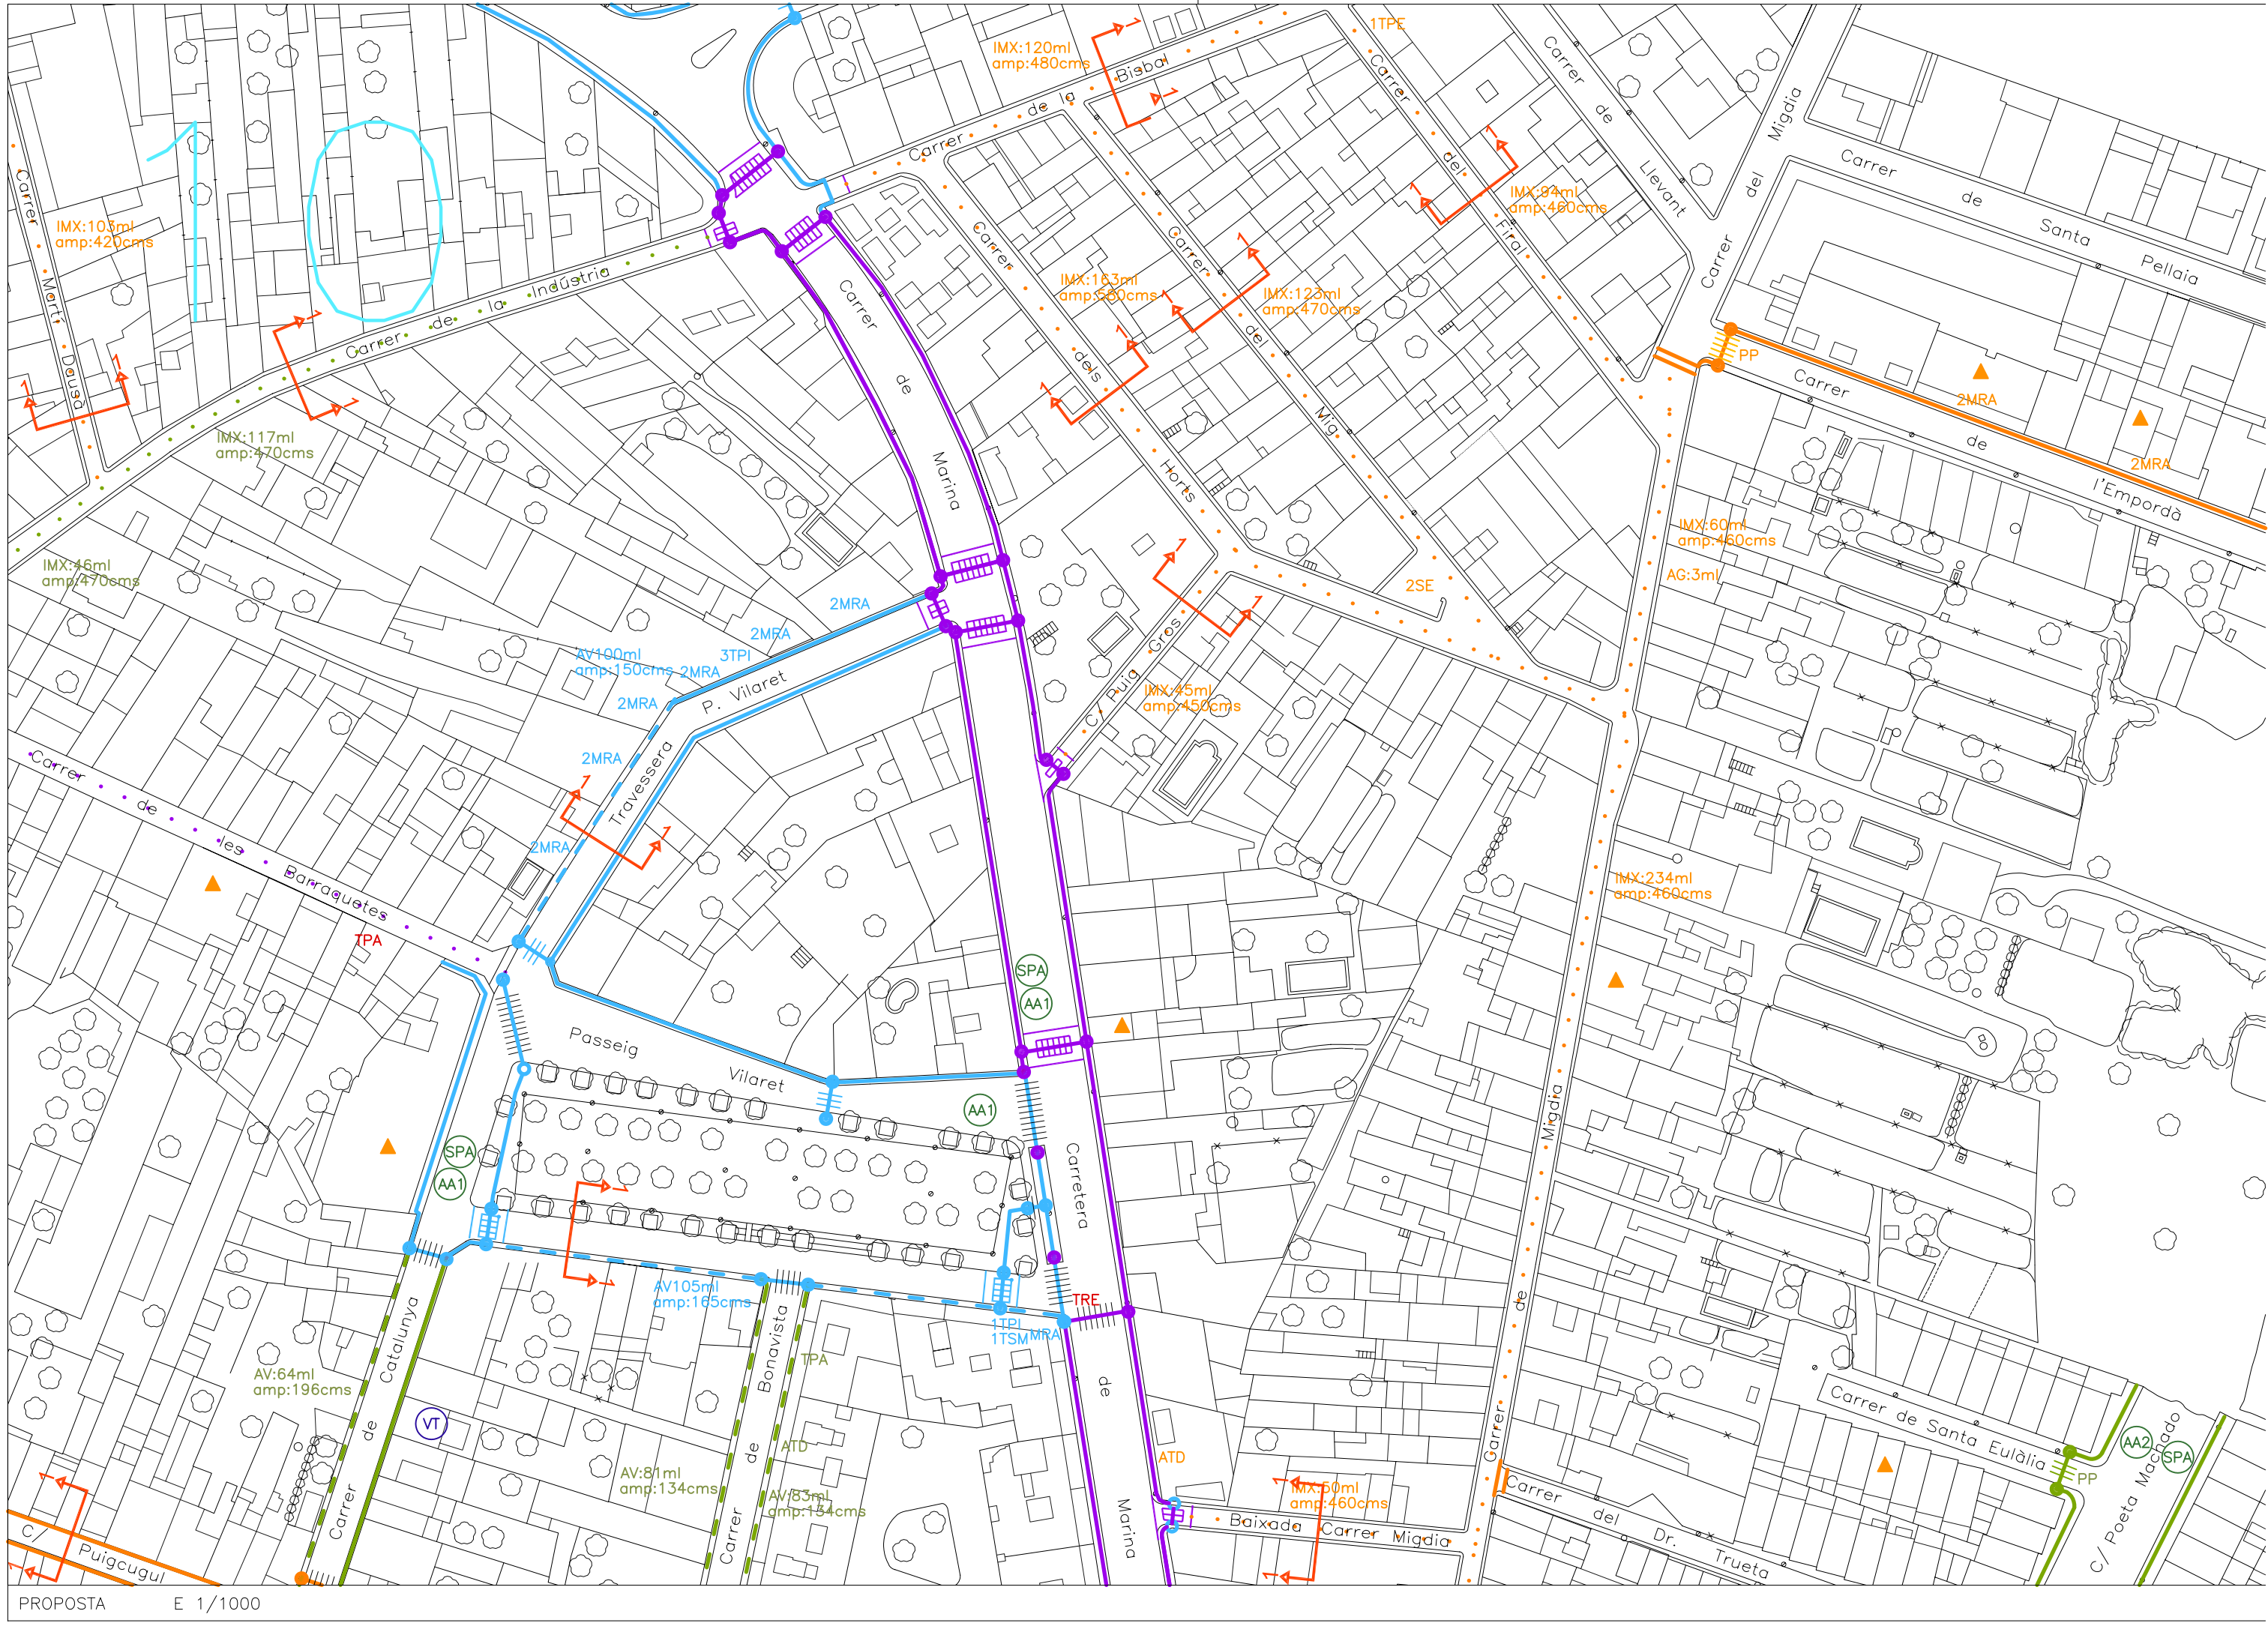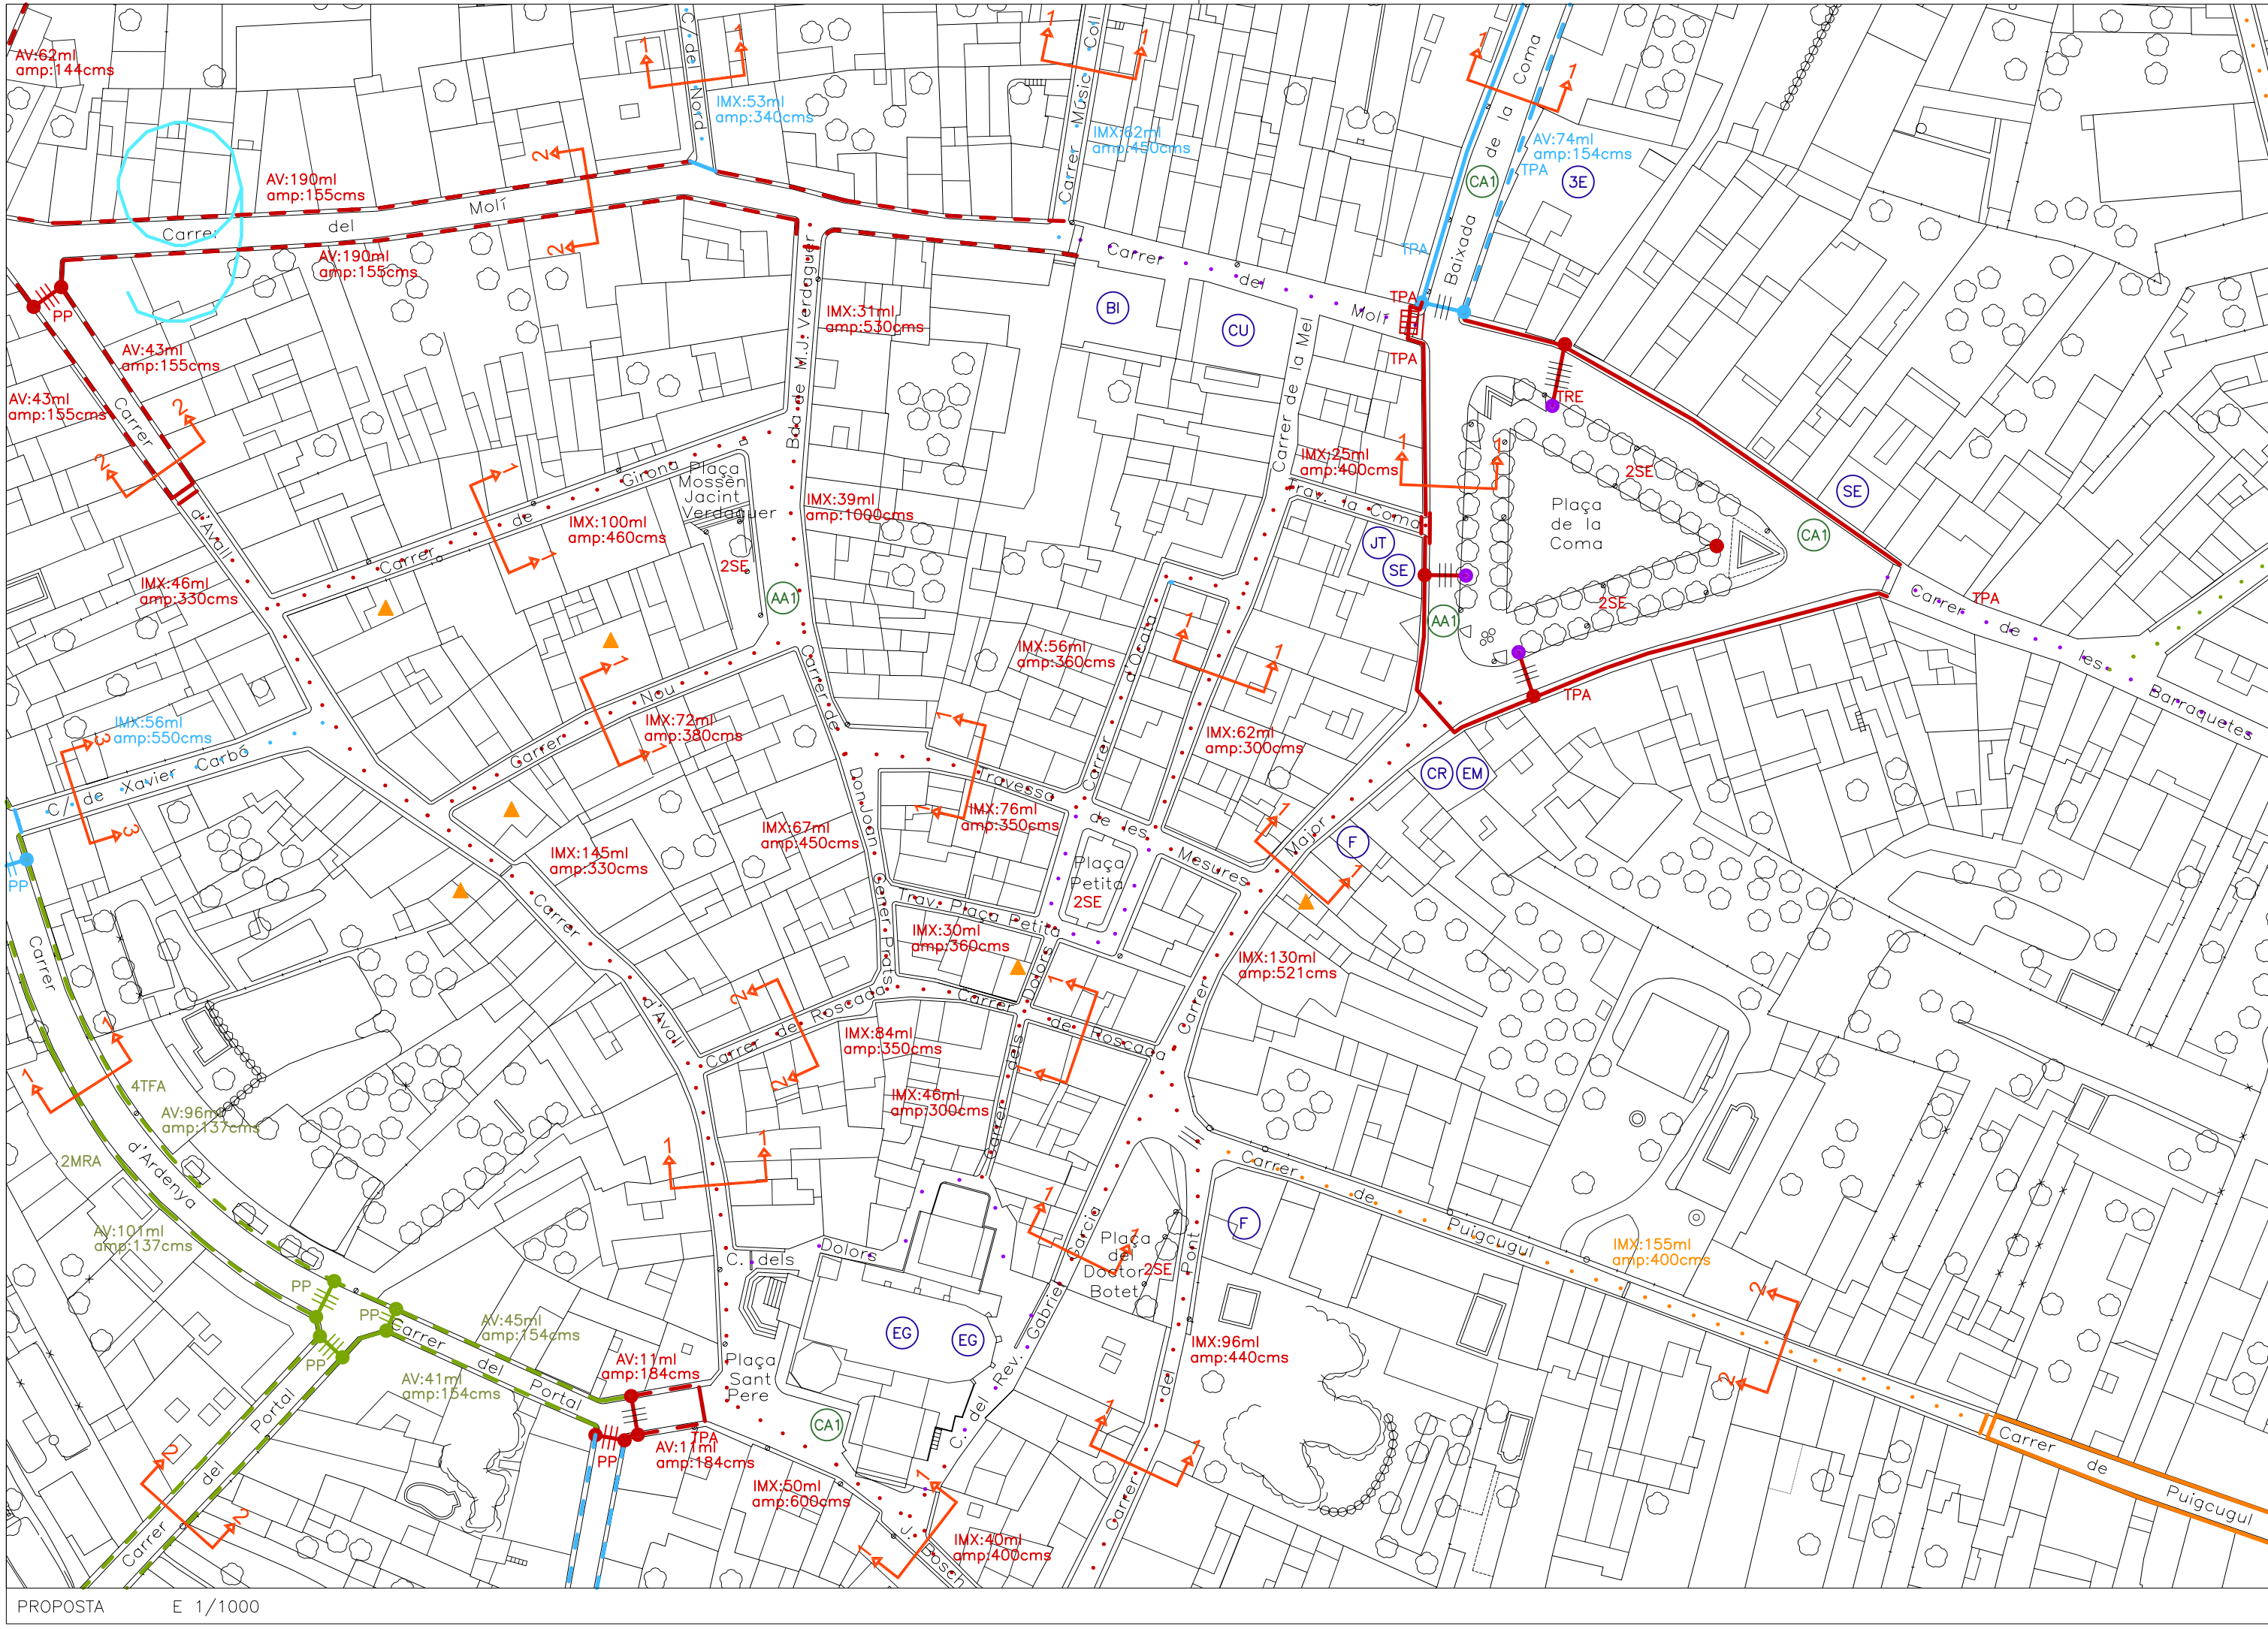








GUAL P-G / TIPUS PEDRA I PROFUNDITAT 1.35m.

LLEGENDA




- 1 Peça de pedra natural de 44.5x28x15  
Dues cares vistes abuixardades.  
Col.locada sobre solera de formigó.
  - 2 Peça de pedra natural de 44.5x28x15  
Tres cares vistes abuixardades.  
La part superior rebaixada.  
Col.locada sobre solera de formigó.
  - 3 Vorada de pedra natural.
  - 4 Rigola de formigó.
  - 5 Panots de 60x40x3.5 cm amb acabat de pedra abuixardada col.locada sobre solera de formigó. Les peces que formen la rampa del gual, hauran d'entregar-se enrasades amb la calçada i la vorera.
  - 6 Peça de pedra natural de 14x8 cm col.locada sobre solera de formigó formant el pendent.
  - 7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amplada=100 cm i Longitud = Fins a la façana de de l'edifici o 5.0 m. Col.locada perpendicular al pas de vianants
  - 8 Reixa d'embornal, la direcció de les franges serà paral.lela a la vorada.
  - 9 Paviment existent.
  - 10 Calçada d'asfalt.
- D= Desnivell de la vorera respecte la calçada  
P= Pendent del gual de vianants.  
S= Semàfor.

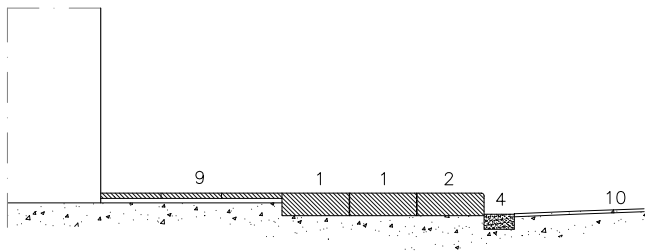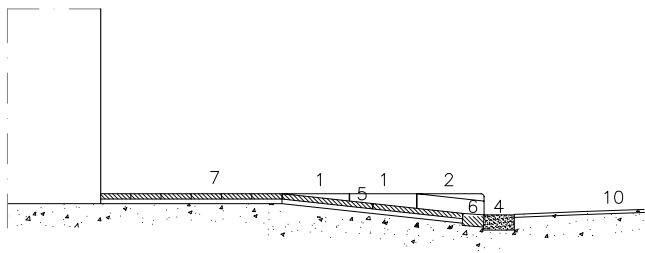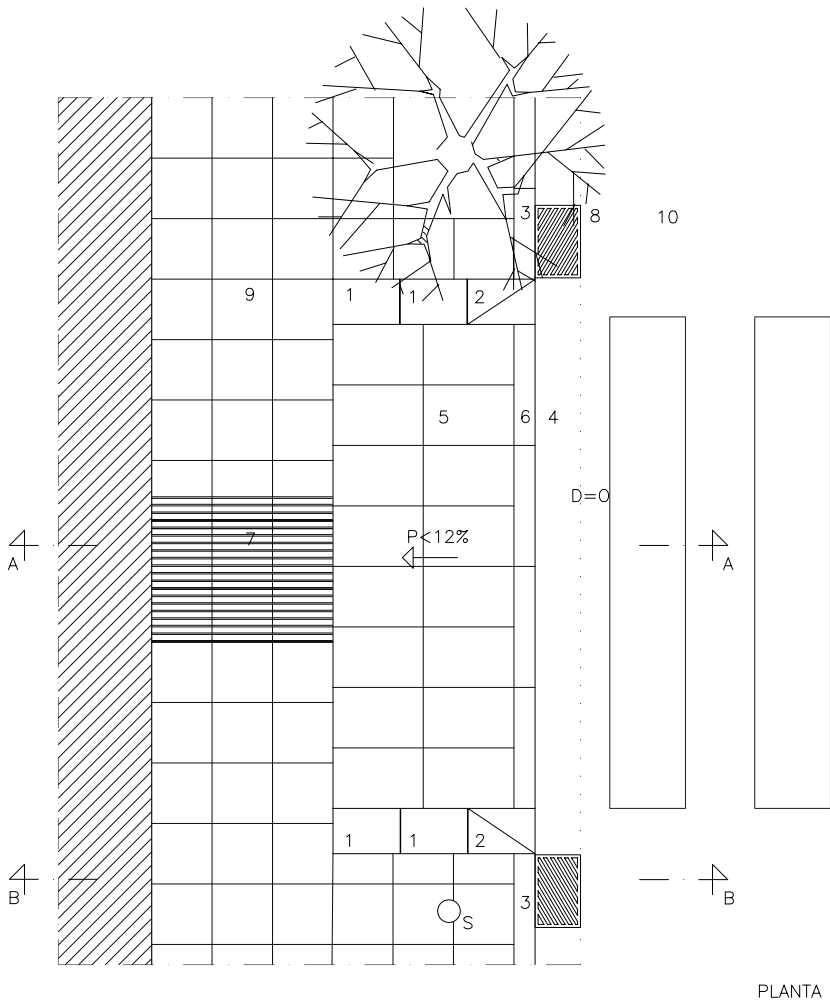



GUAL P-P / TIPUS PEDRA I PROFUNDITAT 1.15m.

LLEGENDA

- 1 Peça de pedra natural de 57.5x28x15  
Dues cares vistes abuixardades.  
Col.locada sobre solera de formigó.
  - 2 Peça de pedra natural de 57.5x28x15  
Tres cares vistes abuixardades.  
La part superior rebaixada.  
Col.locada sobre solera de formigó.
  - 3 Vorada de pedra natural.
  - 4 Rigola de formigó.
  - 5 Panots de 60x40x3.5 cm i 40x40x3.5 cm amb acabat de pedra abuixardada col.locada sobre solera de formigó. Les peces que formen la rampa del gual, hauran d'entregar-se enrasades amb la calçada i la vorera.
  - 6 Peça de pedra natural de 14x8 cm col.locada sobre solera de formigó formant el pendent.
  - 7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amplada=100cm i Longitud = Fins a la façana de de l'edifici o 5.0 m. Col.locada perpendicular al pas de vianants
  - 8 Reixa d'embornal, la direcció de les franges serà paral.lela a la vorada.
  - 9 Paviment existent.
  - 10 Calçada d'asfalt.
- D= Desnivell de la vorera respecte la calçada  
P= Pendent del gual de vianants.  
S= Semàfor.

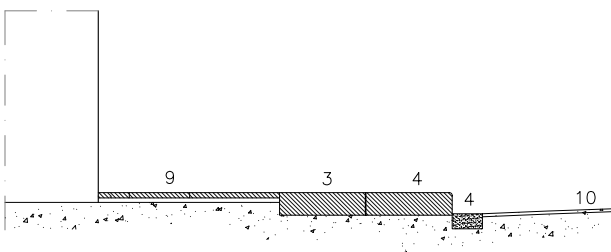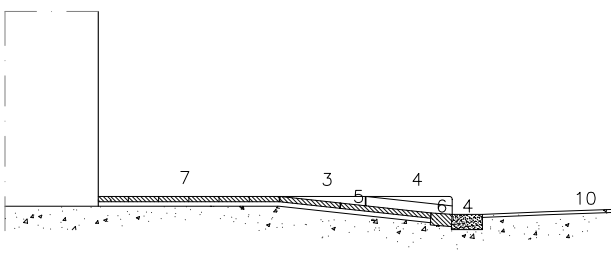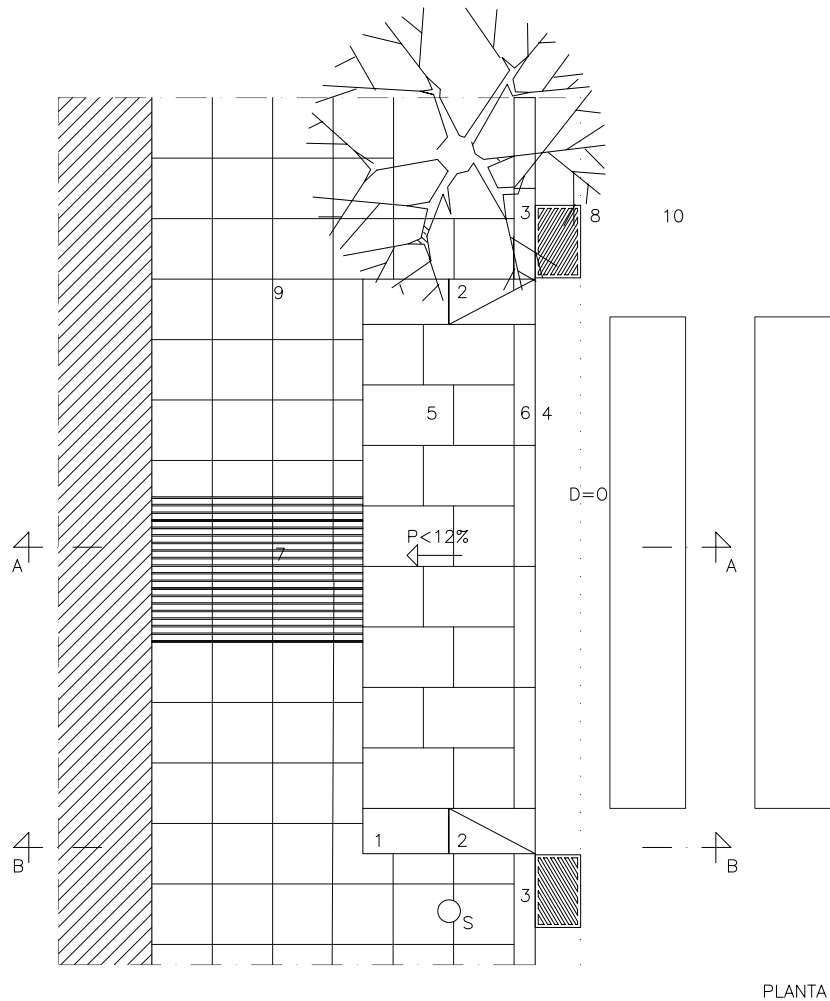

TIPUS GUAL 120 GIRANT LA VORADA

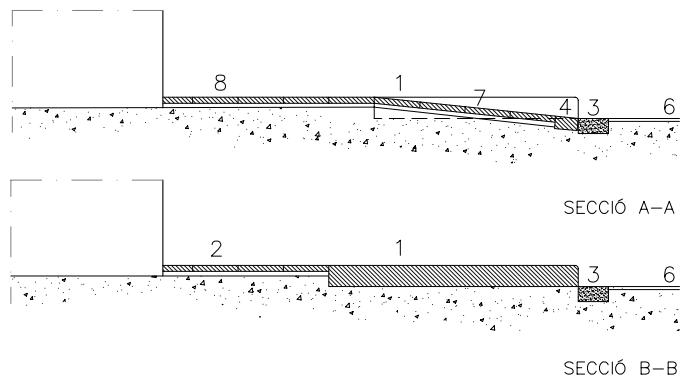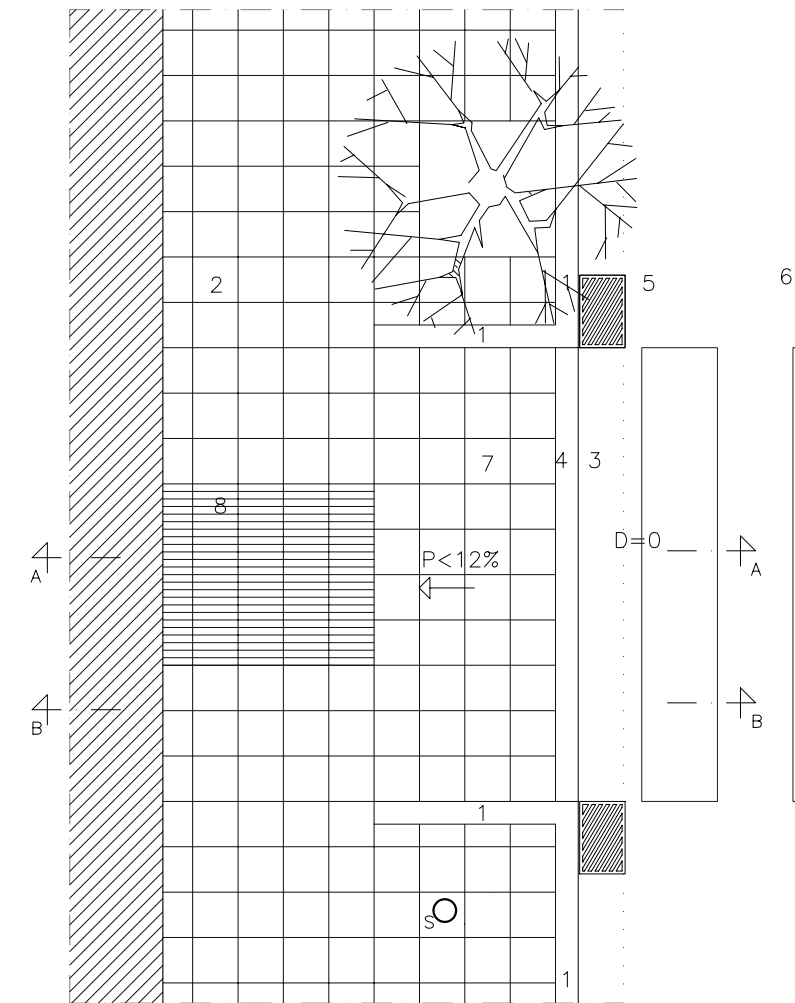


LLEGENDA


- 1 Vorada de formigó.
- 2 Paviment existent.
- 3 Rigola de formigó.
- 4 Peça de formigó de 8 cm de gruix.
- 5 Reixa d'embornal, la direcció de les franges serà paral·lela a la vorada.
- 6 Calçada d'asfalt.
- 7 Formació de la rampa del gual amb paviment igual a l'existent.
- 8 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amplada=100 cm i Longitud = Fins a la façana de de l'edifici o 5.0 m.. Col·locada perpendicular al pas de vianants.

D= Desnivell de la vorera respecte la calçada  
P= Pendent del gual de vianants.  
S= Semàfor.

ILLETA AL PAS DE VIANANTS

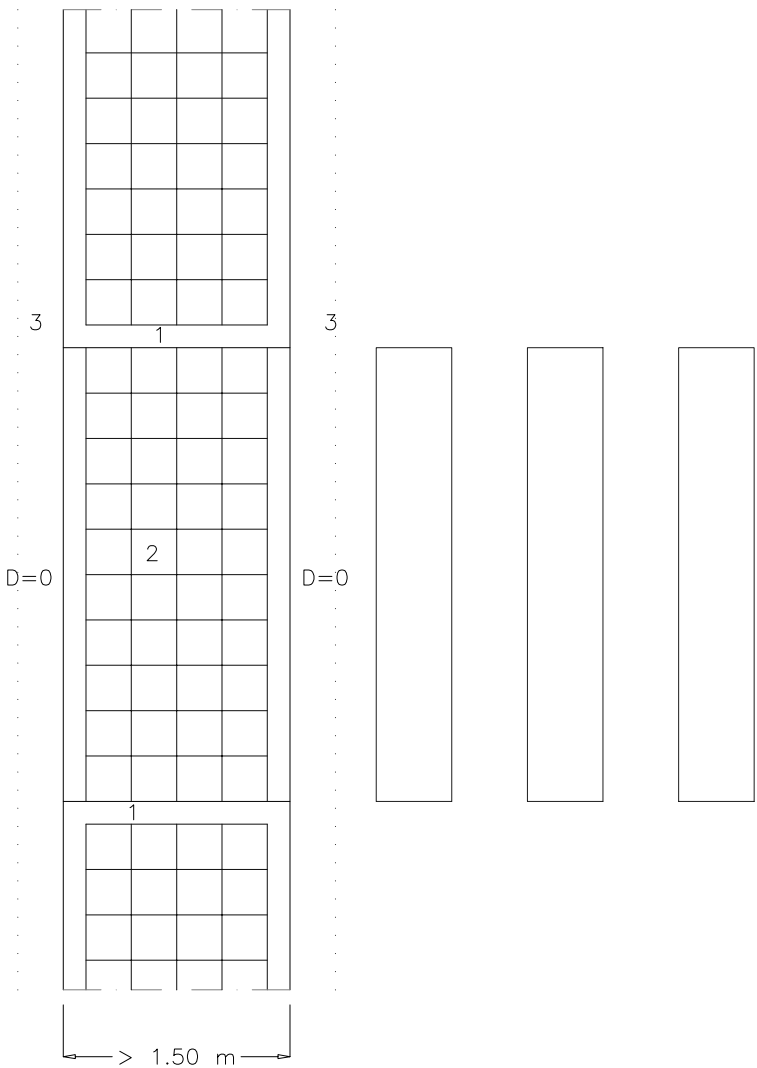

PLANTA


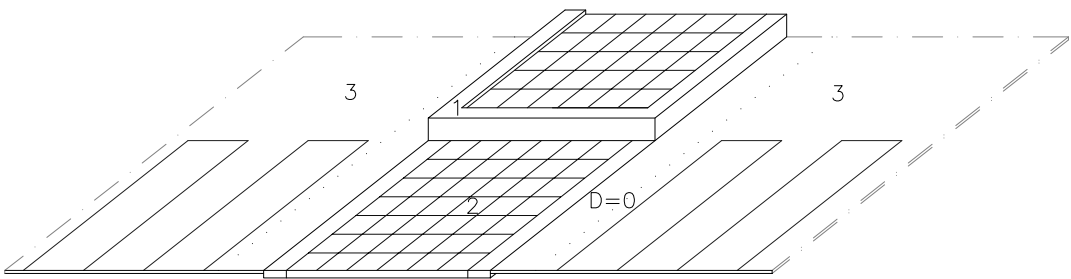


PERSPECTIVA

LLEGENDA

- 1 Vorada de formigó o pedra.
  - 2 Paviment diferenciat respecte el de la calçada i d'amplada igual a la del pas de vianants.
  - 3 Calçada d'asfalt.
- D= Desnivell de la vorera respecte la calçada  
S= Semàfor.

GUAL AMB REBAIX DE VORERA

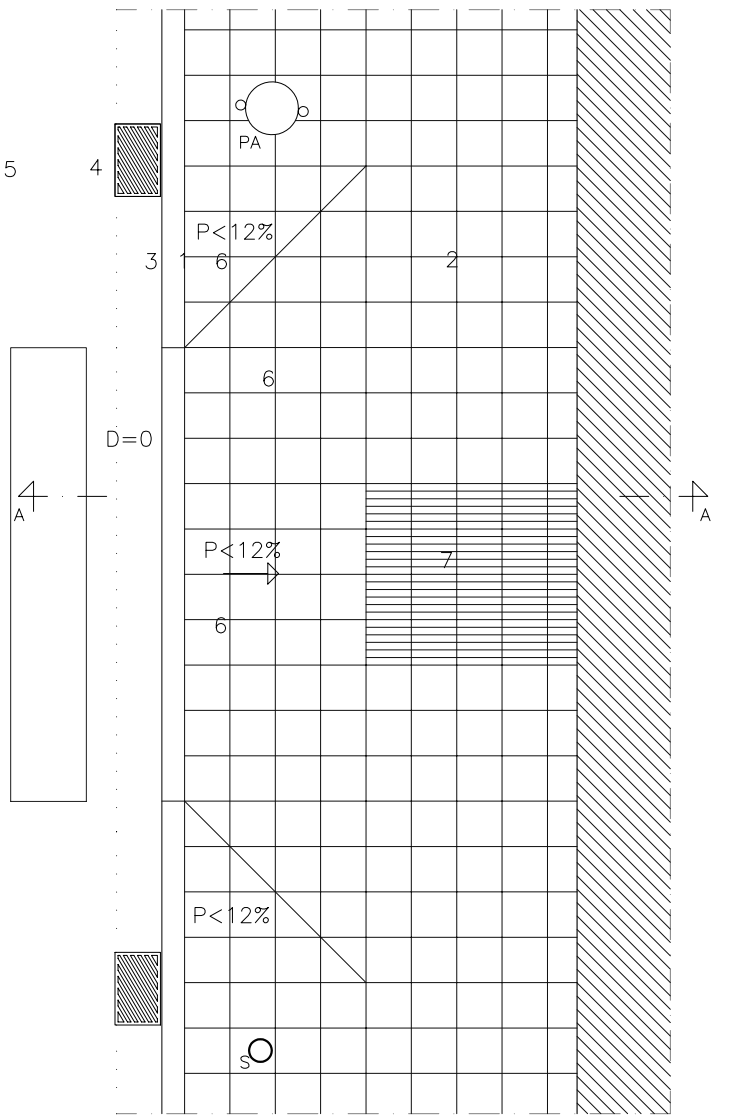


LLEGENDA


- 1 Vorada de formigó.
- 2 Paviment existent.
- 3 Rigola de formigó.
- 4 Reixa d'embornal, la direcció de les franges serà paral·lela a la vorada.
- 5 Calçada d'asfalt.
- 6 Formació de la rampa del gual amb paviment igual a l'existent.
- 7 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amplada=100 cm i Longitud = Fins a la façana de de l'edifici o 5.0 m. Col·locada perpendicular al pas de vianants.

D= Desnivell de la vorera respecte la calçada  
P= Pendent del gual de vianants.  
PA= Paperera.  
S= Semàfor.



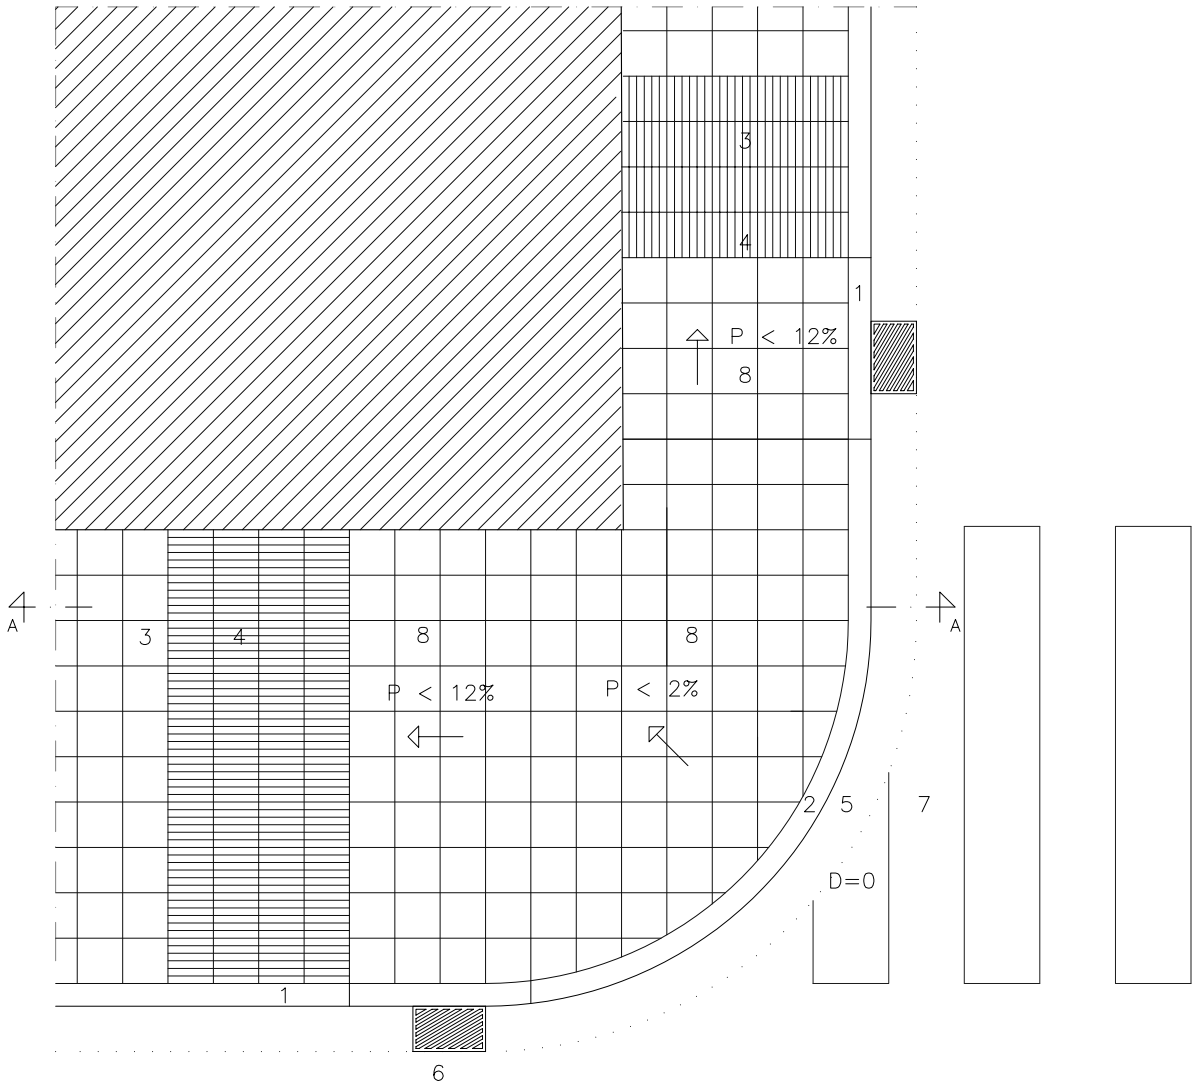

PLANTA

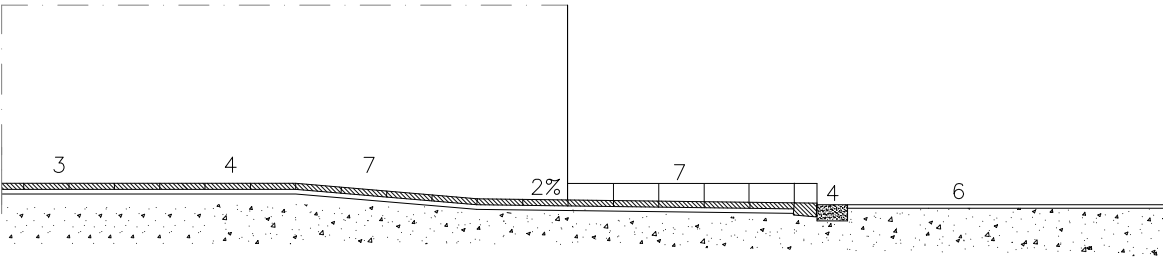


SECCIÓ A-A


LLEGENDA

- 1 Vorada de formigó o de pedra.
- 2 Vorada corba de formigó o de pedra.
- 3 Paviment existent.
- 4 Franja de panot estriat de 1.0 m d'amplada. Col·locada perpendicular al pas de vianants.
- 5 Rigola de formigó.
- 6 Reixa d'embornal, la direcció de les franges serà paral·lela a la vorada.
- 7 Calçada d'asfalt.
- 8 Formació de la rampa del gual amb paviment igual a l'existent.

D= Desnivell de la vorera respecte la calçada.  
P= Pendent del gual de vianants.

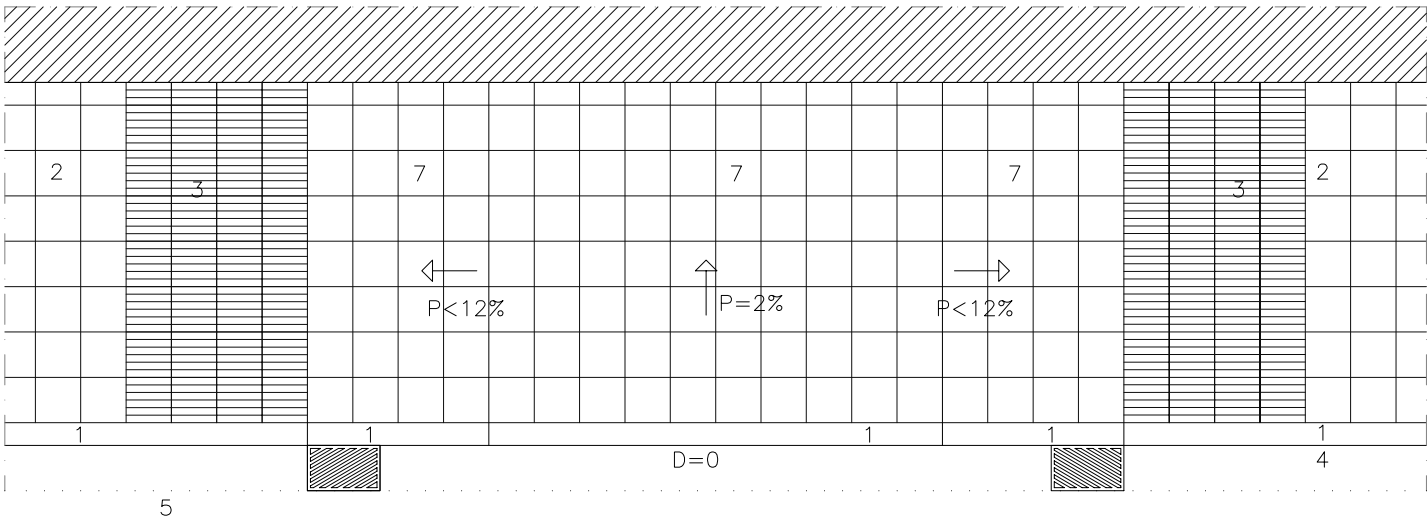

PLANTA

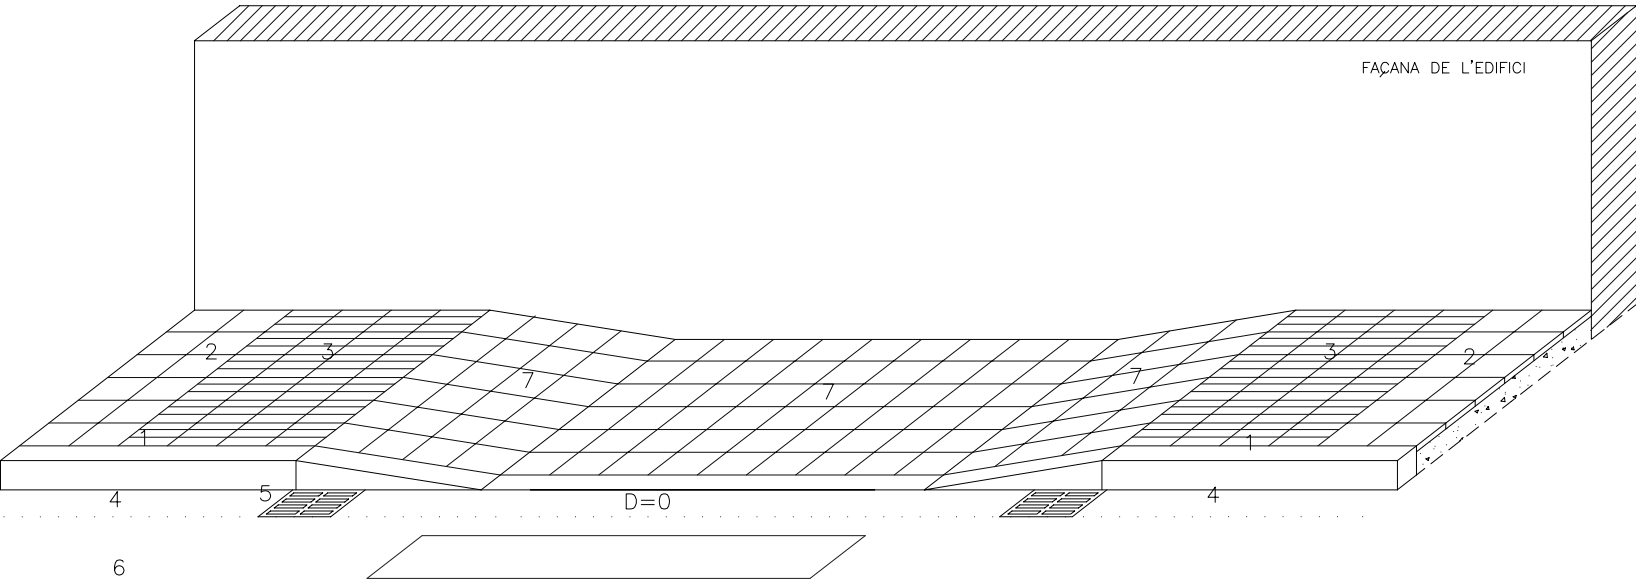


PERSPECTIVA

LLEGENDA

- 1 Vorada de formigó o de pedra.
- 2 Paviment existent.
- 3 Franja de panot estriat centrada al mig del gual. Amplada=100 cm i Longitud = Fins a la façana de de l'edifici o 5.0 m Col·locada perpendicular al pas de vianants.
- 4 Rigola de formigó.
- 5 Reixa d'embornal, la direcció de les franges serà paral·lela a la vorada.
- 6 Calçada d'asfalt.
- 7 Formació de la rampa del gual amb paviment igual a l'existent.

D= Desnivell de la vorera respecte la calçada.  
P= Pendent del gual de vianants.

PLATAFORMA ALENTIDORA

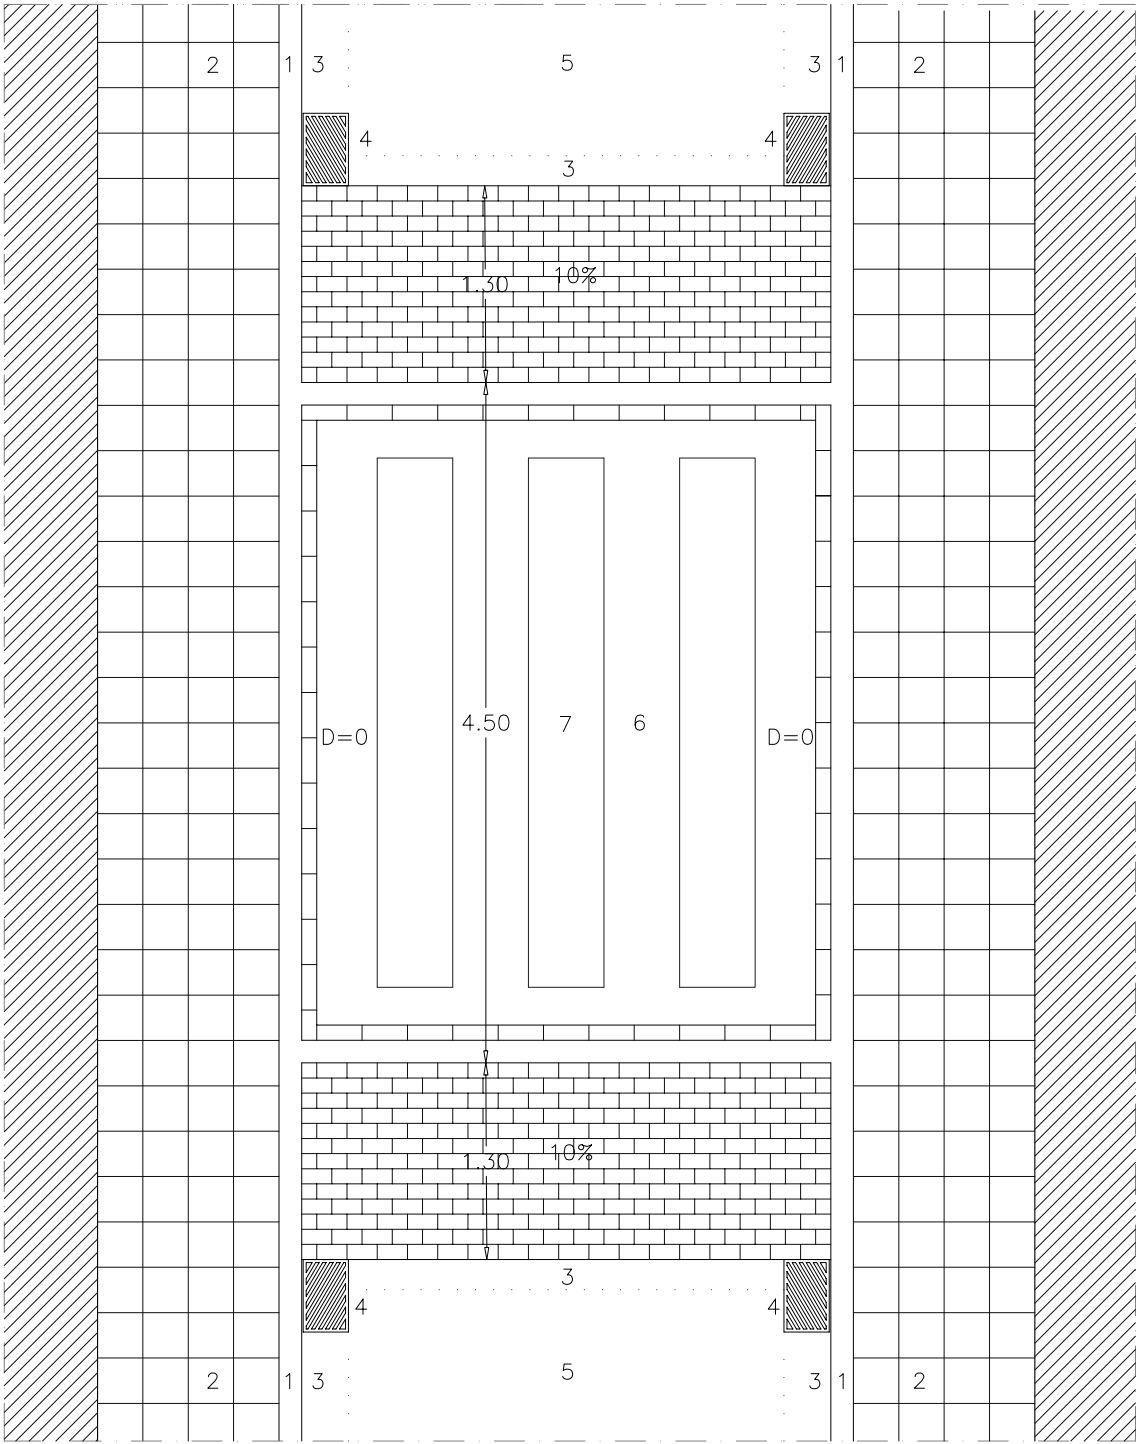

PLANTA

LLEGENDA

- 1 Vorada de formigó o pedra.
  - 2 Panot vorera.
  - 3 Rigola de formigó.
  - 4 Reixa d'embornal.
  - 5 Calçada d'asfalt.
  - 6 Elevació de la calcada al nivell de la vorera.
  - 7 Franges pas de vianants.
- D= Desnivell de la vorera respecte la calçada.

## **DOCUMENTACIÓ ESCRITA**

**PLA D'ACCESSIBILITAT PER A LA SUPRESSIÓ DE BARRERES  
ARQUITECTÒNIQUES A LA VIA PÚBLICA DE CASSÀ DE LA SELVA.**



## ***INDEX***

- 1.- Introducció
- 2.- Legislació
- 3.- Objecte del Pla d'Accessibilitat
- 4.- Descripció del municipi – *antecedents*
- 5.- Contingut del Pla *àmbit - Via Pública*
- 6.- Criteris a aplicar en l'execució d'obres de supressió de barreres arquitectòniques
- 7.- Criteris aplicats en la valoració econòmica del Pla d'accessibilitat de la via pública

## 1.- INTRODUCCIÓ

Degut al progrés de la tècnica i la ciència, l'augment progressiu de l'esperança de vida, i l'increment dels accidents de trànsit, ha augmentat un sector social amb problemes de mobilitat.

Aquest sector de la població, format per persones amb minusvalies físiques, per la gent gran, per persones que han sofert ocasionalment una lesió, persones que transporten cotxets per infants o de la compra, dones embarassades, o pels ciutadans que tenen deficiències sensorials, sovint troba impediments per desplaçar-se de manera còmoda sense precisar d'ajuda tècnica o humana.

L'accessibilitat permet que les persones amb mobilitat reduïda puguin gaudir de les mateixes oportunitats que la resta dels ciutadans.

La incorporació de l'accessibilitat en el disseny de les ciutats i en la política municipal és una de les mesures per a la promoció i per a la millora de la qualitat de vida del municipi.

L'accessibilitat té una enorme transcendència per aquelles ciutats que tenen un gran ressò turístic, donat que serà confortable per a la totalitat dels seus habitants, els habituals o els temporals, i l'adaptació a les exigències d'accessibilitat ofereix un nou motiu per a la promoció turística.

L'aplicació sistemàtica i de forma homogènia dels elements d'accessibilitat a la hora de concebre qualsevol projecte a les diferents zones, aporta al conjunt ordre i identitat.

Més enllà de les exigències legals, la necessitat de disposar i aplicar un Pla d'accessibilitat que planifiqui en tots els àmbits de competència municipals, les etapes d'actuació i el seu estudi econòmic, s'ha convertit en una convergència d'interès per a qualsevol municipi.

No es pot oblidar que és un element fonamental per incrementar la qualitat de vida, no només de totes les persones amb mobilitat reduïda - que tenen consciència del seu dret a gaudir de les ciutats i a viatjar en igualtat de condicions que els seus conciutadans - sinó que s'està convertint en una exigència ciutadana.

## **2.- LEGISLACIÓ**

***Per la redacció d'un Pla d'accessibilitat s'han de tenir en compte les següents legislacions i normatives vigents:***

- \* Llei 20/91 de Promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques.
- \* Codi d'accessibilitat de Catalunya, Decret 135/1995 de 24 de març de desplegament de la Llei 20/91 de 25 de novembre de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques i d'aprovació del Codi d'Accessibilitat.
- \* Manual Europeu per a un entorn urbanitzat accessible.
- \* Norma Tecnològica NTJ 01A. Accessibilitat als espais verds d'ús públic.
- \* Normativa del municipi sobre l'instal·lació dels elements urbans en l'espai públic.

***La Llei 20/ 1991 de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques, diu referent als municipis :***

En l'article 52 es diu :

*\* \* Competències dels municipis*

*" Correspon als municipis l'aplicació de la normativa d'accessibilitat i supressió de barreres , en l' àmbit de les competències que hagin d'exercir..... :*

*L'elaboració dels plans locals d'adaptació i supressió de barreres arquitectòniques, així com les corresponents revisions quinquennals. "*

En la disposició addicional tercera es diu :

*" Aquests plans seran revisats cada cinc anys i realitzats en un termini màxim de quinze anys."*

L'entrada en vigor de la Llei va ser el 4 de desembre de 1991

Els Plans d'Accessibilitat, segons assenyala la Llei 20/199, tenien que estar redactats als dos anys de la seva l'entrada en vigor , es a dir , el 4 de desembre de 1993.

La data de la primera revisió correspon al desembre de 1996, la de la segona al desembre de 2001, i amb data de desembre de 2006 la ciutat ha de ser accessible per a tothom.

En l'article 12 , apartat 12.3 es diu:

*" Per a la finalitat prevista en aquest article, els projectes de pressupostos dels ens públics han de contenir en cada exercici econòmic les consignacions necessàries per al finançament d'aquestes adaptacions. "*

### **3.-Objecte de un Pla d'Accessibilitat**

L'objecte d'un Pla és l'estudi del nivell de l'accessibilitat del municipi en els àmbits de la via pública i de l'edificació, amb la finalitat d'obtenir els coneixements necessaris per establir les prioritats, etapes d'actuació, i la valoració econòmica de les adaptacions que s'hagin de dur a terme, per adaptar gradualment el municipi.

El Pla permetrà a l'Ajuntament conèixer quina és la reserva pressupostaria necessària en cada exercici econòmic per a dur a terme aquestes adaptacions, i aconseguir, d'aquesta manera, que en la data que assenyala la Llei 20/1991 d'Accessibilitat - 4 de desembre de 2006 - la ciutat estigui adaptada.

El Pla d'Accessibilitat d'un municipi ha d'abastar tots els àmbits de la seva competència, com són: *via pública, espais a l'aire lliure, edificis municipals, equipaments municipals, transport públic i mitjans de la comunicació.*

A mesura que es vagi procedint a l'adaptació gradual del municipi, per donar-ho a conèixer, caldrà divulgar el seu estat d'accessibilitat amb plànols, guies etc.....

### **4.- Descripció de la vila – antecedents**

El municipi de Cassà de la Selva està situat a la comarca del Gironès, limita amb els municipis de Llagostera, Caldes de Malavella, Campllong, Llambilles i Santa Pellaia; té una superfície de 45 Km<sup>2</sup> i es troba a 137 metres per damunt del nivell del mar.

S'hi arriba mitjançant les carreteres C-250, C-65, GI-664 i GIV-6741.

Cassà de la Selva està situat a 12 Km de Girona.

Te una població de 8994 habitants

La història de Cassà de la Selva és molt antiga i en el seu territori s'han trobat restes del paleolític, neolític, bronze, ibèric i romà. A partir de l'edat mitjana es va bastir el nucli de població a l'entorn de la sagrera del primitiu temple romànic que estava situat en el mateix lloc que l'església parroquial actual. La gran pesta del 1650 va delmar extraordinàriament la població, però ben aviat la introducció d'un nou ofici, la del taper, es convertiria en el gran revulsiu de la vila. Aquest ofici derivaria en la potent indústria surotapera que en el segle XIX es convertiria en el motor de l'expansió demogràfica i econòmica potenciada per la creació d'una nova via de comunicació, el ferrocarril.

En els anys seixanta, però, la indústria es va diversificar i es varen afegir nous sectors que va absorbir a partir dels anys seixanta un important contingent d'immigració que provenia del sud de la península.



En els últims anys hi ha hagut un altre increment de la població immigrant procedent del continent africà, que s'ocupen dins del sector industrial i agrícola.

## **5.- Contingut del Pla àmbit - Via Pública i espais a l'aire lliure**

### **a.- Abast**

El Pla d'Accessibilitat en l'àmbit de la via pública i espais a l'aire lliure.

S'ha inspeccionat la via pública per conèixer l'estat actual dels elements que en formen part i així, disposar de la suficient informació per diagnosticar el nivell d'accessibilitat en que es troba; les intervencions que s'hauran de dur a terme; establir el pla d'etapes en que s'hauran d'executar i la seva valoració econòmica.

Els elements que s'han estudiat són tots els que es troben dins l'itinerari que es volen adaptar o bé que limiten amb ell.

El Pla revisa que les intervencions ja efectuades en matèria d'accessibilitat contemplin tots els requeriments que assenyala la normativa, com per exemple: que els guals per a vianants disposin de la senyalització per a invidents, que les pendents dels guals i rampes siguin les adequades i que estiguin enrasats amb el paviment de la calçada, que permetin el pas i el gir per la seva part posterior etc...

Planifica de manera global, la supressió de barreres arquitectòniques pels carrers que encara no s'han efectuat intervencions per millorar i per facilitar la mobilitat.

### **b.- Metodologia**

La inspecció s'ha fet utilitzant fitxes i plànols per treball de camp, on es recull l'estat actual, situació, dimensions, etc. dels elements de la vorera en tots els trams de carrer que es varen predeterminar.

S'hi han recollit les següents dades :

- Voreres estretes
- Alçada de les voreres
- Inexistència de vorera
- Carrers d'amplada inferior a 5,50m
- Plataforma única existent
- Carrers sense urbanitzar
- Carrers amb fortes pendents

- Existència de guals de vianants correctament executats
- Existència de guals de vianants que no estan ben adaptats
- Pintat dels passos de vianants
- Elements i mobiliari urbà que per la seva ubicació o disseny, suposen una barrera
- Paviments deteriorats

Aquesta informació s'ha introduït a l'ordinador i dibuixat amb detall a plànols amb format DIN A3 per facilitar la seva operativitat al realitzar consultes i també elaborar la diagnosi que ens permetrà conèixer les intervencions que s'han de dur a terme a cada tram. De l'anàlisi de les dades obtingudes amb les dades de treball de camp, s'ha pogut fer la diagnosi de tots els trams que es volen adaptar.

Al plànol general a escala 1/2500 de l'estat actual, s'indica la nomenclatura per situar els plànols de detall. Aquests plànols amb format DIN A3 a escala 1/1000, es troben en el la documentació gràfica, on es pot consultar el detall de l'estat actual de via pública. A més, també s'han realitzat plànols de seccions dels carrers afectats, ordenats de forma alfabètica i a escala 1/100.

#### *c.- Prioritats i Fases*

Per definir les prioritats en l'adaptació de la via pública s'ha considerat la situació dels centres públics o d'interès per la majoria de persones (centres socials, culturals, comercials, sanitaris, lúdics, etc... ). Es procura facilitar la mobilitat dins cada zona, enllaçant mitjançant les voreres els punts que s'han considerat d'interès mes immediat.

En la primera fase, s'inclouen els itineraris de les zones més concorregudes per facilitar l'accessibilitat als edificis o llocs d'interès públic per al major nombre de persones, o habitatges de persones amb mobilitat reduïda. Aquest és l'itinerari que és necessari adaptar amb més urgència.

En la altres fases, l'itinerari passa també per carrers que facilitaran l'accés d'un elevat nombre de persones, però que es pot executar després de l'anterior.

En el present treball per l'execució del Pla es proposa :

#### *\* EN LA PRIMERA FASE*

Els itineraris considerats prioritaris o més urgents a adaptar en aquesta fase són :

- El carrer Josep Pla i el carrer de Bassegoda.
- El carrer Fraternitat.
- El tram del carrer del Molí compres entre el carrer del Progrés i el carrer Music Coll.

- El carrer d'Avall.
- El carrer de Girona.
- El carrer Nou.
- Bda. Mossèn Cinto Verdaguer.
- Pl. Mossèn Cinto Verdaguer.
- El carrer de Joan Gener.
- El carrer de la Roscada.
- El carrer dels Dolors.
- Travessera de la plaça Petita.
- El carrer de les Mesures.
- El carrer d'Ocata.
- El carrer de la Mel.
- Travessera de la Coma.
- La plaça de la Coma.
- El carrer Major.
- La plaça del Dr.Botet.
- El carrer del Pont.
- La Plaça St.Pere.
- El carrer del Reverend Joaquim Bosch.
- El carrer Ample.
- El tram de la Rambla Onze de Setembre, compresa entre els carrers Ample i de l'Esport.
- El tram central del carrer Germà Agustí.
- El tram del carrer Ramon Llull compres entre els carrers Josep Pla i Víctor Català.

*\* EN LA SEGONA FASE*

Els itineraris considerats també urgents a adaptar i que amplien els de la primera fase són :

- La Carretera Provincial.
- El carrer d'Antoni Gaudí.
- El tram del carrer del Castell compres entre la carretera Provincial i el carrer del Bassegoda.
- El carrer de Xavier Carbó.
- El tram del passeig del Ferrocarril compres entre el carrer de Xavier Carbó i el carrer del Germà Agustí.
- El tram de la Rambla Onze de setembre compresa entre el carrer del Germà Agustí i el carrer Ample, i entre el carrer de l'Esport i la carretera de Marina.
- El carrer del Raval.
- El carrer de Cervantes.
- La travessera Passeig de Vilaret.

- El passeig de Vilaret.
- El carrer de l'Estació.
- El carrer Germà Agustí.

#### *\* EN LA TERCERA FASE*

Completar trams dels itineraris que amplien l'accessibilitat des de les zones menys concorregudes fins als itineraris de les fases anteriors.

- El carrer del Vi Novell.
- El tram del carrer Mercè Rodoreda compres entre els carrers Vi Novell i Josep Pla.
- El carrer de la Barceloneta.
- El tram del carrer Music Coll compres entre la carretera Barcelona i el carrer del Bassegoda.
- El carrer de Ponent.
- El tram del carrer del Molí compres entre la carretera Provincial i el carrer del Progrés.
- El carrer del Progrés.
- El carrer de l'Ardenya.
- El carrer del Portal.
- El carrer de la Indústria.
- El carrer de Catalunya.
- El carrer de Bonavista.
- El carrer del Clot.
- El carrer de la Font.
- El carrer de l'Esport.
- El carrer de la Verneda-
- El carrer del Poeta Machado.
- El carrer de la Llebre.
- El carrer de Primitiu Artigues.
- El tram del carrer de l'Hospital compres entre la Rambla Onze de Setembre i el carrer del Raval.
- La plaça de la Font de Can Tolosà.

#### *\* EN LA CUARTA FASE*

Adaptar els itineraris dins de les zones residencials mes apartades de les zones de serveis i comercials:

- El carrer de Perelada.
- La ronda de Sant Jordi.
- El carrer Marià Fortuny.
- El carrer de la Mercè Rodoreda.
- El carrer de Pomeu Fabra.

- El tram del carrer Ramon Llull, compres entre els carrers Josep Pla i Pompeu Fabra.
- El tram del carrer Músic Coll compres entre els carrers del Bassegoda i el Pompeu Fabra.
- El carrer dels Pirineus.
- El tram del carrer Mare de Déu del Núria, compres entre els carrers del Bassegoda i el Pompeu Fabra.
- El carrer dels Angels.
- El carrer de la Bisbal.
- El carrer del Firal.
- El carrer del Mig.
- El carrer dels horts.
- El carrer Puig Gros.
- El carrer del Migdia.
- La Bda. Del carrer Migdia.
- El carrer de l'Empordà.
- El carrer del Puigcugul.
- El tram del carrer del remei, compres entre els carrers del Pelagrí i el del Molí.
- El carrer del Dr. Fleming.
- El carrer de Susvalls.
- El carrer del Pelagrí.
- El carrer del Canigó.
- El carrer del Montseny.
- La travessera del carrer del Montseny.
- El carrer de San Antoni.
- El carrer del Far.
- El carrer de la Salut.
- El carrer de la Pau.
- El carrer del Dr. Robert.
- El carrer de Martí Dausà.
- El carrer del Suro.
- El tram del carrer de l'Hospital compres entre el Passeig del Ferrocarril i la Rambla Onze de Setembre.
- El carrer de la Piscina.
- El carrer del Sud.

Els itineraris a adaptar i les fases d'execució proposats, es poden veure detalladament en els plànols del projecte.

Al plànol general de la proposta a escala 1/2500 s'indica la nomenclatura per situar els plànols de detall.

En aquests plànols amb format DIN A3 a escala 1/1000 es pot consultar el detall de la proposta de reforma a efectuar per adaptar la via pública.

#### *d.- Propostes*

Les propostes d'intervenció en aquest Pla d'accessibilitat són diverses segons en el tram de carrer analitzat.

Quan les voreres tenen unes dimensions adequades la proposta serà crear un itinerari adaptat i la construcció de guals en els passos de vianants.

Quan l'amplada entre les façanes del carrer es inferior 5,50m es proposa la supressió de voreres i la formació d'una plataforma única formant un itinerari mixt de vehicles i vianants.

Quan l'amplada del carrer es superior a 5,50 però les voreres tenen una amplada de 0,90 o inferior es proposarà ampliar-les. En aquests casos, s'analitzarà el que implica aquesta solució i la possibilitat de portar-ho a terme, donat que sovint implica o bé suprimir la franja d'aparcaments, o bé substituir la doble circulació de vehicles per un únic sentit de circulació.

En aquest Pla, es proposa en alguns carrers redimensionar les amplades actuals destinades a la calçada i a les voreres, amb la finalitat d'ampliar les voreres.

Es proposa reduir l'amplada de la calçada a una mesura estricta per l'ús del trànsit dels vehicles en un sentit de circulació, per induir a la reducció de la velocitat i redistribuir l'espai restant per als vianants i l'aparcament.

També es proposa la construcció de plataformes alentidores en passos de vianants per suprimir les barreres arquitectòniques i per la pacificació del trànsit i millorar la mobilitat de l'entorn.

### **6.- Criteris a aplicar en l'execució d'obres de supressió de barreres arquitectòniques**

#### *a.- Paviments*

La pendent longitudinal no pot ser superior al 8%. La pendent transversal no pot ser superior al 2%. Els paviments han de ser durs, no lliscants i sense gruixos diferents als propis del gravat de les peces. En les zones de parcs o jardins, el paviment pot ser de terres compactades de un 90 % PM. Cal que les reixes i registres estiguin enrasats amb el paviment circumdant.

El mesura de les obertures de les reixes col·locades en un itinerari de vianants no poden ser superiors al que permet la descripció d'un cercle de 3 cm de diàmetre com a màxim.

#### *b.- Itinerari mixt, vehicles i vianants*

En els carrers que l'amplada entre les façanes es igual o inferior a 5,50 m, és recomanable suprimir voreres i formar una plataforma única per a ser utilitzat com un itinerari mixt, és a dir, compartit entre vianants i vehicles. Un itinerari mixt ha de tenir una amplada lliure mínima de 3m i una alçada lliure d'obstacles de 3 m en tot el recorregut, a més, no pot incloure cap graó o escala aïllada. Els elements de l'urbanització o mobiliari urbà que en forma part ha de ser adaptat.

Caldrà aplicar mesures de pacificació del trànsit en totes les zones d'itinerari mixt per a la seguretat dels vianants.

#### *c.- Amplada de les voreres*

Un itinerari adaptat a la vorera de tenir una amplada lliure mínima de 0,90 m i una alçada lliure d'obstacles

de 2,10 m. L'amplada mínima recomanable que han de tenir les voreres es de 1,50 m i en les voreres que hi han arbres de 2,50 m.

Aquestes amplades son mínimes i necessàries donat que cal tenir en consideració l'espai que ocupen a la vorera altres elements del mobiliari urbà, com son els fanals d'enllumenat; els semàfors; els arbres amb els seus escossells; baixants adossats a façana; postes de telefonia; les papereres etc. A més, aquests elements s'han de col·locar alineats i amb especial cura a la vorera, perquè no envaeixin l'amplada lliure mínima necessària de 0,90m.

#### *d.- Construcció de guals de vianants*

La tipologia del gual a construir ve determinada per l'amplada de la vorera .

S'adjunten els plànols amb les diferents tipologies de guals adaptats al final d'aquesta memòria.

#### **1 / Guals a les voreres d'amplada superior a 2,40 m d'amplada**

El gual tipus anomenat 120 és adequat únicament en voreres d'amplada igual o superior a 2.40 m. donat que ha de deixar un pas lliure mínim per la part posterior de 90 cm i deixar fer un gir de 1,20 m per

creuar.

Aquesta tipologia de gual, deixa amplada de pas suficient de la vorera per la part posterior per no interferir en el recorregut dels vianants que no creuaran per aquest gual; amb la construcció d'un gual d'aquesta tipologia no s'arriba fins a la façana per tant no afecta cap element privat.

Aquesta tipologia permet la màxima amplada útil en el pas dels vianants. És important aprofitar la màxima amplada útil de pas al construir guals en zones ja urbanitzades donat que sovint a la vorera s'hi troben elements urbans que condicionen les amplades dels gual a construir, com són els semàfors, fanals o arbres.

Per major seguretat i comoditat dels vianants cal que els guals estiguin enfrontats.

Per les mateixes raons cal també que el gual tingui l'amplada igual a la del pas de vianants.

El gual 120 es també aconsellable en espais a l'aire lliure o en zones ajardinades. En aquestes situacions caldrà veure el detall que s'adjunta, per evitar que el sauló o les terres de les zones ajardinades es puguin acumular a la pendent o davant dels guals.

## 2 / Guals a les voreres d'amplada inferior a 2.40 m d'amplada

En aquestes voreres el tipus de gual recomanable és el de rebaix total de la vorera o el gual de cantonada.

Els guals d'aquestes tipologies arriben fins a la façana, per tant, afecten elements privats.

Escollir un d'aquests dos tipus ve determinat per diferents factors com poden ser :

- a) La situació dels passos de vianants respecte als del la cruïlla més propera.
- b) Poder enfrontar els guals salvant els elements urbans de la vorera.
- c) Per els elements privats que afecta donat que en alguns casos això obliga al trasllat dels passos de vianants actuals.

Pel que fa referència als materials a aplicar en la construcció dels guals, com a criteri general, cal que el paviment no sigui lliscant.

Es recomana per la construcció d'aquesta tipologia de gual utilitzar els mateixos materials de la vorera en el paviment i en la vorada, amb la finalitat de que quedin integrats visualment amb aquesta.

És necessari perquè aquests guals siguin còmodes per als vianants que el % de la pendent sigui la més reduïda possible (encara que compleix la normativa una pendent del 12%), donat que aquest tipus de guals afecten sempre l'itinerari de vianants.

Referent a la senyalització dels guals per a persones invidents o amb visió reduïda, cal senyalitzar-los tal i com es grafia en els plànols adjunts, amb una franja de paviment estriat, segons les característiques



indicades. Aquesta franja ha d'arribar fins la façana. En el cas que aquesta quedi molt allunyada ha de tenir 5 m de llargada .

Aquest paviment va ser estudiat i proposat per l'organització ONCE com el que millor podien detectar. És important que els passos de vianants estiguin pintats donat que facilita que les persones amb visió reduïda puguin detectar on estan situats els passos.

#### *e.- Construcció de plataformes alentidores*

Es proposa la construcció de plataformes alentidores per suprimir barreres arquitectòniques en passos de vianants, donat que pacifiquen el trànsit, milloren la mobilitat de l'entorn i donen més seguretat als vianants.

Es redimensionen les amplades actuals destinades a la calçada i a les voreres del carrer, amb la finalitat de reduir l'amplada de la calçada a una mesura estricta per l'ús del trànsit dels vehicles en un sentit de circulació i redistribució l'espai restant per als vianants.

L'amplada de la calçada es redueix a 3 m, per induir a la reducció de la velocitat, tot l'espai restant s'utilitza per als vianants.

S'adjunten detalls constructius de guals per a vianants adaptats i plataformes alentidores en l'annex incorporat a la memòria.

### **7.- Valoració econòmica del Pla d'accessibilitat a la via pública i de espais a l'aire lliure**

Per valorar les intervencions que s'han dur a terme en els àmbits de via pública i de espais a l'aire lliure s'aplica una base de dades de preus estimatius per unitats o per preus compostos.

Això permet fer la valoració econòmica per trams de les intervencions que s'hauran de dur a terme.

El conjunt de la valoració econòmica dels trams ens permet valorar totes les fases.

S'ha procurat que l'import econòmic de cada fase sigui similar.

La valoració econòmica es pot veure detalladament en l'apartat corresponent.

Ma. Mercè Corominas i Noguera - Arquitecta

Girona, Febrer de 2009



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 01 PRIMERA FASE								
	SUBCAPITOL 01.01 Carrer de Josep Pla								
	APARTAT 01.01.01 C.de Peralada - C.de Mercè Rodoreda								
01.01.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	C.Mercè R.	2				2,000			
	Atravessen	4				4,000			
							6,00	3.260,00	19.560,00
01.01.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	C.Mercè R.	0,5				0,500			
	Atravessen	2				2,000			
							2,50	521,00	1.302,50
01.01.01.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Plataforma	3				3,000			
							3,00	144,65	433,95
	TOTAL APARTAT 01.01.01 C.de Peralada - C.de Mercè								21.296,45
	APARTAT 01.01.02 C.de Mercè Rodoreda -AVINGUDA D'ANTONI GAUDÍ								
01.01.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	C. Mercè R.	2				2,000			
	Avda. Antoni G.	1				1,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
01.01.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	C. Mercè R.	0,5				0,500			
	Avda. Antoni G.	0,5				0,500			
							1,00	521,00	521,00
01.01.02.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Avda.Antoni G.	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
	TOTAL APARTAT 01.01.02 C.de Mercè Rodoreda -AVINGUDA								10.445,65

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 01.01.03 Av.Antoni Gaudí - C. Music Coll								
01.01.03.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Antoni Gaudí	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
01.01.03.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Music Coll	0,5				0,500			
		0,5				0,500			
	Antoni Gaudí	0,5				0,500			
							1,50	521,00	781,50
01.01.03.03	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Antoni Gaudí	1				1,000			
	Music Coll	2				2,000			
							3,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTAT 01.01.03 Av.Antoni Gaudí - C. Music Coll.....								4.041,50
	TOTAL SUBCAPITOL 01.01 Carrer de Josep Pla.....								35.783,60
	SUBCAPITOL 01.02 Carrer del Bassegoda								
	APARTAT 01.02.01 C.del Músic Coll - C.de la Mare de Déu de Núria								
01.02.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Músic Coll	1				1,000			
	Mare de Déu	2				2,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
01.02.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Músic Coll	0,5				0,500			
		0,5				0,500			
	Mare de Déu	0,5				0,500			
		0,5				0,500			
							2,00	521,00	1.042,00
01.02.01.03	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Music Coll	1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTAT 01.02.01 C.del Músic Coll - C.de la Mare de								10.822,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 01.05 Carrer Fraternitat								
	APARTAT 01.05.01 C.del Molí - Carretera Provincial								
01.05.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	62,000	1,440		89,280			
	Vorera Oest	1	62,000	1,440		89,280			
							178,56	150,00	26.784,00
	TOTAL APARTAT 01.05.01 C.del Molí - Carretera Provincial.....								26.784,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.05 Carrer Fraternitat.....								26.784,00
	SUBCAPITOL 01.06 Carrer del Molí								
	APARTAT 01.06.01 C.del Progrés - C.d'Avall								
01.06.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Avall	1				1,000			
	Atravessen	2				2,000			
	Fraternitat	2				2,000			
							5,00	0,00	0,00
01.06.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Avall	0,5				0,500			
	Fraternitat	1				1,000			
	Atravessen	1				1,000			
							2,50	521,00	1.302,50
01.06.01.03	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	61,000	1,440		87,840			
	Vorera Sud	1	61,000	1,440		87,840			
							175,68	150,00	26.352,00
	TOTAL APARTAT 01.06.01 C.del Progrés - C.d'Avall.....								27.654,50

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 01.06.02 C.d'Avall - C.del Músic Coll								
01.06.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Avall		1			1,000			
							1,00	0,00	0,00
01.06.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Avall		0,5			0,500			
							0,50	521,00	260,50
01.06.02.03	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	190,000	1,550		294,500			
	Vorera Sud	1	190,000	1,550		294,500			
							589,00	150,00	88.350,00
	TOTAL APARTAT 01.06.02 C.d'Avall - C.del Músic Coll.....								88.610,50
	TOTAL SUBCAPITOL 01.06 Carrer del Molí.....								116.265,00
	SUBCAPITOL 01.07 Carrer d'Avall								
	APARTAT 01.07.01 C.del Molí - C.de Xavier Carbó								
01.07.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	43,000	1,550		66,650			
	Vorera Oest	1	43,000	1,550		66,650			
							133,30	150,00	19.995,00
01.07.01.02	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	46,000	3,300		151,800			
							151,80	150,00	22.770,00
	TOTAL APARTAT 01.07.01 C.del Molí - C.de Xavier Carbó.....								42.765,00



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 01.07.02 C.de Xavier Carbó - C.dels Dolors								
01.07.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	145,000	3,300		478,500			
							478,50	150,00	71.775,00
	TOTAL APARTAT 01.07.02 C.de Xavier Carbó - C.dels Dolors.....								71.775,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.07 Carrer d'Avall.....								114.540,00
	SUBCAPITOL 01.08 Carrer de Girona								
	APARTAT 01.08.01 C.d'Avall - Baixada de Mossèn Jacint Verdaguer								
01.08.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	100,000	4,600		460,000			
							460,00	150,00	69.000,00
	TOTAL APARTAT 01.08.01 C.d'Avall - Baixada de Mossèn								69.000,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.08 Carrer de Girona.....								69.000,00
	SUBCAPITOL 01.09 Carrer Nou								
	APARTAT 01.09.01 C.d'Avall - C.de Don Joan Gener i Prats								
01.09.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	72,000	3,800		273,600			
							273,60	150,00	41.040,00
	TOTAL APARTAT 01.09.01 C.d'Avall - C.de Don Joan Gener i								41.040,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.09 Carrer Nou.....								41.040,00
	SUBCAPITOL 01.10 Bda.Mossen Cinto Verdaguer								
	APARTAT 01.10.01 C.del Molí - Pl.Mossen Cinto								
01.10.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	31,000	5,300		164,300			
							164,30	150,00	24.645,00
	TOTAL APARTAT 01.10.01 C.del Molí - Pl.Mossen Cinto .....								24.645,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.10 Bda.Mossen Cinto Verdaguer.....								24.645,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 01.14 Travessera de la Coma								
	APARTAT 01.14.01 Plaça de la Coma - C.de la Mel								
01.14.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	25,000	4,000		100,000			
							100,00	150,00	15.000,00
	TOTAL APARTAT 01.14.01 Plaça de la Coma - C.de la Mel.....								15.000,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.14 Travessera de la Coma.....								15.000,00
	SUBCAPITOL 01.15 Carrer de la Mel								
	APARTAT 01.15.01 Travessera de la Coma - C.de les Mesures								
01.15.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	62,000	3,000		186,000			
							186,00	150,00	27.900,00
	TOTAL APARTAT 01.15.01 Travessera de la Coma - C.de les								27.900,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.15 Carrer de la Mel.....								27.900,00
	SUBCAPITOL 01.16 Carrer d'Ocata								
	APARTAT 01.16.01 C.de les Mesures - C.de la Mel								
01.16.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	56,000	3,600		201,600			
							201,60	150,00	30.240,00
	TOTAL APARTAT 01.16.01 C.de les Mesures - C.de la Mel.....								30.240,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.16 Carrer d'Ocata.....								30.240,00
	SUBCAPITOL 01.17 Travessa de les Mesures								
	APARTAT 01.17.01 C.Major - C.Don Joan Gener i Prats								
01.17.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	76,000	3,500		266,000			
							266,00	150,00	39.900,00
01.17.01.02	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Plaça	2				2,000			
							2,00	406,49	812,98
	TOTAL APARTAT 01.17.01 C.Major - C.Don Joan Gener i Prats...								40.712,98
	TOTAL SUBCAPITOL 01.17 Travessa de les Mesures.....								40.712,98

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 01.18 Carrer de la Roscada								
	APARTAT 01.18.01 C.d'Avall - C.Major								
01.18.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	84,000	3,500		294,000			
							294,00	150,00	44.100,00
	TOTAL APARTAT 01.18.01 C.d'Avall - C.Major.....								44.100,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.18 Carrer de la Roscada.....								44.100,00
	SUBCAPITOL 01.19 Carrer dels Dolors								
	APARTAT 01.19.01 Plaça Petita - Plaça de Sant Pere								
01.19.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	46,000	3,000		138,000			
							138,00	150,00	20.700,00
	TOTAL APARTAT 01.19.01 Plaça Petita - Plaça de Sant Pere.....								20.700,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.19 Carrer dels Dolors.....								20.700,00
	SUBCAPITOL 01.20 Carrer del Reverend Joaquim Bosch								
	APARTAT 01.20.01 Plaça de Sant Pere - C.Ample								
01.20.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	40,000	4,000		160,000			
							160,00	150,00	24.000,00
	TOTAL APARTAT 01.20.01 Plaça de Sant Pere - C.Ample.....								24.000,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.20 Carrer del Reverend Joaquim								24.000,00
	SUBCAPITOL 01.21 Carrer del Pont								
	APARTAT 01.21.01 C.del Raval - Plaça del Doctor Botet								
01.21.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Raval	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
01.21.01.02	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	96,000	4,400		422,400			
							422,40	150,00	63.360,00
	TOTAL APARTAT 01.21.01 C.del Raval - Plaça del Doctor Botet.								66.620,00
	TOTAL SUBCAPITOL 01.21 Carrer del Pont.....								66.620,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 01.22 Edificis Públics								
	APARTAT 01.22.01 Pl.Coma-Trav.P.Vilaret								
01.22.01.01	ut TRASLLAT PAPERERA								
	Extracció i recol.locació de paperera								
	Vorera Nord	1				1,000			
	Vorera Sud	1				1,000			
							2,00	11,32	22,64
	TOTAL APARTAT 01.22.01 Pl.Coma-Trav.P.Vilaret .....								22,64
	TOTAL SUBCAPITOL 01.22 Edificis Públics.....								22,64
	SUBCAPITOL 01.23 Carrer Major								
	APARTAT 01.23.01 Plaça de la Coma - Plaça del Doctor Botet								
01.23.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	C.Major	1	130,000	5,210		677,300			
							677,30	150,00	101.595,00
	TOTAL APARTAT 01.23.01 Plaça de la Coma - Plaça del Doctor								101.595,00
	APARTAT 01.23.02 Plaça del Doctor Botet								
01.23.02.01	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Plaça	2				2,000			
							2,00	406,49	812,98
	TOTAL APARTAT 01.23.02 Plaça del Doctor Botet .....								812,98
	TOTAL SUBCAPITOL 01.23 Carrer Major.....								102.407,98
	SUBCAPITOL 01.24 Rambla Onze de Setembre								
	APARTAT 01.24.01 C.de l'Estació - C.Ample								
01.24.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Ample	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
01.24.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Ample	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
	TOTAL APARTAT 01.24.01 C.de l'Estació - C.Ample.....								3.520,50

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 01.25 Carrer del Portal								
	APARTAT 01.25.01 C.del Portal								
01.25.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Portal		2			2,000			
	Atravessen		2			2,000			
							4,00	0,00	0,00
01.25.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessen		1			1,000			
							1,00	521,00	521,00
01.25.01.03	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord		1	11,000	1,840	20,240			
	Vorera Oest		1	11,000	1,840	20,240			
							40,48	150,00	6.072,00
01.25.01.04	ut TRASLLAT PAPERERA								
	Extracció i recol·locació de paperera								
	Vorera Sud		1			1,000			
							1,00	11,32	11,32
	TOTAL APARTAT 01.25.01 C.del Portal.....								6.604,32
	TOTAL SUBCAPITOL 01.25 Carrer del Portal.....								6.604,32
	SUBCAPITOL 01.26 Carrer Ample								
	APARTAT 01.26.01 Rambla Onze de Setembre - C.del Primitiu Artigues								
01.26.01.01	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Primitiu		0,5			0,500			
							0,50	521,00	260,50
01.26.01.02	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col·locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Primitiu		1			1,000			
	Atravessen		2			2,000			
							3,00	144,65	433,95
	TOTAL APARTAT 01.26.01 Rambla Onze de Setembre - C.del								694,45



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 01.26.02 C.del Primitiu Artigues - C.del Raval									
01.26.02.01	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.									
	Primitiu	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
01.26.02.02	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.									
	Primitiu	1				1,000			
	Atravessen	2				2,000			
	Raval	1				1,000			
							4,00	144,65	578,60
TOTAL APARTAT 01.26.02 C.del Primitiu Artigues - C.del Raval..									839,10
TOTAL SUBCAPITOL 01.26 Carrer Ample.....									1.533,55
SUBCAPITOL 01.27 Travessera de la Plaça Petita									
APARTAT 01.27.01 Plaça Petita - C.de Don Joan Gener i Prats									
01.27.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única									
	I.Mixt	1	30,000	3,600		108,000			
							108,00	150,00	16.200,00
TOTAL APARTAT 01.27.01 Plaça Petita - C.de Don Joan Gener i									16.200,00
TOTAL SUBCAPITOL 01.27 Travessera de la Plaça Petita.....									16.200,00
SUBCAPITOL 01.28 Carrer del Germà Agustí									
APARTAT 01.28.01 Rambla Onze de Setembre - C.del Portal									
01.28.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
Enderroc de la vorera actual i subministrament i col.locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos									
	Vorera Est	1	62,000	1,840		114,080			
	Vorera Oest	1	62,000	1,840		114,080			
							228,16	150,00	34.224,00
01.28.01.02	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.									
	Plataforma	2				2,000			
							2,00	144,65	289,30
01.28.01.03	u CREACIÓ D'APARCAMENT ADAPTAT								
Plaça d'aparcament adaptada de nova creació: subministrament i col.locació de senyalització horitzontal i vertical									
	Vorera Oest	1				1,000			
							1,00	162,82	162,82
TOTAL APARTAT 01.28.01 Rambla Onze de Setembre - C.del									34.676,12
TOTAL SUBCAPITOL 01.28 Carrer del Germà Agustí.....									34.676,12
TOTAL CAPITOL 01 PRIMERA FASE.....									1.129.170,27

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 02 SEGONA FASE								
	SUBCAPITOL 02.01AVINGUDA D'ANTONI GAUDÍ								
	APARTAT 02.01.01 Carretera Provincial - C.de Marià Fortuny								
02.01.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Marià Fortuny	2				2,000			
	Atravessen	2				2,000			
							4,00	3.260,00	13.040,00
02.01.01.02	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Vorera Oest	2				2,000			
							2,00	406,49	812,98
02.01.01.03	u SENYAL VERTICAL PLAÇA APARCAMENT								
	Subministrament i col.locació senyalització vertical de plaça d'aparcament adaptada								
	Centre Comercial	1				1,000			
							1,00	117,82	117,82
	TOTAL APARTAT 02.01.01 Carretera Provincial - C.de Marià								13.970,80
	APARTAT 02.01.02 C.de Marià Fortuny - C.del Vi Novell								
02.01.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Marià Fortuny	2				2,000			
	Vi Novell	2				2,000			
	Vayreda	2				2,000			
	Dali	2				2,000			
	Atravessen	2				2,000			
							10,00	3.260,00	32.600,00
02.01.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Vi Novell	0,5				0,500			
	Vayreda	1				1,000			
	Dali	1				1,000			
							2,50	521,00	1.302,50
02.01.02.03	m2 PAVIMENTAR VORERA								
	Subministrament i col.locació de paviment a la vorera.								
	Vorera Oest	1	31,000	2,250		69,750			
	Vorera Oest	1	31,000	2,250		69,750			
	Vorera Est	1	98,000	2,300		225,400			
							364,90	37,94	13.844,31
	TOTAL APARTAT 02.01.02 C.de Marià Fortuny - C.del Vi Novell.								47.746,81

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 02.01.03 C.del Vi Novell - C.Josep Pla									
02.01.03.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Vi Novell		2			2,000			
	Gavarres		4			4,000			
	Josep pla		4			4,000			
							10,00	3.260,00	32.600,00
02.01.03.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Vi Novell		0,5			0,500			
	Gavarres		2			2,000			
	Josep Pla		2			2,000			
							4,50	521,00	2.344,50
TOTAL APARTAT 02.01.03 C.del Vi Novell - C.Josep Pla .....									34.944,50
APARTAT 02.01.04 C.Josep Pla- C.Victor Catala									
02.01.04.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Josep pla		4			4,000			
							4,00	3.260,00	13.040,00
02.01.04.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Josep Pla		2			2,000			
							2,00	521,00	1.042,00
TOTAL APARTAT 02.01.04 C.Josep Pla- C.Victor Catala.....									14.082,00
TOTAL SUBCAPITOL 02.01 Avinguda d'Antoni Gaudí.....									110.744,11
SUBCAPITOL 02.02 Carretera Provincial									
APARTAT 02.02.01 Accés - C.de Ponent									
02.02.01.01	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Martí i Pol		1			1,000			
							1,00	521,00	521,00
02.02.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessen		4			4,000			
	Martí i Pol		2			2,000			
							6,00	3.260,00	19.560,00
TOTAL APARTAT 02.02.01 Accés - C.de Ponent .....									20.081,00

**AMIDAMENTS I PRESSUPOST**  
**PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>APARTAT 02.02.02 C.de Ponent -AVINGUDA D'ANTONI GAUDÍ</b>									
02.02.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Carrer Fraternitat	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
02.02.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Avda. Antoni G.	1				1,000			
	Illeta Avda. Antoni G.	1				1,000			
	Atravessen	2				2,000			
							4,00	3.260,00	13.040,00
<b>TOTAL APARTAT 02.02.02 C.de Ponent -AVINGUDA D'ANTONI</b>									<b>16.300,00</b>
<b>APARTAT 02.02.03 AVINGUDA D'ANTONI GAUDÍ - C.del MÚSIC COLL</b>									
02.02.03.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Músic Coll	1				1,000			
	Fraternitat	1				1,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
02.02.03.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessa	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
02.02.03.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Atravessa	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
02.02.03.04	ut TRASLLAT DE BÚSTIA DE CORREUS								
	Extracció i recol.locació de bústia de correus, per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m								
	Vorera Nord	1				1,000			
							1,00	40,74	40,74
02.02.03.05	ut TRASLLAT DE SEMAFOR								
	Extracció i instal·lació de semàfor per deixar una amplada lliure de pas mínima de 0.90m. Inclou fonamentació amb excavació del pou, dau de formigó i platina d'anclatge								
	Vorera Nord	1				1,000			
							1,00	516,08	516,08
02.02.03.06	ut TRASLLAT PILONA								
	Extracció i recol.locació de pila								
	Vorera Sud	1				1,000			
							1,00	32,08	32,08
02.02.03.07	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessen	5				5,000			
	Avda. Antoni G.	1				1,000			
							6,00	3.260,00	19.560,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>SUBCAPITOL 02.03 Carrer de Marina</b>								
	<b>APARTAT 02.03.01 C.d'Enric Coris - Baixada del carrer del Migdia</b>								
02.03.01.01	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Enric Coris		0,5			0,500			
							0,50	521,00	260,50
02.03.01.02	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Bda Migdia		1			1,000			
							1,00	144,65	144,65
02.03.01.03	u SENYAL VERTICAL PLAÇA APARCAMENT								
	Subministrament i col.locació senyalització vertical de plaça d'aparcament adaptada								
	Vorera Oest		1			1,000			
							1,00	117,82	117,82
02.03.01.04	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Enric Coris		1			1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
	<b>TOTAL APARTAT 02.03.01 C.d'Enric Coris - Baixada del carrer</b>								<b>3.782,97</b>
	<b>APARTAT 02.03.02 Baixada del carrer del Migdia - C.de la Verneda</b>								
02.03.02.01	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Bda Migdia		1			1,000			
	Verneda		1			1,000			
	Atravessen		1			1,000			
							3,00	144,65	433,95
02.03.02.02	u SENYAL VERTICAL PLAÇA APARCAMENT								
	Subministrament i col.locació senyalització vertical de plaça d'aparcament adaptada								
	Vorera Oest		1			1,000			
							1,00	117,82	117,82
	<b>TOTAL APARTAT 02.03.02 Baixada del carrer del Migdia - C.de</b>								<b>551,77</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 02.03 Carrer de Marina.....</b>								<b>4.334,74</b>

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 02.04.02 C.dels Àngels - C.de Bassegoda								
02.04.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Àngels	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
02.04.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Àngels	0,5				0,500			
	Atravessa	1				1,000			
	Pedraforca	1				1,000			
							2,50	521,00	1.302,50
02.04.02.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Atravessa	2				2,000			
	Pedraforca	2				2,000			
							4,00	144,65	578,60
02.04.02.04	u SENYAL VERTICAL PLAÇA APARCAMENT								
	Subministrament i col.locació senyalització vertical de plaça d'aparcament adaptada								
	Centre Comercial	1				1,000			
							1,00	117,82	117,82
02.04.02.05	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Plataforma	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
02.04.02.06	ut CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA ALENTIDORA								
	Construcció de plataforma alentidora elevant la calçada								
	Atravessa	1				1,000			
							1,00	10.500,00	10.500,00
02.04.02.07	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Oest	1				1,000			
							1,00	1.430,00	1.430,00
	TOTAL APARTAT 02.04.02 C.dels Àngels - C.de Bassegoda.....								17.188,92
	TOTAL SUBCAPITOL 02.04 Carrer del Castell.....								29.250,56



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 02.05 Carrer del Nord								
	APARTAT 02.05.01 C.del Molí - Carretera Provincial								
02.05.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	53,000	3,400		180,200			
							180,20	150,00	27.030,00
	TOTAL APARTAT 02.05.01 C.del Molí - Carretera Provincial.....								27.030,00
	TOTAL SUBCAPITOL 02.05 Carrer del Nord .....								27.030,00
	SUBCAPITOL 02.06 C.del Music Coll								
	APARTAT 02.06.01 C.del Molí - Carretera Provincial								
02.06.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	62,000	4,500		279,000			
							279,00	150,00	41.850,00
	TOTAL APARTAT 02.06.01 C.del Molí - Carretera Provincial.....								41.850,00
	TOTAL SUBCAPITOL 02.06 C.del Music Coll.....								41.850,00
	SUBCAPITOL 02.07 Baixada de la Coma								
	APARTAT 02.07.01 Plaça de la Coma - Carretera Provincial								
02.07.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	74,000	1,540		113,960			
							113,96	150,00	17.094,00
02.07.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Atravessen	1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
02.07.01.03	u CREACIÓ D'APARCAMENT ADAPTAT								
	Plaça d'aparcament adaptada de nova creació: subministrament i col·locació de senyalització horitzontal i vertical								
	Vorera Est	1				1,000			
							1,00	162,82	162,82
02.07.01.04	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessen	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
02.07.01.05	ut TRASLLAT PAPERERA								
	Extracció i recol·locació de paperera								
	Vorera Est	1				1,000			
	Vorera Oest	2				2,000			
							3,00	11,32	33,96
	TOTAL APARTAT 02.07.01 Plaça de la Coma - Carretera								20.550,78
	TOTAL SUBCAPITOL 02.07 Baixada de la Coma.....								20.550,78

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 02.08 Carrer de Xavier Carbó								
	APARTAT 02.08.01 Pg.Ferrocarril - C.Sant Andreu Salou								
02.08.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	X.Carbó	2				2,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
02.08.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	X.Carbó	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
02.08.01.03	m2 PAVIMENTAR VORERA								
	Subministrament i col.locació de paviment a la vorera.								
	Vorera Est	1	34,000	1,750		59,500			
							59,50	37,94	2.257,43
02.08.01.04	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Plaça	2				2,000			
							2,00	406,49	812,98
	TOTAL APARTAT 02.08.01 Pg.Ferrocarril - C.Sant Andreu								10.111,41
	APARTAT 02.08.02 C.de Sant Andreu Salou - C.del Pelagrí								
02.08.02.01	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Pelagrí	0,5				0,500			
	Atravessa	2				2,000			
							2,50	521,00	1.302,50
02.08.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Pelagrí	1				1,000			
	Canigó	1				1,000			
	Atravessa	4				4,000			
							6,00	3.260,00	19.560,00
	TOTAL APARTAT 02.08.02 C.de Sant Andreu Salou - C.del								20.862,50

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALES	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 02.08.03 C.del Pelagrí - C.del Doctor Fleming								
02.08.03.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Fleming	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
02.08.03.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Pelagrí	0,5				0,500			
	Fleming	0,5				0,500			
	Atravessa	2				2,000			
							3,00	521,00	1.563,00
02.08.03.03	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Pelagrí	1				1,000			
	Canigó	1				1,000			
	Atravessa	4				4,000			
							6,00	3.260,00	19.560,00
	TOTAL APARTAT 02.08.03 C.del Pelagrí - C.del Doctor Fleming.								24.383,00
	APARTAT 02.08.04 C.del Doctor Fleming - C.del Progrés								
02.08.04.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Fleming	1				1,000			
	Ardenya	1				1,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
02.08.04.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Fleming	0,5				0,500			
	Atravessa	1				1,000			
	Ardenya	0,5				0,500			
							2,00	521,00	1.042,00
02.08.04.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Progés	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
02.08.04.04	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	Vorera Nord	1	43,000	1,350		58,050			
	Vorera Sud	1	43,000	1,350		58,050			
							116,10	150,00	17.415,00
02.08.04.05	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessa	2				2,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
	TOTAL APARTAT 02.08.04 C.del Doctor Fleming - C.del								31.641,65

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 02.08.05 C.del Progrés - C.d'Avall									
02.08.05.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Ardenya	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
02.08.05.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Ardenya	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
02.08.05.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Progrés	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
02.08.05.04	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	56,000	5,500		308,000			
							308,00	150,00	46.200,00
TOTAL APARTAT 02.08.05 C.del Progrés - C.d'Avall .....									49.865,15
TOTAL SUBCAPITOL 02.08 Carrer de Xavier Carbó.....									136.863,71
SUBCAPITOL 02.09 Carrer del Raval									
APARTAT 02.09.01 C.Ample - C.de la Pau									
02.09.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Sud	1	38,000	1,490		56,620			
	Vorera Nord	1	41,000	1,490		61,090			
							117,71	150,00	17.656,50
02.09.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Pau	1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
02.09.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Pau	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
02.09.01.04	m2 MODIFICACIÓ DE RAMPA A VORERA								
	Modificació de la vorera actual per formar una rampa adaptada del 10% màxim de pendent. Inclòs el transport de runes a l'abocador.								
	Vorera Nord	2	1,200	1,500		3,600			
	Vorera Sud	2	1,200	1,500		3,600			
							7,20	150,00	1.080,00
TOTAL APARTAT 02.09.01 C.Ample - C.de la Pau .....									18.997,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 02.09.02 C.de la Pau - C.de l'Hospital									
02.09.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	190,000	1,490		283,100			
	Vorera Sud	1	105,000	1,490		156,450			
							439,55	150,00	65.932,50
02.09.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Pau	1				1,000			
	Atravessen	4				4,000			
							5,00	0,00	0,00
02.09.02.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Pau	0,5				0,500			
	Atravessa	2				2,000			
							2,50	521,00	1.302,50
TOTAL APARTAT 02.09.02 C.de la Pau - C.de l'Hospital.....									67.235,00
APARTAT 02.09.03 C.de l'Hospital - C.de Catalunya									
02.09.03.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Sud	1	87,000	1,490		129,630			
	Vorera Nord	1	87,000	1,490		129,630			
							259,26	150,00	38.889,00
02.09.03.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Catalunya	1				1,000			
	Atravessen	2				2,000			
							3,00	0,00	0,00
02.09.03.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Catalunya	0,5				0,500			
	Atravessen	1				1,000			
							1,50	521,00	781,50
02.09.03.04	ut CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA ALENTIDORA								
	Construcció de plataforma alentidora elevant la calçada								
	Catalunya	0,5				0,500			
							0,50	10.500,00	5.250,00
TOTAL APARTAT 02.09.03 C.de l'Hospital - C.de Catalunya.....									44.920,50

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

# AMIDAMENTS I PRESSUPOST

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>SUBCAPITOL 02.10 Carrer de Cervantes</b>									
<b>APARTAT 02.10.01 C.de Bonavista - C.de la Font</b>									
02.10.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Font	1				1,000			
	Plataforma	2				2,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
02.10.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Font	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
02.10.01.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Plataforma	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
02.10.01.04	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col.locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	39,000	1,660		64,740			
	Vorera Sud	1	50,000	1,660		83,000			
							147,74	150,00	22.161,00
02.10.01.05	ut CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA ALENTIDORA								
	Construcció de plataforma alentidora elevant la calçada								
	Atravessa	1				1,000			
							1,00	10.500,00	10.500,00
<b>TOTAL APARTAT 02.10.01 C.de Bonavista - C.de la Font .....</b>									<b>42.846,15</b>
<b>APARTAT 02.10.02 C.de la Font - Rambla Onze de Setembre</b>									
02.10.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Font	1				1,000			
	Atravessa	2				2,000			
	Plaça	2				2,000			
	Rambla	1				1,000			
							6,00	3.260,00	19.560,00
02.10.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Font	0,5				0,500			
	Atravessa	1				1,000			
	Plaça	1				1,000			
	Rambla	0,5				0,500			
							3,00	521,00	1.563,00
02.10.02.03	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col.locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	60,000	1,660		99,600			
	Vorera Sud	1	119,000	1,660		197,540			
							297,14	150,00	44.571,00

## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

[illegible]



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>SUBCAPITOL 02.12 Rambla Onze de Setembre</b>								
	<b>APARTAT 02.12.01 C.del Germà Agustí - C.de l'Estació</b>								
02.12.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Estació	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
02.12.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Estació	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
02.12.01.03	m2 CONSTRUCCIÓ DE VORERA NOVA								
	Formació de vorera amb subministrament i col.locació de vorada, rigola de formigó i paviment de similars característiques a l'existent								
	Vorera Sud	1	31,000	0,900		27,900			
							27,90	114,00	3.180,60
	<b>TOTAL APARTAT 02.12.01 C.del Germà Agustí - C.de l'Estació...</b>								<b>6.701,10</b>
	<b>APARTAT 02.12.02 C.de l'Estació - C.Ample</b>								
02.12.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Estació	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
02.12.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Estació	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
02.12.02.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Plataforma	2				2,000			
							2,00	144,65	289,30
	<b>TOTAL APARTAT 02.12.02 C.de l'Estació - C.Ample.....</b>								<b>3.809,80</b>

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

**AMIDAMENTS I PRESSUPOST**  
**PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>SUBCAPITOL 02.13 Travessera Passeig de Vilaret</b>									
<b>APARTAT 02.13.01 C.de Marina - Passeig de Vilaret</b>									
02.13.01.01	ut EXTRACCIÓ PILONA								
	Extracció de pilona. Càrrega a contenidor i trasllat al dipòsit municipal								
	Vorera Nord	3				3,000			
							3,00	10,92	32,76
02.13.01.02	m2 MODIFICACIÓ DE RAMPA A VORERA								
	Modificació de la vorera actual per formar una rampa adaptada del 10% màxim de pendent. Inclòs el transport de runes a l'abocador.								
	Vorera Nord	12	1,200	1,030		14,832			
							14,83	150,00	2.224,50
02.13.01.03	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Oest	1	100,000	1,500		150,000			
							150,00	150,00	22.500,00
<b>TOTAL APARTAT 02.13.01 C.de Marina - Passeig de Vilaret.....</b>									<b>24.757,26</b>
<b>TOTAL SUBCAPITOL 02.13 Travessera Passeig de Vilaret .....</b>									<b>24.757,26</b>
<b>SUBCAPITOL 02.14 Passeig de Vilaret</b>									
<b>APARTAT 02.14.01 Passeig de Vilaret</b>									
02.14.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Plaça	2				2,000			
	Bonavista	2				2,000			
	Trav .Pg Vilaret	1				1,000			
	Catalunya	2				2,000			
	Carretera	1				1,000			
	Barrequetes	1				1,000			
	Passeig	1				1,000			
							10,00	3.260,00	32.600,00
02.14.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessa	2				2,000			
							2,00	521,00	1.042,00
02.14.01.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col·locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Plaça	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
02.14.01.04	ut TRASLLAT DE SEMAFOR								
	Extracció i instal·lació de semàfor per deixar una amplada lliure de pas mínima de 0.90m. Inclou fonamentació amb excavació del pou, dau de formigó i platina d'anclatge								
	Vorera Sud	1				1,000			
							1,00	516,08	516,08
02.14.01.05	ut TRASLLAT PILONA								
	Extracció i recol·locació de pilona								
	Vorera Sud	1				1,000			

## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

### PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

[illegible]

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 02.15 Carrer de l'Estació								
	APARTAT 02.15.01 Rambla Onze de Setembre - C.del Germà Agustí								
02.15.01.01	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessen	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
02.15.01.02	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	66,000	1,360		89,760			
	Vorera Oest	1	67,000	1,360		91,120			
							180,88	150,00	27.132,00
02.15.01.03	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Atravessen	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTAT 02.15.01 Rambla Onze de Setembre - C.del								27.653,00
	TOTAL SUBCAPITOL 02.15 Carrer de l'Estació.....								27.653,00
	SUBCAPITOL 02.16 Carrer del Germà Agustí								
	APARTAT 02.16.01 Rambla Onze de Setembre - C.del Portal								
02.16.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	168,000	1,840		309,120			
	Vorera Oest	1	169,000	1,840		310,960			
							620,08	150,00	93.012,00
02.16.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Atravessen	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
02.16.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessen	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
02.16.01.04	ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC								
	Extracció i recol·locació de poste elèctric o telefònic								
	Vorera Est	1				1,000			
							1,00	31,34	31,34
	TOTAL APARTAT 02.16.01 Rambla Onze de Setembre - C.del								93.564,34
	TOTAL SUBCAPITOL 02.16 Carrer del Germà Agustí.....								93.564,34
	TOTAL CAPITOL 02 SEGONA FASE.....								1.030.446,30

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 03 TERCERA FASE								
	SUBCAPITOL 03.01 Carrer del Vi Novell								
	APARTAT 03.01.01 C.de Peralada - C.de Romanyà								
03.01.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessen	4				4,000			
	Romanyà	1				1,000			
	Mercè R	1				1,000			
							6,00	3.260,00	19.560,00
03.01.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Mercè R	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
03.01.01.03	ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC								
	Extracció i recol.locació de poste elèctric o telefònic								
	Vorera Nord	2				2,000			
							2,00	31,34	62,68
03.01.01.04	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Plaça	2				2,000			
							2,00	406,49	812,98
	TOTAL APARTAT 03.01.01 C.de Peralada - C.de Romanyà.....								20.696,16
	APARTAT 03.01.02 C.de Romanyà - C.de Joan Mirò								
03.01.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Romanyà	1				1,000			
	Mirò	1				1,000			
	Rodoreda	1				1,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
03.01.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Mirò	0,5				0,500			
	Rodoreda	0,5				0,500			
							1,00	521,00	521,00
03.01.02.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Plataforma	2				2,000			
							2,00	144,65	289,30
	TOTAL APARTAT 03.01.02 C.de Romanyà - C.de Joan Mirò.....								10.590,30

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

**AMIDAMENTS I PRESSUPOST**  
**PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>SUBCAPITOL 03.02 Carrer de Mercè Rodoreda</b>								
	<b>APARTAT 03.02.01 C.del Vi Novell - C.de les Gavarres</b>								
03.02.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Gavarres	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
	<b>TOTAL APARTAT 03.02.01 C.del Vi Novell - C.de les Gavarres.....</b>								<b>3.260,00</b>
	<b>APARTAT 03.02.02 C.de les Gavarres - C.de Josep Pla</b>								
03.02.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Gavarres	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
	<b>TOTAL APARTAT 03.02.02 C.de les Gavarres - C.de Josep Pla....</b>								<b>3.260,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 03.02 Carrer de Mercè Rodoreda .....</b>								<b>6.520,00</b>
	<b>SUBCAPITOL 03.03 Carrer de la Barceloneta</b>								
	<b>APARTAT 03.03.01 Avinguda d'Antoni Gaudí - C.de Músic Coll</b>								
03.03.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb								
	paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	150,000	1,290		193,500			
	Vorera Sud	1	130,000	1,290		167,700			
							387,00	150,00	58.050,00
	<b>TOTAL APARTAT 03.03.01 Avinguda d'Antoni Gaudí - C.de</b>								<b>58.050,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 03.03 Carrer de la Barceloneta.....</b>								<b>58.050,00</b>
	<b>SUBCAPITOL 03.04 Carrer del Músic Coll</b>								
	<b>APARTAT 03.04.01 Carretera Provincial - C.del Vi Novell</b>								
03.04.01.01	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessa	1				1,000			
	Vi Novell	0,5				0,500			
							1,50	521,00	781,50
03.04.01.02	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb								
	paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	43,000	1,540		66,220			
	Vorera Oest	1	61,000	1,540		93,940			
							160,16	150,00	24.024,00
03.04.01.03	m2 CONSTRUCCIÓ DE VORERA NOVA								
	Formació de vorera amb subministrament i col·locació de vorada, rigola de formigó i paviment de si-								
	milars característiques a l'existent								
	Vorera Oest	1	14,000	1,540		21,560			
							21,56	114,00	2.457,84
03.04.01.04	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera no-								
	va.								
	Atravessen	2				2,000			



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALES	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	Vi Novell	1				1,000			
							3,00	0,00	0,00
03.04.01.05	ut TRASLLAT DE SEMAFOR								
	Extracció i reinstal·lació de semàfor per deixar una amplada lliure de pas mínima de 0.90m. Inclou fonamentació amb excavació del pou, dau de formigó i platina d'anclatge								
	Vorera Est	1				1,000			
							1,00	516,08	516,08
	TOTAL APARTAT 03.04.01 Carretera Provincial - C.del Vi Novell.								27.779,42
	<b>APARTAT 03.04.02 C.del Vi Novell - C.de la Barceloneta</b>								
03.04.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	45,000	1,540		69,300			
	Vorera Oest	1	114,000	1,540		175,560			
							244,86	150,00	36.729,00
03.04.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Vi Novell	1				1,000			
	Barceloneta	1				1,000			
							2,00	0,00	0,00
03.04.02.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Vi Novell	0,5				0,500			
	Barceloneta	0,5				0,500			
							1,00	521,00	521,00
03.04.02.04	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col·locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Plaça	1				1,000			
							1,00	406,49	406,49
	TOTAL APARTAT 03.04.02 C.del Vi Novell - C.de la Barceloneta.								37.656,49

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 03.04.03 C.de la Barceloneta - C.dels Àngels								
03.04.03.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Oest	1	157,000	1,540		241,780			
							241,78	150,00	36.267,00
03.04.03.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Barceloneta	1				1,000			
	Àngels	1				1,000			
							2,00	0,00	0,00
03.04.03.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Barceloneta	0,5				0,500			
	Àngels	0,5				0,500			
							1,00	521,00	521,00
	TOTAL APARTAT 03.04.03 C.de la Barceloneta - C.dels Àngels..								36.788,00
	APARTAT 03.04.04 C.dels Àngels - C.del Bassegoda								
03.04.04.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Àngels	1				1,000			
	St.Grau	2				2,000			
	Bassegoda	2				2,000			
	Illeta	1				1,000			
							6,00	3.260,00	19.560,00
03.04.04.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Àngels	0,5				0,500			
	St.Grau	1				1,000			
	Bassegoda	0,5				0,500			
	Illeta	1				1,000			
							3,00	521,00	1.563,00
	TOTAL APARTAT 03.04.04 C.dels Àngels - C.del Bassegoda.....								21.123,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 03.07 Carrer del Progrés								
	APARTAT 03.07.01 C.del Molí - C.de Xavier Carbó								
03.07.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	118,000	1,280		151,040			
	Vorera Oest	1	118,000	1,280		151,040			
							302,08	150,00	45.312,00
03.07.01.02	ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC								
	Extracció i recol·locació de poste elèctric o telefonic								
	Vorera Sud	1				1,000			
							1,00	31,34	31,34
	TOTAL APARTAT 03.07.01 C.del Molí - C.de Xavier Carbó.....								45.343,34
	TOTAL SUBCAPITOL 03.07 Carrer del Progrés.....								45.343,34
	SUBCAPITOL 03.08 Carrer del Molí								
	APARTAT 03.08.01 Carretera Provincial - C.del Remei								
03.08.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	117,000	1,500		175,500			
	Vorera Sud	1	132,000	1,500		198,000			
							373,50	150,00	56.025,00
03.08.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Atravessa	2				2,000			
	Plataforma	2				2,000			
							4,00	0,00	0,00
03.08.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessa	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
03.08.01.04	ut CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA ALENTIDORA								
	Construcció de plataforma alentidora elevant la calçada								
	Plataforma	1				1,000			
							1,00	10.500,00	10.500,00
	TOTAL APARTAT 03.08.01 Carretera Provincial - C.del Remei.....								67.046,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 03.08.02 C.del Remei - C.del Progrés								
03.08.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	36,000	1,500		54,000			
	Vorera Sud	1	34,000	1,500		51,000			
							105,00	150,00	15.750,00
03.08.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Progrés	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
03.08.02.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Progrés	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
	TOTAL APARTAT 03.08.02 C.del Remei - C.del Progrés.....								16.271,00
	TOTAL SUBCAPITOL 03.08 Carrer del Molí.....								83.317,00
	SUBCAPITOL 03.09 Carrer d'Ardenya								
	APARTAT 03.09.01 C.de Xavier Carbó - C.del Portal								
03.09.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Sud	1	101,000	1,370		138,370			
	Vorera Nord	1	96,000	1,370		131,520			
							269,89	150,00	40.483,50
03.09.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Portal	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
03.09.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Portal	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
03.09.01.04	m2 MODIFICACIÓ DE RAMPA A VORERA								
	Modificació de la vorera actual per formar una rampa adaptada del 10% màxim de pendent. Inclòs el transport de runes a l'abocador.								
	Vorera Sud	2	1,200	1,370		3,288			
							3,29	150,00	493,50
03.09.01.05	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Nord	4				4,000			
							4,00	1.430,00	5.720,00
	TOTAL APARTAT 03.09.01 C.de Xavier Carbó - C.del Portal.....								47.218,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
TOTAL SUBCAPITOL 03.09 Carrer d'Ardenya.....									47.218,00
SUBCAPITOL 03.10 Carrer del Portal									
APARTAT 03.10.01 Passeig del Ferrocarril - C.de la Salut									
03.10.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Salut	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
03.10.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Salut	0,5				0,500			
	Atravessa	1				1,000			
							1,50	521,00	781,50
03.10.01.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Atravessa	2				2,000			
							2,00	144,65	289,30
03.10.01.04	ut TRASLLAT SENYAL DE TRÀNSIT								
	Extracció i recol.locació de senyal de transit de 3m d'alçada. Inclou l'excavació i la fonamentació								
	Vorera Oest	1				1,000			
							1,00	47,19	47,19
03.10.01.05	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Oest	4				4,000			
							4,00	1.430,00	5.720,00
TOTAL APARTAT 03.10.01 Passeig del Ferrocarril - C.de la									10.097,99

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 03.10.02 C.de la Salut - C.d'Ardenya								
03.10.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Salut	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
03.10.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Salut	0,5				0,500			
	Atravessa	1				1,000			
	Ardenya	1				1,000			
	Portal	1				1,000			
							3,50	521,00	1.823,50
03.10.02.03	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	130,000	1,540		200,200			
	Vorera Sud	1	130,000	1,540		200,200			
							400,40	150,00	60.060,00
03.10.02.04	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Atravessa	2				2,000			
	Ardenya	2				2,000			
	Portal	2				2,000			
							6,00	0,00	0,00
03.10.02.05	ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC								
	Extracció i recol·locació de poste elèctric o telefònic								
	Vorera Oest	1				1,000			
	Vorera Est	2				2,000			
							3,00	31,34	94,02
03.10.02.06	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Est	4				4,000			
							4,00	1.430,00	5.720,00
TOTAL APARTAT 03.10.02 C.de la Salut - C.d'Ardenya.....									70.957,52



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

[illegible]

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALES	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 03.11.02 C.de la Pau - C.del Doctor Robert									
03.11.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos									
	Vorera Nord	1	115,000	1,320		151,800			
	Vorera Sud	1	55,000	1,320		72,600			
							224,40	150,00	33.660,00
03.11.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.									
	Pau	2				2,000			
	Dr.Robert	1				1,000			
	Atravessen	2				2,000			
							5,00	0,00	0,00
03.11.02.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.									
	Pau	0,5				0,500			
		0,5				0,500			
	Robert	0,5				0,500			
	Atravessen	1				1,000			
							2,50	521,00	1.302,50
TOTAL APARTAT 03.11.02 C.de la Pau - C.del Doctor Robert.....									34.962,50
APARTAT 03.11.03 C.del Doctor Robert - C.de l'Hospital									
03.11.03.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos									
	Vorera Sud	1	54,000	1,320		71,280			
							71,28	150,00	10.692,00
03.11.03.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.									
	Dr.Robert	1				1,000			
	Atravessen	2				2,000			
							3,00	0,00	0,00
03.11.03.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.									
	Robert	0,5				0,500			
	Atravessen	1				1,000			
							1,50	521,00	781,50
TOTAL APARTAT 03.11.03 C.del Doctor Robert - C.de									11.473,50
TOTAL SUBCAPITOL 03.11 Carrer de Primitiu Artiques.....									62.599,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>SUBCAPITOL 03.12 Carrer de l'Hospital</b>								
	<b>APARTAT 03.12.01 Rambla Onze de Setembre - C.del Raval</b>								
03.12.01.01	<b>m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT</b>								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	175,000	5,900		1.032,500			
							1.032,50	150,00	154.875,00
	<b>TOTAL APARTAT 03.12.01 Rambla Onze de Setembre - C.del</b>								<b>154.875,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 03.12 Carrer de l'Hospital.....</b>								<b>154.875,00</b>
	<b>SUBCAPITOL 03.13 Carrer de l'Esport</b>								
	<b>APARTAT 03.13.01 Rambla Onze de Setembre - C.del Raval</b>								
03.13.01.01	<b>ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS</b>								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Trincheria	2				2,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
03.13.01.02	<b>ut PINTAR PAS DE VIANANTS</b>								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Trincheria	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
03.13.01.03	<b>ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC</b>								
	Extracció i recol.locació de poste elèctric o telefònic								
	Vorera Oest	4				4,000			
							4,00	31,34	125,36
03.13.01.04	<b>ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT</b>								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Oest	1				1,000			
							1,00	1.430,00	1.430,00
	<b>TOTAL APARTAT 03.13.01 Rambla Onze de Setembre - C.del</b>								<b>8.596,36</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 03.13 Carrer de l'Esport.....</b>								<b>8.596,36</b>

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 03.14 Carrer del Clot									
APARTAT 03.14.01 C.de Marina - C.de la Font									
03.14.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Sud	1	66,000	1,300		85,800			
							85,80	150,00	12.870,00
03.14.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Font	1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
03.14.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Font	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
03.14.01.04	ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC								
	Extracció i recol·locació de poste elèctric o telefonic								
	Vorera Sud	1				1,000			
							1,00	31,34	31,34
03.14.01.05	ut TRASLLAT SENYAL DE TRÀNSIT								
	Extracció i recol·locació de senyal de transit de 3m d'alçada. Inclou l'excavació i la fonamentació								
	Vorera Sud	1				1,000			
							1,00	47,19	47,19
TOTAL APARTAT 03.14.01 C.de Marina - C.de la Font.....									13.209,03
APARTAT 03.14.02 C.de la Font - C.de Bonavista									
03.14.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Sud	1	38,000	1,300		49,400			
	Vorera Nord	1	108,000	1,300		140,400			
							189,80	150,00	28.470,00
03.14.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Font	1				1,000			
	Bonavista	2				2,000			
							3,00	0,00	0,00
03.14.02.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Bonavista	1				1,000			
	Font	0,5				0,500			
							1,50	521,00	781,50
TOTAL APARTAT 03.14.02 C.de la Font - C.de Bonavista.....									29.251,50
TOTAL SUBCAPITOL 03.14 Carrer del Clot.....									42.460,53

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 03.17 Carrer de Catalunya								
	APARTAT 03.17.01 C.del Raval - C.de Puigcugul								
03.17.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Oest	1	84,000	1,960		164,640			
							164,64	150,00	24.696,00
03.17.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Puigcugull	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
03.17.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Puigcugul	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
03.17.01.04	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col·locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Puigcugull	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
	TOTAL APARTAT 03.17.01 C.del Raval - C.de Puigcugul.....								28.361,15
	APARTAT 03.17.02 C.de Puigcugul - Passeig de Vilaret								
03.17.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Puigcogul	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
03.17.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Puigcugul	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
03.17.02.03	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col·locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	Puigcugull	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
03.17.02.04	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Oest	1	64,000	1,960		125,440			
							125,44	150,00	18.816,00
	TOTAL APARTAT 03.17.02 C.de Puigcugul - Passeig de Vilaret..								22.481,15
	TOTAL SUBCAPITOL 03.17 Carrer de Catalunya .....								50.842,30

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>SUBCAPITOL 03.20 Plaça de la Fonde de Can Tolosà</b>								
	<b>APARTAT 03.20.01 Plaça de la Fonde de Can Tolosà</b>								
03.20.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Plaça	4				4,000			
							4,00	3.260,00	13.040,00
03.20.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Plaça	2				2,000			
							2,00	521,00	1.042,00
03.20.01.03	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Plaça	2				2,000			
							2,00	406,49	812,98
	<b>TOTAL APARTAT 03.20.01 Plaça de la Fonde de Can Tolosà.....</b>								<b>14.894,98</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 03.20 Plaça de la Fonde de Can Tolosà....</b>								<b>14.894,98</b>
	<b>SUBCAPITOL 03.21 Carrer de Ponent</b>								
	<b>APARTAT 03.21.01 Inici-Ctra.Provincial</b>								
03.21.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessen	4				4,000			
							4,00	3.260,00	13.040,00
03.21.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessen	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
	<b>TOTAL APARTAT 03.21.01 Inici-Ctra.Provincial.....</b>								<b>13.561,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 03.21 Carrer de Ponent.....</b>								<b>13.561,00</b>
	<b>TOTAL CAPITOL 03 TERCERA FASE.....</b>								<b>1.328.769,09</b>

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	CAPITOL 04 QUARTA FASE								
	SUBCAPITOL 04.01 Carrer de Peralada								
	APARTAT 04.01.01 Ronda de Sant Jordi - C.del Priorat								
04.01.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Sant Jordi	2				2,000			
	Atravessa	1				1,000			
	Priorat	1				1,000			
							4,00	3.260,00	13.040,00
04.01.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Sant Jordi	1				1,000			
	Priorat	0,5				0,500			
							1,50	521,00	781,50
	TOTAL APARTAT 04.01.01 Ronda de Sant Jordi - C.del Priorat..								13.821,50
	APARTAT 04.01.02 C.del Priorat - C.del Vi Novell								
04.01.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Priorat	1				1,000			
	Travessera	2				2,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
04.01.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Priorat	0,5				0,500			
	Travessera	1				1,000			
							1,50	521,00	781,50
04.01.02.03	m2 CONSTRUCCIÓ DE VORERA NOVA								
	Formació de vorera amb subministrament i col.locació de vorada, rigola de formigó i paviment de similars característiques a l'existent								
	Vorera Sud	1	45,000	1,200		54,000			
							54,00	114,00	6.156,00
04.01.02.04	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Parc	2				2,000			
							2,00	406,49	812,98
	TOTAL APARTAT 04.01.02 C.del Priorat - C.del Vi Novell.....								17.530,48
	TOTAL SUBCAPITOL 04.01 Carrer de Peralada.....								31.351,98

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 04.02 Carrer de Pompeu Fabra								
	APARTAT 04.02.01 C.de Mercè Rodoreda -AVINGUDA D'ANTONI GAUDÍ								
04.02.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Mercè	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
04.02.01.02	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	70,000	1,400		98,000			
	Vorera Sud	1	70,000	1,400		98,000			
							196,00	150,00	29.400,00
04.02.01.03	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Mercè R	1				1,000			
	Antoni Gaudí	2				2,000			
							3,00	0,00	0,00
04.02.01.04	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Mercè	1				1,000			
	Avda Antoni G.	0,5				0,500			
		0,5				0,500			
							2,00	521,00	1.042,00
04.02.01.05	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Nord	2				2,000			
							2,00	1.430,00	2.860,00
TOTAL APARTAT 04.02.01 C.de Mercè Rodoreda -AVINGUDA									36.562,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 04.03.02 C.de la Mare de Dèu de Núria - C.de la Mare de Dèu del Munt									
04.03.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	M.de Dèu Núria		2			2,000			
	M.de Dèu Munt		1			1,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
04.03.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	M.de Dèu Núria		0,5			0,500			
			0,5			0,500			
	M.de Dèu Munt		0,5			0,500			
							1,50	521,00	781,50
04.03.02.03	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Nord		2			2,000			
							2,00	1.430,00	2.860,00
04.03.02.04	ut TRASLLAT SENYAL DE TRÀNSIT								
	Extracció i recol.locació de senyal de trànsit de 3m d'alçada. Inclou l'excavació i la fonamentació								
	Vorera Nord		1			1,000			
							1,00	47,19	47,19
TOTAL APARTAT 04.03.02 C.de la Mare de Dèu de Núria - C.de									13.468,69
APARTAT 04.03.03 C.de la Mare de Dèu del Munt - C.del Castell									
04.03.03.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	M.de Dèu Munt		1			1,000			
	Atravessen		4			4,000			
							5,00	3.260,00	16.300,00
04.03.03.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	M.de Dèu Munt		0,5			0,500			
	Atravessa		2			2,000			
							2,50	521,00	1.302,50
04.03.03.03	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Nord		4			4,000			
							4,00	1.430,00	5.720,00
TOTAL APARTAT 04.03.03 C.de la Mare de Dèu del Munt -									23.322,50
TOTAL SUBCAPITOL 04.03 Carrer dels Pirineus.....									75.740,38

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
SUBCAPITOL 04.04 Carrer de Mercè Rodoreda									
APARTAT 04.04.01 C.de Josep Pla - C.de Pompeu Fabra									
04.04.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Pompeu Fabra		2			2,000			
							2,00	0,00	0,00
04.04.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Pompeu F.		1			1,000			
							1,00	521,00	521,00
04.04.01.03	u CREACIÓ D'APARCAMENT ADAPTAT								
	Plaça d'aparcament adaptada de nova creació: subministrament i col·locació de senyalització horitzontal i vertical								
	IES		1			1,000			
							1,00	162,82	162,82
TOTAL APARTAT 04.04.01 C.de Josep Pla - C.de Pompeu Fabra									683,82
TOTAL SUBCAPITOL 04.04 Carrer de Mercè Rodoreda.....									683,82
SUBCAPITOL 04.05 Ronda de Sant Jordi									
APARTAT 04.05.01 C.de Sant Cristòfol - C.de Peralada									
04.05.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	St.Cristòfol		1			1,000			
	Romanyà		2			2,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
04.05.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	St. Cristofol		0,5			0,500			
	Romanyà		1			1,000			
							1,50	521,00	781,50
04.05.01.03	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Nord		1			1,000			
							1,00	1.430,00	1.430,00
04.05.01.04	ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC								
	Extracció i recol·locació de poste elèctric o telefònic								
	Vorera Nord		1			1,000			
							1,00	31,34	31,34
TOTAL APARTAT 04.05.01 C.de Sant Cristòfol - C.de Peralada..									12.022,84
TOTAL SUBCAPITOL 04.05 Ronda de Sant Jordi.....									12.022,84

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 04.06 Carrer de Marià Fortuny								
	APARTAT 04.06.01 C.de Sant Cristòfol - C.de Joan Mirò								
04.06.01.01	ut	CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS							
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	St.Cristòfol		1			1,000			
	Mirò		1			1,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
04.06.01.02	ut	PINTAR PAS DE VIANANTS							
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	St.Cristòfol		0,5			0,500			
	J.Mirò		0,5			0,500			
							1,00	521,00	521,00
	TOTAL APARTAT 04.06.01 C.de Sant Cristòfol - C.de Joan Mirò								7.041,00
	APARTAT 04.06.02 C.de Joan Mirò - Avinguda d'Antoni Gaudí								
04.06.02.01	ut	CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS							
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Mirò		1			1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
04.06.02.02	ut	PINTAR PAS DE VIANANTS							
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	J.Mirò		0,5			0,500			
							0,50	521,00	260,50
	TOTAL APARTAT 04.06.02 C.de Joan Mirò - Avinguda d'Antoni								3.520,50
	TOTAL SUBCAPITOL 04.06 Carrer de Marià Fortuny.....								10.561,50
	SUBCAPITOL 04.07 Avinguda d'Antoni Gaudí								
	APARTAT 04.07.01 C.de Bassegoda - C.de Víctor Català								
04.07.01.01	ut	FRANJA PER A INVIDENTS							
	Subministrament i col.locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	V.Català		1			1,000			
							1,00	144,65	144,65
04.07.01.02	m2	AMPLIACIÓ DE VORERA							
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col.locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est		1	50,000	1,200	60,000			
	Vorera Oest		1	21,000	1,200	25,200			
							85,20	150,00	12.780,00
	TOTAL APARTAT 04.07.01 C.de Bassegoda - C.de Víctor Català								12.924,65



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 04.07.02 C.de Víctor Català - C.de Pompeu Fabra									
04.07.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Oest	1	33,000	1,200		39,600			
							39,60	150,00	5.940,00
04.07.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Pompeu Fabra	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
04.07.02.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Pompeu	0,5				0,500			
		0,5				0,500			
							1,00	521,00	521,00
04.07.02.04	ut FRANJA PER A INVIDENTS								
	Subministrament i col·locació de franja de senyalització per a invidents a gual existent de 1.0 m d'amplada i 5.0 m de llargària.								
	V.Català	1				1,000			
							1,00	144,65	144,65
04.07.02.05	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								
	Vorera Oest	1				1,000			
							1,00	1.430,00	1.430,00
04.07.02.06	ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC								
	Extracció i recol·locació de poste elèctric o telefònic								
	Vorera Oest	1				1,000			
							1,00	31,34	31,34
04.07.02.07	ut TRASLLAT SENYAL DE TRÀNSIT								
	Extracció i recol·locació de senyal de transit de 3m d'alçada. Inclou l'excavació i la fonamentació								
	Vorera Oest	1				1,000			
							1,00	47,19	47,19
TOTAL APARTAT 04.07.02 C.de Víctor Català - C.de Pompeu									8.114,18

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 04.07.03 C.de Pompeu Fabra - C.de les Guilleries								
04.07.03.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Pompeu Fabra		2			2,000			
							2,00	0,00	0,00
04.07.03.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Pompeu		0,5			0,500			
			0,5			0,500			
							1,00	521,00	521,00
	TOTAL APARTAT 04.07.03 C.de Pompeu Fabra - C.de les								521,00
	TOTAL SUBCAPITOL 04.07 Avinguda d'Antoni Gaudí.....								21.559,83
	SUBCAPITOL 04.08 Carrer del Músic Coll								
	APARTAT 04.08.01 C.del Bassegoda - C.de Pompeu Fabra								
04.08.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est		1	53,000	1,640	86,920			
							86,92	150,00	13.038,00
04.08.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Pompeu Fabra		2			2,000			
							2,00	0,00	0,00
04.08.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Pompeu		0,5			0,500			
	Pirineus		0,5			0,500			
							1,00	521,00	521,00
04.08.01.04	m2 CONSTRUCCIÓ DE VORERA NOVA								
	Formació de vorera amb subministrament i col·locació de vorada, rigola de formigó i paviment de similars característiques a l'existent								
	Vorera Oest		1	50,000	1,640	82,000			
							82,00	114,00	9.348,00
04.08.01.05	ut TRASLLAT SENYAL DE TRÀNSIT								
	Extracció i recol·locació de senyal de transit de 3m d'alçada. Inclou l'excavació i la fonamentació								
	Vorera Est		1			1,000			
							1,00	47,19	47,19
	TOTAL APARTAT 04.08.01 C.del Bassegoda - C.de Pompeu								22.954,19

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 04.11.01 C.de Marina - C.Llevant								
04.11.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	120,000	4,800		576,000			
							576,00	150,00	86.400,00
	TOTAL APARTAT 04.11.01 C.de Marina - C.Llevant.....								86.400,00
	TOTAL SUBCAPITOL 04.11 Carrer de la Bisbal.....								86.400,00
	SUBCAPITOL 04.12 Carrer del Firal								
	APARTAT 04.12.01 C.de la Bisbal - C.del Mig								
04.12.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	94,000	4,600		432,400			
							432,40	150,00	64.860,00
04.12.01.02	ut TRASLLAT POSTE ELÈCTRIC o TELEFÒNIC								
	Extracció i recol.locació de poste elèctric o telefònic								
	Vorera Nord	1				1,000			
							1,00	31,34	31,34
	TOTAL APARTAT 04.12.01 C.de la Bisbal - C.del Mig.....								64.891,34
	TOTAL SUBCAPITOL 04.12 Carrer del Firal.....								64.891,34
	SUBCAPITOL 04.13 Carrer dels Horts								
	APARTAT 04.13.01 C.de la Bisbal - C.del Mig								
04.13.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	163,000	5,800		945,400			
							945,40	150,00	141.810,00
04.13.01.02	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Plaça	2				2,000			
							2,00	406,49	812,98
	TOTAL APARTAT 04.13.01 C.de la Bisbal - C.del Mig.....								142.622,98
	TOTAL SUBCAPITOL 04.13 Carrer dels Horts.....								142.622,98



**AMIDAMENTS I PRESSUPOST**  
**PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA**

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
<b>APARTAT 04.16.02 C.dels Horts - C.de la Verneda</b>									
04.16.02.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	234,000	4,600		1.076,400			
							1.076,40	150,00	161.460,00
	<b>TOTAL APARTAT 04.16.02 C.dels Horts - C.de la Verneda.....</b>								<b>161.460,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 04.16 Carrer del Migdia.....</b>								<b>210.351,00</b>
<b>SUBCAPITOL 04.17 Baixada del carrer del Migdia</b>									
<b>APARTAT 04.17.01 C.de Marina - C.del Migdia</b>									
04.17.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	50,000	4,600		230,000			
							230,00	150,00	34.500,00
	<b>TOTAL APARTAT 04.17.01 C.de Marina - C.del Migdia.....</b>								<b>34.500,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 04.17 Baixada del carrer del Migdia.....</b>								<b>34.500,00</b>
<b>SUBCAPITOL 04.18 Carrer de Martí Dausà</b>									
<b>APARTAT 04.18.01 Carretera Provincial - C.de la Indústria</b>									
04.18.01.01	m2 ITINERARI MIXT ADAPTAT								
	Construcció d'itinerari mixt adaptat amb plataforma única								
	I.Mixt	1	103,000	4,200		432,600			
							432,60	150,00	64.890,00
	<b>TOTAL APARTAT 04.18.01 Carretera Provincial - C.de la</b>								<b>64.890,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 04.18 Carrer de Martí Dausà.....</b>								<b>64.890,00</b>
<b>SUBCAPITOL 04.19 Carrer del Remei</b>									
<b>APARTAT 04.19.01 C.del Molí - C.del Doctor Fleming</b>									
04.19.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	110,000	1,500		165,000			
	Vorera Sud	1	110,000	1,500		165,000			
							330,00	150,00	49.500,00
04.19.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Atravessen	2				2,000			
		2				2,000			
							4,00	0,00	0,00
04.19.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessa	1				1,000			
		1				1,000			
							2,00	521,00	1.042,00
04.19.01.04	ut TRASLLAT DE FANAL EXISTENT								
	Trasllat de fanal per deixar una amplada lliure de pas de 0.90m. Inclou excavació del pou, càrrega i transport a l'abocador i formació del fonament de formigó								





## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>SUBCAPITOL 04.21 Carrer del Pelagri</b>								
	<b>APARTAT 04.21.01 C.del Remei - C.de Susvalls</b>								
04.21.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Remei	1				1,000			
	Susvalls	2				2,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
04.21.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Remei	1				1,000			
	Susvalls	0,5				0,500			
		0,5				0,500			
							2,00	521,00	1.042,00
04.21.01.03	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Remei	1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
	<b>TOTAL APARTAT 04.21.01 C.del Remei - C.de Susvalls.....</b>								<b>10.822,00</b>
	<b>APARTAT 04.21.02 C.de Susvalls - C.de la Infància</b>								
04.21.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Susvalls	2				2,000			
	Atravessen	2				2,000			
	Infància	1				1,000			
							5,00	3.260,00	16.300,00
04.21.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Susvalls	0,5				0,500			
		0,5				0,500			
	Infància	0,5				0,500			
							1,50	521,00	781,50
	<b>TOTAL APARTAT 04.21.02 C.de Susvalls - C.de la Infància.....</b>								<b>17.081,50</b>

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIALS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 04.21.03 C.de la Infancia - C-Xavier Carbó								
04.21.03.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Infancia	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
04.21.03.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Infancia	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
	TOTAL APARTAT 04.21.03 C.de la Infancia - C-Xavier Carbó.....								3.520,50
	TOTAL SUBCAPITOL 04.21 Carrer del Pelagrí.....								31.424,00
	SUBCAPITOL 04.22 Carrer de Sant Andreu Salou								
	APARTAT 04.22.01 C.de Susvalls - C.de la Infància								
04.22.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Susvalls	2				2,000			
	Infancia	1				1,000			
							3,00	3.260,00	9.780,00
04.22.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Susvalls	1				1,000			
	Infancia	0,5				0,500			
							1,50	521,00	781,50
	TOTAL APARTAT 04.22.01 C.de Susvalls - C.de la Infància.....								10.561,50
	APARTAT 04.22.02 C.De la Infancia - C.Xavier Carbo								
04.22.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Infancia	1				1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
04.22.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Infancia	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
	TOTAL APARTAT 04.22.02 C.De la Infancia - C.Xavier Carbo.....								3.520,50
	TOTAL SUBCAPITOL 04.22 Carrer de Sant Andreu Salou.....								14.082,00

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>SUBCAPITOL 04.23 Carrer de la Infància</b>								
	<b>APARTAT 04.23.01 C.de Sant Andreu Salou - C.del Pelagrí</b>								
04.23.01.01	<b>m2 PAVIMENTAR VORERA</b>								
	Subministrament i col.locació de paviment a la vorera.								
	Vorera Est	1	12,000	1,350		16,200			
							16,20	37,94	614,63
04.23.01.02	<b>ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT</b>								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Plaça	2				2,000			
							1,00	406,49	406,49
	<b>TOTAL APARTAT 04.23.01 C.de Sant Andreu Salou - C.del</b>								<b>1.021,12</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 04.23 Carrer de la Infància.....</b>								<b>1.021,12</b>
	<b>SUBCAPITOL 04.24 Carrer del Doctor Fleming</b>								
	<b>APARTAT 04.24.01 C.del Remei - C.de Xavier Carbó</b>								
04.24.01.01	<b>ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS</b>								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Susvalls	2				2,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
04.24.01.02	<b>m2 AMPLIACIÓ DE VORERA</b>								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	130,000	1,410		183,300			
	Vorera Oest	1	130,000	1,410		183,300			
							366,60	150,00	54.990,00
04.24.01.03	<b>ut PINTAR PAS DE VIANANTS</b>								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Susvalls	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
	<b>TOTAL APARTAT 04.24.01 C.del Remei - C.de Xavier Carbó .....</b>								<b>62.031,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 04.24 Carrer del Doctor Fleming.....</b>								<b>62.031,00</b>

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	<b>SUBCAPITOL 04.28 Carrer de Sant Antoni</b>								
	<b>APARTAT 04.28.01 Travessera del Carrer Montseny - Passeig del Ferrocarril</b>								
04.28.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessen	6				6,000			
	Passeig	1				1,000			
		1				1,000			
							8,00	3.260,00	26.080,00
04.28.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessen	1				1,000			
	Passeig	1				1,000			
		1				1,000			
							3,00	521,00	1.563,00
	<b>TOTAL APARTAT 04.28.01 Travessera del Carrer Montseny -</b>								<b>27.643,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 04.28 Carrer de Sant Antoni.....</b>								<b>27.643,00</b>
	<b>SUBCAPITOL 04.29 Carrer del Far</b>								
	<b>APARTAT 04.29.01 Passeig del Ferrocarril - C.de la Salut</b>								
04.29.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessen	2				2,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
04.29.01.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessen	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
04.29.01.03	m2 SUPRIMIR PENDENT TRANSVERSAL VORERA								
	Suprimir pendent transversal superior al 2% , enderroc de la vorera actual, subministrament i col·locació de vorada i paviment de vorera per adaptar accés a garatge amb un pendent transversal inferior al 2% .								
	Vorera Est	1	4,000			4,000			
							4,00	150,00	600,00
	<b>TOTAL APARTAT 04.29.01 Passeig del Ferrocarril - C.de la</b>								<b>7.641,00</b>
	<b>TOTAL SUBCAPITOL 04.29 Carrer del Far .....</b>								<b>7.641,00</b>

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 04.31 Carrer del Doctor Robert								
	APARTAT 04.31.01 Passeig del Ferrocarril - Rambla Onze de Setembre								
04.31.01.01	ut TRASLLAT PILONA								
	Extracció i recol.locació de pilona								
	Vorera Oest		11				11,000		
								11,00	352,88
04.31.01.02	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	116,000	1,350			156,600		
	Vorera Oest	1	116,000	1,350			156,600		
								313,20	46.980,00
	TOTAL APARTAT 04.31.01 Passeig del Ferrocarril - Rambla								47.332,88
	APARTAT 04.31.02 Rambla Onze de Setembre - C.del Primitiu Artigues								
04.31.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	117,000	1,350			157,950		
	Vorera Oest	1	117,000	1,350			157,950		
								315,90	47.385,00
	TOTAL APARTAT 04.31.02 Rambla Onze de Setembre - C.del								47.385,00
	TOTAL SUBCAPITOL 04.31 Carrer del Doctor Robert.....								94.717,88
	SUBCAPITOL 04.32 Carrer del PuigCugull								
	APARTAT 04.32.01 C.de Marina - C.de Bonavista								
04.32.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	80,000	1,300			104,000		
	Vorera Sud	1	82,000	1,300			106,600		
								210,60	31.590,00
04.32.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Bonavista		2				2,000		
								2,00	0,00
04.32.01.03	ut TRASLLAT PILONA								
	Extracció i recol.locació de pilona								
	Vorera Nord		2				2,000		
								2,00	64,16
04.32.01.04	ut TRASLLAT DE SEMAFOR								
	Extracció i instal·lació de semàfor per deixar una amplada lliure de pas mínima de 0.90m. Inclou fonamentació amb excavació del pou, dau de formigó i platina d'ancatge								
	Vorera Nord	1					1,000		
	Vorera Sud	1					1,000		
								2,00	516,08
	TOTAL APARTAT 04.32.01 C.de Marina - C.de Bonavista.....								32.686,32

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 04.33 Carrer del Sud								
	APARTAT 04.33.01 Passeig del Ferrocarril - C.de Santiago Rusinyol								
04.33.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Est	1	110,000	1,500		165,000			
	Vorera Oest	1	176,000	1,500		264,000			
							429,00	150,00	64.350,00
04.33.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Rusinyol	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
04.33.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessa	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
	TOTAL APARTAT 04.33.01 Passeig del Ferrocarril - C.de								64.871,00
	APARTAT 04.33.02 C.de Santiago Rusinyol - Travessera del Carrer del Sud								
04.33.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Travessera	1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
04.33.02.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Trav .Sud	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
	TOTAL APARTAT 04.33.02 C.de Santiago Rusinyol - Travessera								260,50

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 04.34 Passeig del Ferrocarril								
	APARTAT 04.34.01 C.del Germà Agustí - C.del Sud								
04.34.01.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Atravessa	1				1,000			
	Sud	1				1,000			
							2,00	3.260,00	6.520,00
	TOTAL APARTAT 04.34.01 C.del Germà Agustí - C.del Sud.....								6.520,00
	APARTAT 04.34.02 C.del Sud - C.del Doctor Robert								
04.34.02.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Sud	1				1,000			
	Àngel Guimerà	2				2,000			
	Passeig	1				1,000			
							4,00	3.260,00	13.040,00
04.34.02.02	m2 PAVIMENTAR VORERA								
	Subministrament i col.locació de paviment a la vorera.								
	Vorera Nord	1	3,000	4,000		12,000			
							12,00	37,94	455,28
04.34.02.03	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera no-va.								
	Plataforma	2				2,000			
		2				2,000			
							4,00	0,00	0,00
04.34.02.04	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Doctor Robert	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
04.34.02.05	ut CONSTRUCCIÓ PLATAFORMA ALENTIDORA								
	Construcció de plataforma alentidora elevant la calçada								
	Atravessen	2				2,000			
							2,00	10.500,00	21.000,00
	TOTAL APARTAT 04.34.02 C.del Sud - C.del Doctor Robert.....								34.755,78

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	APARTAT 04.34.03 C.del Doctor Robert - C.de la Piscina								
04.34.03.01	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Suro	4				4,000			
	Atravessen	4				4,000			
							8,00	3.260,00	26.080,00
04.34.03.02	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Doctor Robert	0,5				0,500			
	Suro	2				2,000			
							2,50	521,00	1.302,50
04.34.03.03	m2 CONSTRUCCIÓ DE VORERA NOVA								
	Formació de vorera amb subministrament i col.locació de vorada, rigola de formigó i paviment de similars característiques a l'existent								
	Vorera Nord	1	16,000	1,250		20,000			
							20,00	114,00	2.280,00
04.34.03.04	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Dr.Robert	1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
04.34.03.05	m2 PAVIMENTAR VORERA								
	Subministrament i col.locació de paviment a la vorera.								
	Vorera Nord	1	26,000	1,250		32,500			
							32,50	37,94	1.233,05
	TOTAL APARTAT 04.34.03 C.del Doctor Robert - C.de la								30.895,55
	APARTAT 04.34.04 Parc del Carrilet								
04.34.04.01	ut COL.LOCACIÓ SEIENT ADAPTAT								
	Subministrament i col.locació de seient, alçada del seient a 45 cm del paviment, amb reposabraços								
	Estació	5				5,000			
	Parc infantil	2				2,000			
							7,00	406,49	2.845,43
04.34.04.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS								
	Construcció de gual de vianants adaptat								
	Zona verda	1	1,000			1,000			
							1,00	3.260,00	3.260,00
	TOTAL APARTAT 04.34.04 Parc del Carrilet.....								6.105,43
	TOTAL SUBCAPITOL 04.34 Passeig del Ferrocarril.....								78.276,76

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 04.35 Carretera de Marina								
	APARTAT 04.35.01 C.Puig gros-Bda.C.Migdia								
04.35.01.01	ut ADAPTAR TENDALL DE BOTIGA								
	Vorera est	1				1,00			
							1,00	0,00	0,00
	TOTAL APARTAT 04.35.01 C.Puig gros-Bda.C.Migdia.....								
	TOTAL SUBCAPITOL 04.35 Carretera de Marina.....								
	SUBCAPITOL 04.36 Carrer de l'Hospital								
	APARTAT 04.36.01 C.de la Piscina - Rambla Onze de Setembre								
04.36.01.01	u CREACIÓ D'APARCAMENT ADAPTAT								
	Plaça d'aparcament adaptada de nova creació: subministrament i col·locació de senyalització horitzontal i vertical								
	P.Municipal	1				1,000			
							1,00	162,82	162,82
04.36.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Atravessen	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
04.36.01.03	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Oest	1	123,000	1,510		185,730			
	Vorera Est	1	117,000	1,510		176,670			
							362,40	150,00	54.360,00
04.36.01.04	m2 SUPRIMIR PENDENT TRANSVERSAL VORERA								
	Suprimir pendent transversal superior al 2% , enderroc de la vorera actual, subministrament i col·locació de vorada i paviment de vorera per adaptar accés a garatge amb un pendent transversal inferior al 2% .								
	Vorera Est	1	5,000			5,000			
							5,00	150,00	750,00
	TOTAL APARTAT 04.36.01 C.de la Piscina - Rambla Onze de								
	55.272,82								
	TOTAL SUBCAPITOL 04.36 Carrer de l'Hospital.....								
	55.272,82								



## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
	SUBCAPITOL 04.37 Carrer de la Piscina								
	APARTAT 04.37.01 Passeig del Ferrocarril - C.de l'Hospital								
04.37.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Nord	1	51,000	1,350		68,850			
	Sud		46,000	1,350					
	Est		78,000	1,900					
	Oest		67,000	1,900					
							68,85	150,00	10.327,50
04.37.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Atravessen	2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
04.37.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Atravessen	1				1,000			
							1,00	521,00	521,00
	TOTAL APARTAT 04.37.01 Passeig del Ferrocarril - C.de								10.848,50
	TOTAL SUBCAPITOL 04.37 Carrer de la Piscina.....								10.848,50
	SUBCAPITOL 04.38 Carrer dels Àngels								
	APARTAT 04.38.01 C.del Músic Coll - C.de la Conca								
04.38.01.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
	Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos								
	Vorera Nord	1	45,000	1,450		65,250			
	Vorera Sud	1	107,000	1,450		155,150			
							220,40	150,00	33.060,00
04.38.01.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
	Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.								
	Conca	1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
04.38.01.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
	Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.								
	Conca	0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
	TOTAL APARTAT 04.38.01 C.del Músic Coll - C.de la Conca.....								33.320,50

## AMIDAMENTS I PRESSUPOST

## PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

CODI	DESCRIPCIÓ	UTS	LONGITUD	AMPLADA	ALÇADA	PARCIAIS	QUANTITAT	PREU	IMPORT
APARTAT 04.38.02 C.de la Conca - C.de la Conca									
04.38.02.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos									
Vorera Nord		1	27,000	1,450		39,150			
							39,15	150,00	5.872,50
04.38.02.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.									
Conca		2				2,000			
							2,00	0,00	0,00
04.38.02.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.									
Conca		0,5				0,500			
		0,5				0,500			
							1,00	521,00	521,00
TOTAL APARTAT 04.38.02 C.de la Conca - C.de la Conca.....									6.393,50
APARTAT 04.38.03 C.de la Conca - C.del Castell									
04.38.03.01	m2 AMPLIACIÓ DE VORERA								
Enderroc de la vorera actual i subministrament i col·locació del material per ampliar la vorera amb paviment de similars característiques a l'existent, tots els treballs necessaris inclosos									
Vorera Nord		1	6,000	1,450		8,700			
							8,70	150,00	1.305,00
04.38.03.02	ut CONSTRUCCIÓ DE GUAL DE VIANANTS COST 0								
Construcció de gual de vianants adaptat durant l'ampliació de la vorera o la formació de la vorera nova.									
Conca		1				1,000			
							1,00	0,00	0,00
04.38.03.03	ut PINTAR PAS DE VIANANTS								
Pintat de pas de vianants. Aproximadament calçada de 6.0m, i 4.0 m d'amplada de pas.									
Conca		0,5				0,500			
							0,50	521,00	260,50
TOTAL APARTAT 04.38.03 C.de la Conca - C.del Castell.....									1.565,50
TOTAL SUBCAPITOL 04.38 Carrer dels Àngels.....									41.279,50
TOTAL CAPITOL 04 QUARTA FASE.....									1.872.151,75
TOTAL.....									5.360.537,41



## RESUM DE PRESSUPOST

PLA D'ACCESSIBILITAT DE CASSÀ DE LA SELVA

RESUM	EUROS	
PRIMERA FASE.....	1.129.170,27	
SEGONA FASE.....	1.030.446,30	
TERCERA FASE.....	1.328.769,09	
QUARTA FASE.....	1.872.151,75	
<b>TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL</b>		<b>5.360.537,41</b>
13,00% Despeses Generals.....	696.869,86	
6,00% Benefici industrial.....	321.632,24	
SUMA DE G.G. y B.I.		1.018.502,10
16,00% I.V.A.....	1.020.646,32	1.020.646,32
<b>TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA</b>		<b>7.399.685,83</b>
<b>TOTAL PRESSUPOST GENERAL</b>		<b>7.399.685,83</b>

Puja el pressupost general l'esmentada quantitat de SET MILIONS TRES-CENTS NORANTA-NOU MIL SIS-CENTS VUITANTA-CINC EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

, a Febrer 2009.

LA PROPIETAT

L'ARQUITECTE  
M<sup>a</sup> Mercè Corominas Noguera
